

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
Sexta Reunião de 2017	14/10/2017 às 13:00	Sala do Juiz Auxiliar da Presidência no Prédio sede do TRT 16ª Região	Bruno de Carvalho Motejunas

2. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

3. Membros Presentes

Nome	Função
Bruno de Carvalho Motejunas	Juiz Auxiliar da Presidência
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador da CTIC
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe do Setor de Governança de TI

4. Membros Ausentes

Nome	Função
James Magno Araújo Farias	Desembargador Presidente
Joselena do Carmo Soares Pereira	Secretária-Geral da Presidência
Gabrielle Amado Boumann	Juíza do Trabalho de 1º Grau
Adriana Albuquerque de Brito	Diretora-Geral

5. Convidados

Nome	Função
Érika Guimarães Gonçalves Dóvera	Juíza do Trabalho de 1º Grau
Stanley Araújo de Sousa	Chefe do Seção de Segurança da Informação

6. Pauta da Reunião

- Suíte de Escritório;
- Priorização de Projetos;
- Plano de Contratações de TIC 2018;

7. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Suíte de Escritório

7.1. Stanley Araújo informou que os usuários estão demandando atualização do aplicativo de suítes de escritórios (aplicativo que inclui funcionalidades de editor de texto, editor de planilha, editor de apresentação, dentre outros). Assim, Stanley apontou três soluções para o atendimento da demanda: adquirir licenças do Microsoft Office; utilizar solução de código aberto; realizar uma mescla, adquirindo algumas licenças do Microsoft Office para setores que justificarem a necessidade da ferramenta e, para o restante do Tribunal, utilizando solução de código aberto. Por fim, Stanley informou da existência de um ato do CSJT que recomenda a utilização de programas de computador com código aberto, isentos de reservas de direitos proprietários (Ato Conjunto CSJJ.TST.GP.SE nº 10/2008);

7.2. Dr. Bruno Motejunas questionou se as ferramentas de código aberto, segundo o entendimento do servidores da CTIC presentes na reunião, atenderiam a necessidade dos usuários do Tribunal. Cláudio Sampaio, Rafael Robinson e Stanley Araújo responderam que as ferramentas de código aberto - a exemplo do LibreOffice e OpenOffice - poderiam ser adotadas pelo Tribunal, uma vez que elas contemplam as funcionalidades mais utilizadas pelos usuários do Tribunal;



7.3. Após debates, o comitê deliberou por adotar a solução em código livre para a suíte de escritório. Para oficializar a solução, decidiu-se por aprovar a elaboração de uma norma disciplinando a matéria, contendo, no mínimo, as seguintes informações

- a) A norma deve mencionar no seu fundamento de existência o Ato Conjunto CSJJ.TST.GP.SE nº 10/2018 e a necessidade de redução de custos;
- b) Deve tornar obrigatória a utilização de solução de suíte de escritório para todos os usuários do Tribunal, criando uma regra de transição de 6 meses para a adaptação do usuários ao novo aplicativo de código aberto escolhido;
- c) Deve conter um artigo permitindo aos unidades do Tribunal solicitar, mediante justificativa fundamentada - excluídas as de ordem estéticas e subjetivas ou a existência de funcionalidades maiores desnecessárias ao serviço público -, a necessidades de compra de programas proprietários. As solicitações serão levadas para Presidência - após parecer técnico da CTIC e avaliação do CGovTIC -, para decisão sobre a aquisição de suíte de escritório proprietário;
- d) Deve informar que os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal;

7.4. Stanley Araújo sugeriu que seja realizada uma campanha educativa e cursos de capacitação EAD para familiarizar os usuários com o novo aplicativo. O comitê concordo com a sugestão.

7.5. Dr. Bruno questionou qual seria o melhor aplicativo código aberto de escritório. Cláudio Sampaio disse que a CTIC irá estudar a matéria e definir a solução mais adequada ao Tribunal.

7.6. Ações a serem tomadas:

- a) Elaborar a minuta de norma disciplinando a utilização de suíte de escritório nos Tribunal. Responsável: Rafael Robinson;
- b) Solicitar estudo comparativo de ferramentas de código aberto para a definir a solução que melhor se adéqua aos usuário do Tribunal. Responsável: Cláudio Sampaio;

Item da Pauta: Priorização de Projetos

7.7. Rafael Robinson apresentou o portfólio de projetos de TIC (ANEXO I).

7.8. Discutiu-se acerca dos seguintes projetos do portfólio:

- a) Projeto 4 - Implantação do SGRH/SIGEP: apresentou-se o cronograma atualizado do projeto de implantação do sistema (ANEXO II);
- b) Projeto 208 - Alteração do Sistema de Ponto Eletrônico: informou-se que uma nova demanda foi registrada pelo Gabinete do Dr. Luiz Cosmo solicitando a modificação no sistema de marcação administrativa de ponto eletrônico, tendo em vista a necessidade de realizar a marcação de muitos servidores, gerando um grande número de clique e com repetições de informações. A demanda pede uma nova opção no sistema para permitir o lançamento em lote de várias marcações ao mesmo tempo. Sugere a criação de uma planilha eletrônica (semelhante ao próprio espelho de ponto), para que todas as alterações daquele servidor fossem realizadas na mesma entrada, escolhendo datas, inserindo horários de entrada e saída e justificativa em cada dia. Outra opção apresentada pelo Gabinete seria a criação de um acesso à planilha supracitada, escolher inicialmente a justificativa e depois inserir data e horários. Leu-se o parecer do Desenvolvimento de Sistema que estimou que a criação da planilha demandaria 1 mês de desenvolvimento. No entanto, o parecer sugere a adoção de outra alternativa, que seria a liberação do horário máximo de batida de ponto biométrico para o gabinete, uma vez que este pode ser o motivo para gerar várias batidas administrativas. O comitê deliberou pela adoção da alternativa indicada pelo parecer com a remoção a limitação de batida do ponto biométrico às 15:15. A justificativa para a escolha reside no SIGEP (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas), que será implantado em 2018, e contempla um novo sistema de ponto eletrônico no módulo de autoatendimento. Assim, o esforço para implementar a funcionalidade pedida pelo Gabinete no sistema de ponto eletrônico atual seria perdido com a implantação do SIGEP e seus módulos.

- c) Projeto 210 - Implantação do Sistema Panorama Orçamentário: informou-se sobre a demanda da Diretoria Geral para a implantação do "Panorama Orçamentário". A CTIC em parecer sugeriu pela não adoção em função incompatibilidade do sistema com o SIGEO-JT. A DG acatou a sugestão da CTIC e solicitou, se possível, que fosse demandado ao Comitê Gestor Nacional do SIGEO-JT a sua inclusão como submódulo da versão nacional. Rafael Robison informou que existe no Tribunal o Comitê Regional do SIGEO-JT (Portaria GP nº 31/2016) e que há servidores do TRT16 compondo o grupo de trabalho do SIGEO-JT no âmbito da Justiça do Trabalho (Ato Nº 236/CSJT.GP.SG 2014). O comitê definiu que a demanda deve ser encaminhada ao Comitê Regional do SIGEO-JT no TRT16 para que possa solicitar ao Comitê Gestor Nacional do SIGEO-JT a inclusão do sistema "Panorama Orçamentário" como submódulo do SIGEO nacional.

7.9. Após a análise das demandas submetidas ao CGovTIC, o portfólio de projetos foi atualizado, tendo sua nova configuração definida conforme tabela abaixo:

Área Executora	Ordem	ID	Projeto
Desenvolvimento	Em Execução	4	Implantação do SGRH/SIGEP
	Em Execução		Nacionalizar Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho
Desenvolvimento	Aprovado	11	Sistema de Controle de Veículos
Desenvolvimento	Aprovado	10	Sistema Acompanhamento Virtual de Obras
Desenvolvimento	Aprovado	7	Remodelagem do Site do TRT 16
Desenvolvimento	Aprovado	26	Portal CEMOC
Desenvolvimento	Pendente	6	Indexação das publicações do TRT16
Desenvolvimento	Pendente	8	Solução de revista eletrônica
Desenvolvimento	Pendente	25	Modulo nacional da Escola Judicial
PJE	Em Execução	2	CLE
	Em Execução		Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado.
PJE	Em Execução	123	Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)
PJE	Em Execução	132	Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)
PJE	Em Execução	133	Implantar Conciliação Virtual para o Pje
PJE	Em Execução	175	Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho
PJE	Em Execução	183	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor
PJE	Aprovado	88	
Governança	Em Execução	153	Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC
	Em Execução		Atendimento recomendações relacionadas ao processo de Conhecimento e Nível de Serviço da Auditoria CCI 15/2016
Governança	Em Execução	188	
Governança	Em Execução	214	Elaboração do PDTIC 2018
Governança	Em execução	206	Elaborar o plano anual de capacitação 2018
Governança	Aprovado	31	Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço
Governança	Aprovado	33	Regulamentação a Política de Gestão de Demanda
Governança	Aprovado	36	Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação
Governança	Aprovado	37	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema
Infraestrutura	Em Execução	83	Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão
Infraestrutura	Em Execução	167	Aquisição de Certificado Digital SS1 WILDCARD
	Em Execução		Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet na VT de S J dos Patos
Infraestrutura	Em Execução	169	
Infraestrutura	Em Execução	192	Aquisição de pentes de memórias para servidores blade
Infraestrutura	Em Execução	193	Atualização da versão do software do Gabinete Virtual
	Em Execução		Contratação de empresa para serviços de assistência técnica da sala cofre
Infraestrutura	Em Execução	195	
Infraestrutura	Em Execução	205	Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de colaboração baseada em computação em

			nuvem
Infraestrutura	Aprovado	216	Suporte técnico para servidores de aplicação Java Red Hat JBoss EAP (Enterprise Application Platform)
Infraestrutura	Parado	111	Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos
Infraestrutura	Parado	127	Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5
Infraestrutura	Parado	75	Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE
Segurança	Em Execução	109	Contratação de dois links redundantes de Internet
Segurança	Em Execução	154	Aquisição de cartuchos (toner) para impressora Samsung SL-M4070FR
Segurança	Em Execução	170	Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio
Segurança	Em Execução	186	Contratação de Curso de Gestão de Riscos (NBR-ISO/IEC 31000/2009)
Segurança	Em Execução	194	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX
Segurança	Em Execução	200	Serviço de suporte técnico, atualização e upgrade do software Risk Manager
Segurança	Em Execução	202	Estabelecer controles de segurança para atender ao Ofício CSJT.CGGOV nº 34
Segurança	Em Execução	203	Elaborar Plano de Contratações de STIC - 2018
Segurança	Em Execução	185	Aquisição de Normas Técnicas de Segurança da Informação
Segurança	Em Execução	164	Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação
Segurança	Parado	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16
Segurança	Parado	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC
Segurança	Aprovado	172	Adoção de solução para roteamento WAN
Segurança	Aprovado	173	Solução para confecção de carteiras/crachás
Relacionamento com o Cliente	Em Execução	115	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC
Relacionamento com o Cliente	Em Execução	161	Aquisição de uma bateria para Notebook HP ELITEBOOK 840 G1; Série: BRJ4384QH
Relacionamento com o Cliente	Em Execução	182	Aquisição de microcomputadores e periféricos
Relacionamento com o Cliente	Pendente	180	Aquisição de ferramenta para acesso e controle remoto a computadores de usuários em teletrabalho ou fora da rede do TRT16.
Relacionamento com o Cliente	Pendente	191	Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks

Item da Pauta: Plano de Contratações de TIC 2018

7.10. Stanley Araújo apresentou a versão preliminar do Plano Anual de Contratações para o exercício de 2018. Ele informou que o plano foi construído com base nas necessidades de solução de TI do Tribunal.

7.11. Após debates, aprovou-se o Plano Anual de Contratações de TIC 2018 conforme ANEXO III.



7.12. Stanley Araújo informou que a CTIC fez uma análise da capacidade de condução dos projetos constante no plano e alocou os servidores de TI para conduzir a contratação de acordo a essa capacidade. No entanto, para os projetos 39-Aquisição de Materiais para Inventário, 40-Aquisição de Estação de Trabalho Gráfica, 41-Aquisição de Impressora Tipo Plotter, 42-Ferramenta Modelagem de Informações de Construção, 43-Ferramenta de Desenhos Técnicos em Engenharia e Arquitetura, 44-Solução de análise de dados complexos, 45-Solução de impressão em A3 não foi possível designar o responsável para conduzir o planejamento da aquisição. Assim, Stanley Araújo sugeriu que para esses projetos um servidor da área demandante seja responsável pelo planejamento da aquisição, conforme preconiza a Resolução CNJ Nº 182/2013.

7.13. Após debates, o comitê definiu que para os projetos listados acima o setor demandante deve ser o condutor da contratação.

8. Próxima Reunião

A próxima reunião do Comitê será no dia 16 de janeiro de 2017 (terça feira) às 10 horas na sala da Presidência do TRT16.

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Bruno de Carvalho Motejunas	24/11/17	
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	27/11/17	
Rafael Robinson de Sousa Neto	28/11/17	Rafael Robinson de Sousa Neto
Érika Guimarães Gonçalves Dovera	27/11/17	
Stanley Araújo de Sousa	23/11/17	Stanley Araújo de Sousa

ANEXO I

Executor	Status	Rankin	ID	Projeto	Relatório de Status	Nº P.A.
Desenvolvimento	Concluído		18	Criação Portal Trabalho Seguro		3160/2016
Desenvolvimento	Concluído		177	Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência 2017		4855/2017
Desenvolvimento	Concluído		136	Capacitação em ferramenta de Migração de Dados - Pentaho		2672/2017
Desenvolvimento	Em Execução		4	Implantação do SGRH/SIGEP	Cronograma atualizado	2372/2015
Desenvolvimento	Em Execução		166	Capacitação em usabilidade, responsividade, linguagem de programação/arquitetura		4576/2017
Desenvolvimento	Em Execução		187	Nacionalizar Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho		6092/2017
Desenvolvimento	Aprovado	4	11	Sistema de Controle de Veículos	Desistiram veículos e solicitaram portal	5705/2016 30
Desenvolvimento	Aprovado	5	10	Sistema Acompanhamento Virtual de Obras		2137/2015
Desenvolvimento	Aprovado	6	7	Remodelagem do Site do TRT 16		
Desenvolvimento	Aprovado	7	26	Portal CEMOC		2223/2012
Desenvolvimento	Pendente		6	Indexação das publicações do TRT16	Aguardando TST.	5373/2016
Desenvolvimento	Pendente		8	Solução de revista eletrônica	Aguardando definição do demandante	1743/2016
Desenvolvimento	Pendente		25	Modulo nacional da Escola Judicial		3551/2016
Desenvolvimento	Novo		208	Alteração do Sistema de Ponto Eletrônico	Parecer técnico emitido. 1 mês. Levar deliberacao	7345/2017
Desenvolvimento	Novo		210	Implantação do Sistema Panorama Orçamentário	Levar ao comite do SIGEO	5582/2017
PJE	Em Execução		2	CLE		
PJE	Em Execução		123	Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado.		2114/2017
PJE	Em Execução		132	Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)		2392/2017
PJE	Em Execução		133	Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)		2394/2017
PJE	Em Execução		175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Aguardando convênio	5156/2017
PJE	Em Execução		183	Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho		5873/2017
PJE	Aprovado	1	88	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor		527/2017
PJE	Novo		197	Cooperação e cessão de ferramentas (SIG, Sistemas GECJ, ROBÔ BACENJUD)	Aguardando manifestação da presidência	5918/2017
Governança	Concluído		189	Responder o levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário IGOVTIC-JUD 2017		6204/2017
Governança	Em Execução		153	Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC		3463/2017
Governança	Em Execução		188	Atendimento recomendações relacionadas ao processo de Conhecimento e Nível de Serviço da Auditoria CCI 15/2016		6116/2017
Governança	Em Execução		207	Capacitação em Indicadores de Desempenho para Gestão e Governança de TIC		7294/2017
Governança	Em Execução		214	Elaboração do PDTIC 2018		7503/2017
Governança	Aprovado	1	31	Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço		
Governança	Aprovado	2	33	Regulamentação a Política de Gestão de Demanda		
Governança	Aprovado	3	36	Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação		
Governança	Aprovado	4	37	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema		
Governança	Novo		206	Elaborar o plano anual de capacitação 2018		7293/2017
Infraestrutura	Concluído		179	Capacitação em IBM Storwize V(series) Implementation and Workshop		5601/2017
Infraestrutura	Concluído		181	Contratação de suporte técnico em banco de dados Oracle		5596/2017
Infraestrutura	Concluído		79	Aquisição de Certificados e mídias criptográficas		3273/2016

Infraestrutur:	Concluído	165 Aquisição de unidade de backup em fita		4538/2017
Infraestrutur:	Cancelado	149 Aquisição de módulo GSM para alerta de eventos, via celular, da sala cofre	Parado em função da possibilidade de se usar ferramenta free	5341/2016
Infraestrutur:	Em Execução	83 Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão		6173/2016
Infraestrutur:	Em Execução	167 Aquisição de Certificado Digital SS1 WILDCARD	Faltando termo de recebimento (formalização)	4577/2017
Infraestrutur:	Em Execução	169 Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet na VT de S J dos Patos		4266/2017
Infraestrutur:	Em Execução	192 Aquisição de pentes de memórias para servidores blade	Aguardando recebimento	6303/2017
Infraestrutur:	Em Execução	193 Atualização da versão do software do Gabinete Virtual		6377/2017
Infraestrutur:	Em Execução	195 Contratação de empresa para serviços de assistência técnica da sala cofre	Aguardando a contratação	6501/2017
Infraestrutur:	Em Execução	205 Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem		7224/2017
Infraestrutur:	Parado	111 Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos		1540/2017
Infraestrutur:	Parado	127 Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5		2370/2017
Infraestrutur:	Parado	75 Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE	Parado em função de não haver pessoal disponível no desenvolvimento	207/2017
Infraestrutur:	Novo	216 Suporte técnico para servidores de aplicação Java Red Hat JBoss EAP (Enterprise Application Platform)		8097/2017
Segurança	Concluído	84 Implantação de solução de telefonia móvel		5426/2016
Segurança	Em Execução	109 Contratação de dois links redundantes de Internet	Implantação	1420/2017
Segurança	Em Execução	154 Aquisição de cartuchos (toner) para impressora Samsung SL-M4070FR	Faltando assinar a Ata de Registro de Preço	3553/2017
Segurança	Em Execução	170 Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio		4750/2017
Segurança	Em Execução	186 Contratação de Curso de Gestão de Riscos (NBR-ISO/IEC 31000/2009)		6061/2017
Segurança	Em Execução	194 Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX	ETP e TR	6354/2017
Segurança	Em Execução	200 Serviço de suporte técnico, atualização e upgrade do software Risk Manager		6979/2017
Segurança	Em Execução	202 Estabelecer controles de segurança para atender ao Ofício CSJT.CGGOV nº 34		6921/2017
Segurança	Em Execução	203 Elaborar Plano de Contratações de STIC - 2018	Validação	7043/2017
Segurança	Em Execução	185 Aquisição de Normas Técnicas de Segurança da Informação		6062/2017
Segurança	Em Execução	164 Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação		4517/2017
Segurança	Parado	147 Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16		136/2017
Segurança	Parado	168 Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC		4518/2017
Segurança	Aprovado	172 Adoção de solução para roteamento WAN		4840/2017
Segurança	Aprovado	173 Solução para confecção de carterias/crachás		4848/2017
SREC	Concluído	196 Implantação de solução de central de atendimento/serviços de TI	Renovado por mais 6 meses	1635/2017
SREC	Cancelado	82 Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribu	Revisão do estudo técnico preliminar e do termo de referência.	5745/2016
SREC	Em Execução	115 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC		1874/2017
SREC	Em Execução	161 Aquisição de uma bateria para Notebook HP ELITEBOOK 840 G1; Série: BRJ4384Q1H		4013/2017
SREC	Em Execução	182 Aquisição de microcomputadores e periféricos	Recebimento dos equipamentos	5876/2017 81
SREC	Pendente	180 Aquisição de ferramenta para acesso e controle remoto a computadores de usuários e	Incluído no plano orçamentário de 2018	5665/2017
SREC	Pendente	191 Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks	Incluído no plano orçamentário de 2018	6195/2017

ANEXO II

Considerações:

- São módulos (sistemas) do programa SIGEP:
 - **SGRH** (Sistema de Gestão de Recursos Humanos);
 - **Folha** (Sistema de Folha de Pagamento);
 - **Auto Atendimento** (Sistema de Auto atendimento para servidores e magistrados na intranet);
 - **Escola Judicial** (Sistema de Gerenciamento de Folha de Pagamento);
 - **SIGS** (Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho) ;

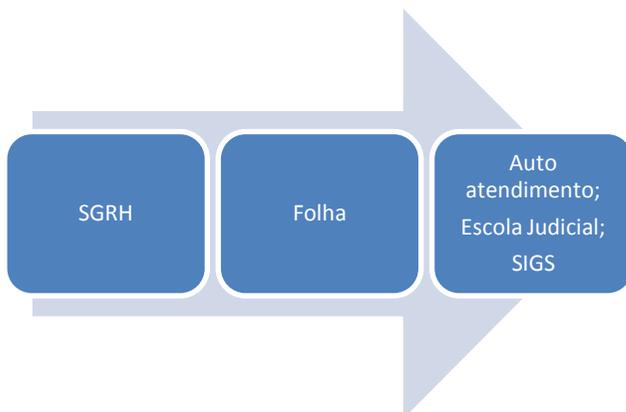


Figura 1 - Fluxo de ordem de pré-requisitos para implantação

Cronograma em 14/11/2017 de migração para o programa SIGEP

Marco	Previsão de Entrega	Entidades do Sistema	Situação / Observações
Etapa 1	NOV / 2016	Servidor – Dados Básicos	Script Concluído
		Dependentes – Dados Básicos	Script Concluído
Etapa 2	FEV / 2017	Quadro de Vagas - Criação de Cargos	Script Concluído
		Provimento – Dados Básicos	Script Concluído
		Dependentes – Finalidades de Dependência	Script Concluído
		Pensionistas	Script Concluído
Etapa 3	MAR / 2017	Provimento - Histórico de Vagas (Magistrados)	Pendente de informações da CGP (provimento de classistas)
		Provimento - Atos de Cargos	Script Concluído
		Provimento - Atos de Especialidades	Script Concluído
		Cessão	Script Concluído
		Exercício Provisório	Script Concluído
		Remoção	Script Concluído
		Requisição	Script Concluído
Etapa 4	ABR/2017	Comissionamento – Titular	Script Concluído
		Comissionamento – Substituição Legal	Script Concluído
		Comissionamento – Substituição Efetiva	Script Concluído
		Lotação	Script Concluído
		Periculosidade / Insalubridade	Script Concluído
		Gratificações GAE / GAS	Script Concluído
Etapa 5	MAI/2017	Quintos	Script Concluído
		Designação de Magistrados	Script Concluído
		Férias - Servidor	Script Concluído
		Férias - Magistrado	Script Concluído
		Auxílios	Script Concluído
		Benefícios	Script Concluído
		Averbações	Script Concluído
Etapa 6	JUN / 2017	Afastamentos	Script Concluído
		Anuênios	Script Concluído

		Previdência	Script Concluído
		Aposentadoria	Em andamento
		Capacitação	Script Concluído
Etapa 7	JUL / 2017	Frequência	Script Concluído
		Progressão	Script Concluído
		Licenças Médicas	Script Concluído
		Cadastros Auxiliares do Módulo de Gestão	Pendente de informações do Setor Gráfico (carteiras funcionais)
		Emissão de Documentos	Não será migrado (não é utilizado pelo TRT2).
Etapa 8	AGO / 2017	Instalação do módulo de Folha de Pagamento – SIGEP	Concluído
Etapa 9	SET / 2017	Implantação do SGRH em Homologação	Concluído
		Instalação do módulo da Escola Judicial	Concluído – Apenas Instalado
Etapa 10	OUT / 2017	Faltas no módulo de Afastamento	Script Concluído
		Ressarcimento de Plano de Saúde - FolhaWeb	Em andamento
		Consignações - FolhaWeb	Em andamento
		Estagiários	Não será migrado (será coberto pelo módulo de Auto Atendimento).
		Início de homologação do SGRH baseado nos resultados do módulo de Folha do SIGEP	Iniciado o processo de homologação e ajustes dos scripts quando necessário
		<i>Ação nacional: Treinamento módulo escola judicial</i>	Suspensão pelo CSJT, novas datas serão disponibilizadas em 2018
Etapa 11	NOV / 2017	Homologação do SGRH baseado no módulo de Folha do SIGEP	Em andamento
		<i>Ação nacional: Treinamento módulo folha de pagamento;</i>	Previsto para primeira semana de Dezembro.
Etapa 12	DEZ / 2017	Período de Homologação e Ajustes	Execução do módulo da folha em paralelo com o Legado
		<i>Ação nacional: Prazo de finalização das rubricas nacionais módulo de folha de pagamento</i>	
Etapa 13	JAN / 2018	Implantação em Produção do SGRH, do módulo da Folha	Execução do SGRH/Folha em paralelo com o Legado
Etapa 14	FEV / 2018	Implantação Escola Judicial em Produção (dependência do módulo de SGRH)	Execução do SGRH/Folha em paralelo com o Legado
		Instalação do módulo de Auto Atendimento	
Etapa 15	MAR / 2018	Previsão de Execução do SGRH e Folha sem paralelismo com Legado	
		Instalação do módulo SIGS para testes	
	ABR / 2018		
	MAIO / 2018		
	JUN / 2018		
	JUL / 2018	Envio de informações para o eSocial 1º de julho de 2018	

Em andamento	Atividades em curso no prazo previsto.
Atrasado	Atividade sem curso ou paradas, com prazo atrasado.
Aguardando	Atividades impedidas de começar ou de continuar.
Concluído	Atividades concluídas, independente do prazo.

ANEXO III

Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

ID	Descrição	Ações do PDTIC	Unidade Demandante	Prazo de Entrega dos Artefatos	Valor Estimado	Fonte de Recursos	Gerente do Projeto
01	Aquisição de notebooks		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 462.500,00	105	Carlos Eduardo Ferreira Marins
02	Aquisição de Impressoras		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 100.000,00	105	Stanley Araujo de Sousa
03	Aquisição de Central de PABX		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 280.000,00	105	Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
04	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva do CFTV		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 120.000,00	105	Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
05	Rede Corporativa de Dados da Justiça do Trabalho - RedeJT		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 542.799,40	105	Moacir Loureiro Pegado Neto
06	Prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Computadores para o TRT16		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 78.085,11	105	Rômulo José Maia Moura
07	Prestação de Serviço de Atendimento em 1º e 2º níveis		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 741.131,65	105	Carlos Eduardo Ferreira Marins
08	Serviço de extensão de garantia de Chassi DELL e servidores Blade		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 182.260,92	105	Antoniél Magalhães De Carvalho
09	Serviço antivírus com gerenciamento centralizado (730 licenças)		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 15.505,20	105	Daniilo Augusto Alves Leite
10	Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$28.904,57	105	Fernando Rola Ferreira Filho
11	Serviço de Suporte Técnico de Solução de filtro com conteúdo WEB		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 15.705,00	105	João Luiz De Oliveira Costa Neto
12	Prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Computadores à Vara do Trabalho de São João dos Patos		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 16.211,25	105	Pablo Teófilo Durans

Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

13	Serviço do Suporte técnico do banco de dados ORACLE		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 122.855,10	105	Leonel Carneiro Pereira
14	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da SALA COFRE		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 372.000,00	105	Fernando Rola Ferreira Filho
15	Serviço de envio de mensagens curta (SMS)		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 300,00	105	Gilberto Cunha Filho
16	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 292.822,53	105	Fernando Rola Ferreira Filho
17	Serviço de suporte ao servidor de Aplicação Jboss		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 131.329,79	105	Leonel Carneiro Pereira
18	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 50.000,00	105	Stanley Araujo De Sousa
19	Solução de gravação de áudio do Pleno		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 14.000,04	105	Pablo Teófilo Durans
20	Serviço de Suporte ao Assyst		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 74.030,04	105	Carlos Eduardo Ferreira Marins
21	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 274.303,74	105	Stanley Araujo De Sousa
22	Serviço de Monitoramento do PJe-JT		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 122.458,63	105	Rômulo José Maia Moura
23	Serviço de extensão de garantia de Switch SAN		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 10.000,00	105	João Luiz de Oliveira Costa Neto
24	Serviço de suporte e manutenção para equipamentos firewall ASA		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 100.000,00	105	Aured De Freitas Costa Rodrigues
25	Aquisição de equipamentos firewall ASA camada 7		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 1.200.000,00	105	Aured de Freitas Costa Rodrigues
26	Prestação de Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software - Módulo <i>Risk Manager</i>		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 38.999,00	105	Danilo Augusto Alves Leite

Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

27	Aquisição de solução de hiperconvergência		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 1.200.000,00	105	Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
28	Serviço especializado para instalação de pontos de rede de acesso à rede de dados corporativa, com fornecimento de materiais mão de obra necessária		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 480.000,00	105	Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
29	Aquisição de Licença de Software de acesso remoto		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 5.200,00	105	Carlos Eduardo Ferreira Marins
30	Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photoshop)		Assessoria de Comunicação, Setor de Gráfico, Escola Judicial		R\$ 46.800,00	105	Assessoria de Comunicação, Setor de Gráfico, Escola Judicial
31	Aquisição de scanners de produção		Coord. de Material e Logística		R\$ 140.000,00	105	Stanley Araujo De Sousa
32	Aquisição de Midia Criptográfica e Certificado Digital		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 20.395,00	105	Pablo Teófilo Durans
33	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreks de 40Kva		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 24.000,00	105	Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
34	Aquisição de Ferramenta de BI		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 20.000,00	105	Gutemberg Pereira Vidal Santos
35	Aquisição de Ferramenta de Gerenciamento de Portfólio e Projetos		Coord. Tec. De T.I e Comunicações, Seção de Engenharia		R\$ 21.000,00	105	Rafael Robinson De Sousa Neto
36	Ferramenta de Suite de Escritório		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 170.000,00	105	Danilo Augusto Alves Leite
37	Serviço de Comunicação Corporativa		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 120.000,00	105	Rodrigo Silveira Alexandre
38	Aquisição de Monitores de Video Ultra Widescreen 29 polegadas		Secretaria do Pleno, Secretaria de Orçamento e Finanças, Secretaria de Administração		R\$ 64.000,00	105	Stanley Araujo de Sousa

Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

39	Aquisição de Materiais para Inventário		Coord. de Material e Logística		R\$ 25.000,00	105	Coord. de Material e Logística
40	Aquisição de Estação de Trabalho Gráfica		Seção de Engenharia, Assessoria de Comunicação, Setor Gráfico, Escola Judicial		R\$ 48.000,00	105	Seção de Engenharia, Assessoria de Comunicação, Setor Gráfico, Escola Judicial
41	Aquisição de Impressora Tipo Plotter		Seção de Engenharia		R\$ 10.000,00	105	Seção de Engenharia
42	Ferramenta Modelagem de Informações de Construção		Seção de Engenharia		R\$ 30.000,00	105	Seção de Engenharia
43	Ferramenta de Desenhos Técnicos em Engenharia e Arquitetura		Seção de Engenharia		R\$ 30.000,00	105	Seção de Engenharia
44	Solução de análise de dados complexos		Coord. de Controle Interno		R\$ 24.290,00	105	Coord. de Controle Interno
45	Solução de impressão em A3		Setor Gráfico		R\$ 7.000,00	105	Setor Gráfico
46	Solução Gabinete Virtual		Coord. Tec. De T.I e Comunicações		R\$ 47.820,00	105	Antoniél Magalhães De Carvalho
Total					R\$ 6.186.851,87		

Tabela 1: Plano de Contratações de TI
