



TRT-16ª REGIÃO
Maranhão

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2023-2024

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região



SUMÁRIO

1. [Apresentação](#)
2. [Referencial Estratégico](#)
3. [Período de Abrangência](#)
4. [Estrutura de TIC](#)
5. [Modelo de Governança de TIC](#)
6. [Direcionadores](#)
7. [Monitoramento Estratégico](#)
8. [Monitoramento Tático](#)
9. [OKRs Ciclo 2023/2024](#)
10. [Instrumentos do PDTIC](#)
11. [Macrodesafios e Fatores Críticos de Sucesso](#)
12. [Resultado do Portfólio de Projetos do PDTIC de 2023](#)
[Anexo IV - Portfólio de Projetos do PDTIC de 2023](#)
[Anexo IX – Portfólio de Projetos do PDTIC de 2024](#)

- **JT:** Justiça do Trabalho;
- **CNJ:** Conselho Nacional da Justiça;
- **CSJT:** Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
- **TRT16:** Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região;
- **ENTIC-JUD:** Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, definida pela Resolução 370/2021 do CNJ;
- **SETIC:** Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- **PDTIC:** Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- **PE:** Plano Estratégico;
- **CTIC:** Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
- **STIC:** Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

Este documento tem por objetivo apresentar o **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)** do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região para os exercícios de **2023 e 2024**.

O PDTIC é uma ferramenta que possibilita o diagnóstico, a definição de objetivos, o planejamento de ações e a gestão racional dos recursos de TIC, com foco no atendimento da estratégia organizacional, assim como no suporte aos serviços e soluções tecnológicas essenciais ao negócio. É limitada no tempo e é passível de revisão periódica para eventuais ajustes de objetivos, abrangência, prazos, e outros.


A necessidade de elaboração e atualização do PDTIC para Órgãos integrantes do Poder Judiciário está estabelecida na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD – Resolução nº 370/2021 do CNJ:

Art. 6º Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deverá elencar às ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.


Nesse sentido, o presente plano contempla as **necessidades tecnológicas do TRT16** para o biênio 2023-2024, submetido e aprovado pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT16.

2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

O principal normativo que contribuiu para este plano foi a Resolução CNJ nº 370/2021 (ENTIC-JUD), fonte estratégica no âmbito da Tecnologia da Informação para o Poder Judiciário, com abrangência nacional. O PDTIC-TRT16 também está igualmente alinhado ao Plano Estratégico 2021-2026 do TRT16 ([PEI-TRT16](#)) e ao Plano Diretor de TIC da Justiça do Trabalho 2023-2024 ([PDTIC-JT](#)).

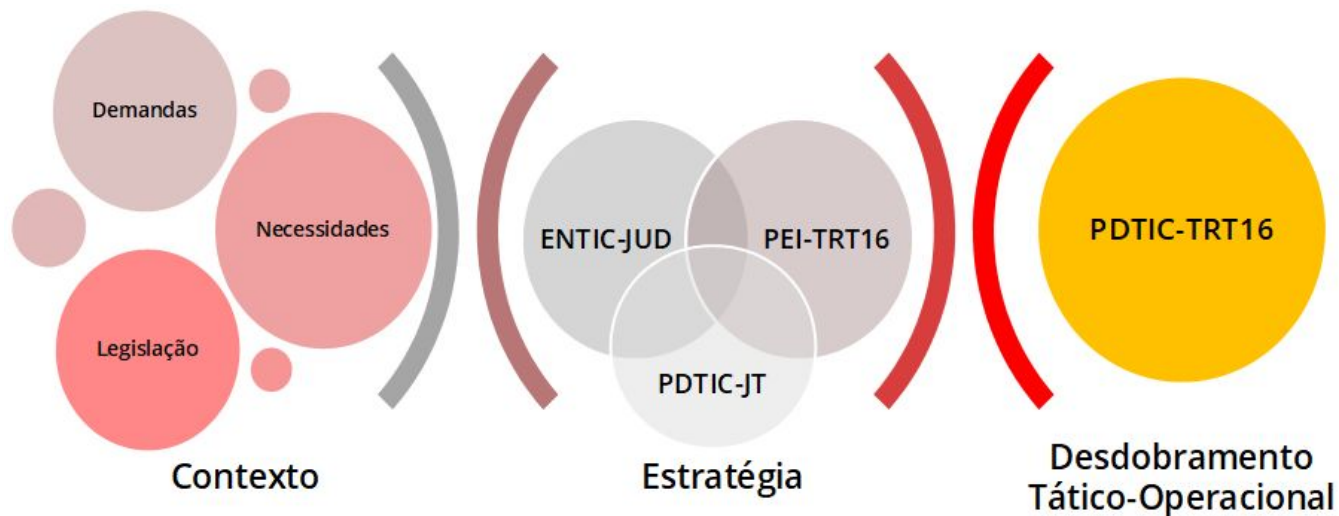


3. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA

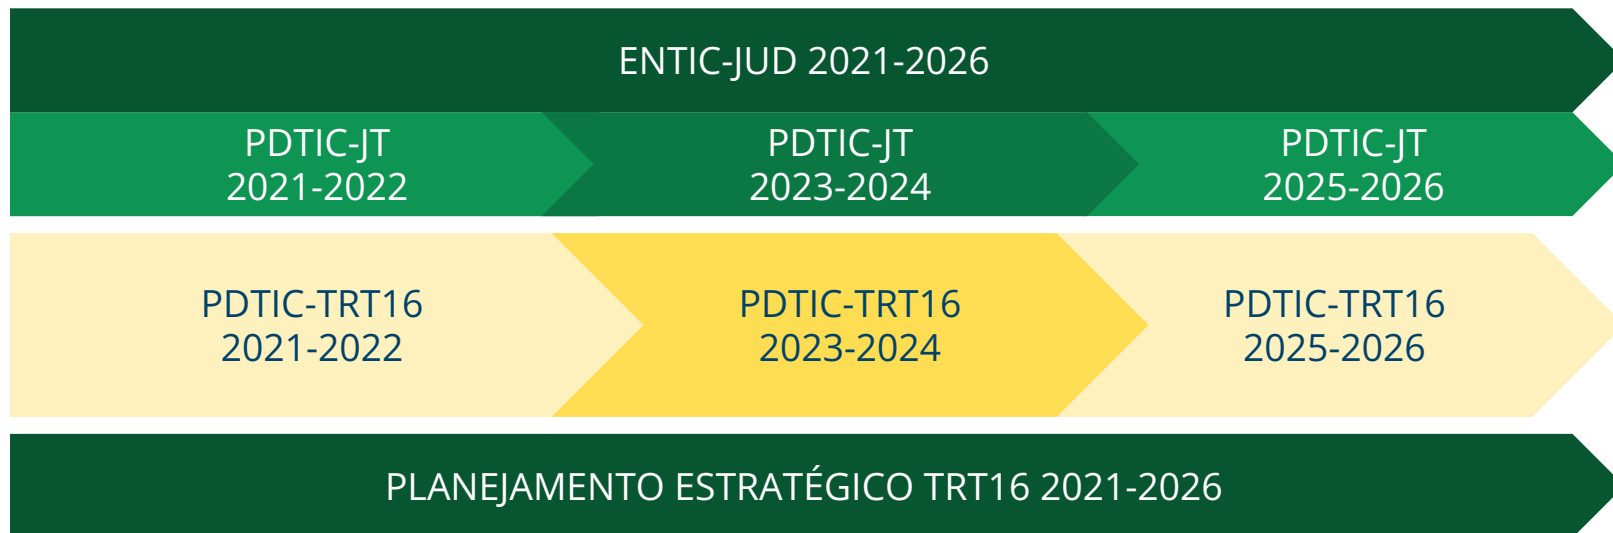

4. ESTRUTURA DE TIC


A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (**SETIC**) é a unidade responsável pela área de TIC do Tribunal. Ela está vinculada ao Gabinete de Presidência e conta com 6 unidades subordinadas com um total de 43 servidores lotados.



TOTAL: 43 servidores lotados na área de TIC

5. MODELO DE GOVERNANÇA DE TIC

O Modelo de Governança de TIC do TRT16 é definido pela **Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC)**, conforme estabelecido na Portaria GP Nº 180/2023;

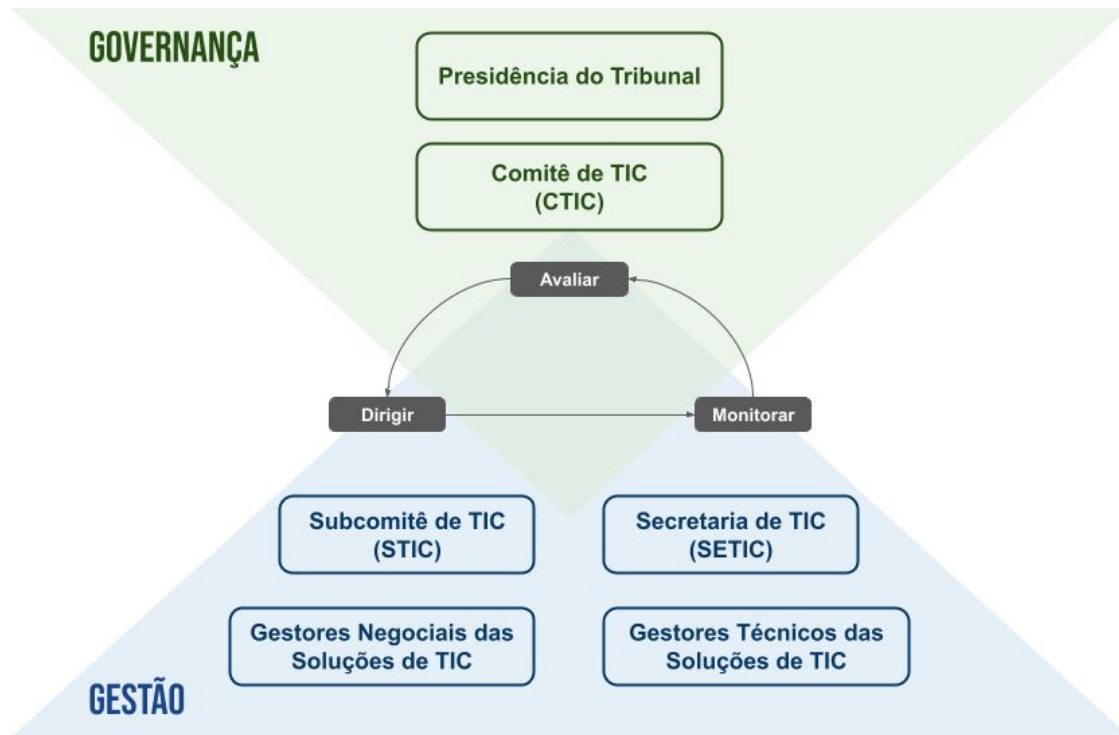

Conforme já citado anteriormente, a ENTIC-JUD, o PEI-TRT16 e o PDTIC-JT são as bases para a elaboração do PDTIC-TRT16.

Os objetivos da ENTIC-JUD 2021-2026 estão descritos a seguir:



6. DIRECIONADORES

Enquanto os macrodesafios estão do PEI-TRT16 estão definidos conforme segue:



O responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do PDTIC-TRT16 é o **Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC**, normatizado pela [Portaria GP Nº 136/2023](#).

Os indicadores estratégicos estão presentes no **PEI-TRT16** e são:

Código	Indicador	Meta	Resultados		
			2021	2022	2023
IPJe	Índice de Processos Judiciais Eletrônicos (IPJe).	Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total, conforme glossário de metas CNJ.	100% Meta: 100% Cumprida ✓	100% Meta: 100% Cumprida ✓	100% Meta: 100% Cumprida ✓
ISS-TIC	Índice de Satisfação com os Sistemas de TIC (ISS-TIC).	Avaliar o índice de satisfação com os sistemas de TIC, destinados ao público interno e externo.	87,20% Meta: Avaliar Cumprida ✓	83,90% Meta: Avaliar Cumprida ✓	87,90% Meta: Avaliar Cumprida ✓
iGovTIC-JUD	Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD).	Alcançar, no mínimo, a classificação “aprimorado” no Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD).	62,18% Meta: Aprimorado (>60) Cumprida ✓	75,72% Meta: Aprimorado (>65) Cumprida ✓	84,31% Meta: Aprimorado (>70) Cumprida ✓

Em alinhamento com a ENTIC-JUD, que utiliza a metodologia OKR como instrumento de gestão (art. 45, § 4º), os PDTICs que abrangem a Justiça do Trabalho no sexênio relacionado a essa estratégia de TIC nacional seguirão essa metodologia. Para elaborar os Objetivos Táticos e os Resultados-Chave, utiliza-se a fórmula de *Doerr*:



Serão utilizados como base os OKRs do PDTIC-JT, visto que há um alinhamento entre os normativos, podendo serem alterados conforme os ciclos de acompanhamento vão sendo realizados.

Estabelecidos os Objetivos e os Resultados-Chave, são definidas iniciativas que contribuem para o atingimento desses resultados-chave, que, de forma geral, estão **agrupadas em anexos** a este documento e correspondem ao item **Instrumentos do PDTIC**.

9. OKRS CICLO 2023/2024

Perspectiva	Objetivo (O)	Código	Resultado-Chave (KR)	Memória de Cálculo	Meta	Medir a partir de
SOCIEDADE	Alcançar nível de Excelência na Justiça do Trabalho no tema "Transformação Digital" do iGovTIC-JUD.	SOC-TDIG-01	Ter a nota de 90 pontos no tema "Transformação Digital" no iGovTIC-JUD. Nota de 2022: 69,75	Simulador do IGOVTIC-JUD 2022, no tema "Transformação Digital".	90	2º Ciclo (Set/23)
PROCESSOS INTERNOS	Aumentar a execução orçamentária de TIC em relação ao plano orçamentário vigente, considerando as ações nacionais prioritizadas.	PRO-GOVG-01	Ter o orçamento anual encerrado com execução de 100% em GND3 para contratos continuados em relação ao planejado em TIC.	Média das taxas de execução em GND3 (serviços continuados) dos Tribunais, considerando o planejamento atualizado.	100%	1º Ciclo (Jun/23)
		PRO-GOVG-02	Ter o orçamento anual encerrado com execução de 90% em GND3 para novos contratos em relação ao planejado em TIC.	Média das taxas de execução em GND3 (contratações novas) dos Tribunais, considerando o plano de contratações atualizado.	90%	1º Ciclo (Jun/23)
		PRO-GOVG-03	Ter o orçamento anual encerrado com execução de 90% em GND4, no mínimo, em relação ao planejado em TIC.	Média das taxas de execução em GND4 dos Tribunais, considerando o plano de contratações atualizado.	90%	1º Ciclo (Jun/23)
	Aumentar o nível de maturidade dos Tribunais no tema "Riscos, segurança da informação e proteção de dados" do IGOVTIC-JUD.	PRO-SEGD-01	Ter a nota de 90 pontos no tema "Riscos, segurança da informação e proteção de dados" do IGOVTIC-JUD, considerando o resultado alcançado em 2022. Nota de 2022: 78,75	Simulador IGOVTIC-JUD 2022 no tema "Riscos, segurança da informação e proteção de dados".	90	1º Ciclo (Jun/23)
	Aumentar o nível de maturidade dos Tribunais no tema "Infraestrutura Tecnológica e Serviço em Nuvem" do iGovTIC-JUD.	PRO-SINF-01	Ter a nota de 75 pontos no tema "Infraestrutura Tecnológica e Serviço em Nuvem" do IGOVTIC-JUD, considerando o resultado alcançado em 2022. Nota de 2022: 51,00	Simulador IGOVTIC-JUD 2022 no tema "Infraestrutura Tecnológica e Serviço em Nuvem".	75	2º Ciclo (Set/23)
	Alcançar os padrões mínimos necessários para garantir a continuidade dos serviços prioritários de TIC da Justiça do Trabalho.	PRO-SINF-02	Estar em conformidade com os padrões mínimos necessários para garantir a disponibilidade do PJe, conforme a Res. 185/2013 CNJ.		Conforme	4º Ciclo (Mar/24)
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	Atingir o nível de maturidade "Aprimorado" no tema "Pessoas" do iGovTIC-JUD.	APC-DPES-01	Ter 90% do Plano Anual de Capacitação em TIC cumprido.	Razão entre a quantidade das capacitações planejadas para o período e o total realizadas	90%	2º Ciclo (Set/23)
		APC-DPES-02	Ter a nota de 70 pontos no tema "Pessoas" do IGOVTIC-JUD. Nota em 2022: 42,00	Simulador IGOVTIC-JUD 2022, no tema "Pessoas".	70	1º Ciclo (Jun/23)
		APC-DPES-03	Estar aderente aos critérios presentes no normativo de TIC da Justiça do Trabalho que regulamenta a disponibilidade de equipes colaboradores das áreas de TIC para sustentação e suporte aos sistemas nacionais.	Critérios estabelecidos em normativo relacionado ao tema (nível de aderência).	Aderente	4º Ciclo (Mar/24)

9. RESULTADOS DOS OKRS CICLO 2023/2024

Perspectiva	Código	Meta	Medir a partir de	1º e 2º Ciclos	3º Ciclo
				25/09 a 09/10/2023	12/12/2023 a 19/01/2024
SOCIEDADE	SOC-TDIG-01	90	2º Ciclo (Set/23)	92,75	92,75
PROCESSOS INTERNOS	PRO-GOVG-01	100%	1º Ciclo (Jun/23)	45,35%	39,36%
	PRO-GOVG-02	90%	1º Ciclo (Jun/23)	33,66%	10,26%
	PRO-GOVG-03	90%	1º Ciclo (Jun/23)	121,00%	122,55%
	PRO-SEGD-01	90	1º Ciclo (Jun/23)	69,75	69,75
	PRO-SINF-01	75	2º Ciclo (Set/23)	-	72,86
	PRO-SINF-02	Conforme	4º Ciclo (Mar/24)	-	-
	APC-DPES-01	90%	2º Ciclo (Set/23)	38,03%	56,34%
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	APC-DPES-02	70	1º Ciclo (Jun/23)	42,00	42,00
	APC-DPES-03	Aderente	4º Ciclo (Mar/24)	-	-

Os instrumentos utilizados para o direcionamento das ações do PDTIC são:

- **Anexo I** – Plano de Contratações Anual de TIC de 2023;
- **Anexo II** – Plano Orçamentário de TIC de 2023;
- **Anexo III** – Plano Anual de Capacitação de TIC de 2023;
- **Anexo IV** – Portfólio de Projetos do PDTIC de 2023;
- **Anexo V** – Estudo qualitativo, quantitativo e de rotatividade do Quadro Pessoal de TIC- 2023;
- **Anexo VI** – Plano de Contratações Anual de TIC de 2024;
- **Anexo VII** – Plano Orçamentário de TIC de 2024;
- **Anexo VIII** – Plano Anual de Capacitação de TIC de 2024;
- **Anexo IX** – Portfólio de Projetos do PDTIC de 2024;
- **Anexo X** – Plano de Transformação Digital da Justiça do Trabalho 2023-2026;

Link para acesso aos anexos 

Os **macrodesafios** do PDTIC estão relacionados às diretrizes da nova ENTIC-JUD – Resolução nº 370/2021 do CNJ–, em especial à mudança de paradigma da infraestrutura para sustentação dos serviços de TIC com foco na implantação de **serviços e plataforma de nuvem**, e priorização de investimentos em segurança da informação e **combate a crimes cibernéticos**.

Já os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o plano alcance a efetividade esperada e se torne num importante instrumento de implementação das estratégias do Tribunal. Destacam-se como elementos críticos para implementação e consequente obtenção de resultados previstos pelo plano:

- Apoio da alta administração do Tribunal;
- Acompanhamento e Monitoramento pela instâncias de decisões de TIC (CTIC e STIC);
- Continuidade do PDTIC, sendo compreendido como um instrumento dinâmico e contínuo;
- Participação efetiva dos integrantes da SETIC na implantação, monitoramento da execução do PDTIC;
- Disponibilização de recursos orçamentários e de recursos humanos de TIC para execução das ações e projetos previstos no plano.

12. RESULTADO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS DO PDTIC DE 2023


Resultado do Portfólio de Projetos do PDTIC de 2023 (Anexo IV)

No ano de 2023, estava prevista a execução de 21 projetos com o propósito de aprimorar a gestão, governança e processos internos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), garantir a manutenção de serviços essenciais ao Tribunal e promover o desenvolvimento e implementação de sistemas nacionais.

Registra-se que 13 projetos foram concluídos com êxito, um projeto foi cancelado, e outros 7 permanecem em andamento, conforme apresentado na figura adjacente.

Dentre os projetos concluídos, destacam-se as realizações mais significativas do Portfólio de 2023:

- Implantação do PROAD-OUV
- Implantação do Sistema de Diárias
- Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
- Solução de Audiências Híbridas
- Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23
- Integração do PJe-JT ao Domicílio Judicial Eletrônico
- Implantação do GLPI



Os projetos que permanecem em andamento foram incorporados ao Portfólio de Projetos de 2024.


13. RESULTADO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE TIC DE 2023

O Plano de Contratações de Anual de TIC de 2023 está inserido dentro do [plano anual do Tribunal](#), mais precisamente na seção **IV - Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações**.


Em 2023, estavam previstas **24 contratações** entre prorrogações de contratos já existentes e novas contratações. No decorrer do exercício de 2023, outras **9 contratações foram incluídas**, não inicialmente previstas, em virtude da dinâmica e evolução constante das demandas tecnológicas. Tais ajustes foram necessários para atender a necessidades emergentes e garantir a implementação eficaz de soluções inovadoras.

A lista de contratações atualizada e com o seu resultado final está no [Anexo I](#).

Previsto no Plano



Status das contratações





ANEXO I – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE TIC DE 2023 (FINALIZADO)

Id	Objeto da Contratação	SEI	Previsto no Plano	Unidade Responsável	Status	Resultado
1	Solução integrada de comunicação de voz e telefonia IP (VOIP)	5495/2019	Sim	SRC	Concluído	Aditivo nº 3 do Contrato nº 45/2019
2	Solução de videoconferência em Nuvem - Zoom	5199/2020	Sim	SGTI	Concluído	Aditivo nº 3 do Contrato nº 07/2021
3	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP)	547/2019	Sim	SGTI	Concluído	Aditivo nº 4 do Contrato nº 05/2020
4	Serviço de Atendimento ao Usuário de T.I	2042/2021	Sim	SRC	Concluído	Aditivo nº 3 do Contrato nº 20/2021
5	Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços	5174/2021	Sim	SRC	Cancelado	A ferramenta Assyst foi substituída pelo GLPI
6	Suporte a Tecnologias Open Source PJe-JT	2837/2021	Sim	DIVINFRA	Concluído	Aditivo nº 1 do Contrato nº 02/2022
7	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle	671/2021	Sim	DIVINFRA	Concluído	Aditivo nº 2 do Contrato nº 03/2021
8	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	3249/2020	Sim	DIVINFRA	Concluído	Aditivo nº 1 do Contrato nº 10/2021
9	Serviço de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala Segura	332/2020	Sim	DIVINFRA	Concluído	Aditivo nº 2 do Contrato nº 09/2021
10	Serviços de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala-Cofre	4486/2023	Sim	DIVINFRA	Concluído	Contrato nº 33/2023
11	Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT) Redudante	7885/2022	Sim	DIVINFRA	Concluído	Contrato nº 25/2023
12	Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT)	7885/2022	Sim	DIVINFRA	Concluído	Contrato nº 24/2023
13	Suporte a Solução de Gerenciamento de Riscos	5374/2021	Sim	DIVINFRA	Cancelado	Contrato nº foi assinado um dia após o fim da vigência da ARP. Por isso foi tornada sem efeito o Contrato nº e o projeto cancelado.
14	Solução Integrada de Colaboração Baseada em Nuvem	7224/2017	Sim	DIVINFRA	Cancelado	Realizada a rescisão do Contrato nº 21/2018 e uma nova contratação ainda em 2022 por 30 meses. Contrato nº 16/2022 (PA 2606/2022).
15	Mídia Criptográfica USB (Token)	4673/2022	Sim	SGTI	Concluído	Contrato nº 36/2022
16	Licenças de software WINDOWS	4232/2021	Sim	DIVINFRA	Concluído	2023NE000305
17	Cofre para Mídias Magnéticas (Fita Backup)	2920/2022	Sim	DIVINFRA	Concluído	2022NE000636
18	Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança	4233/2021	Sim	DIVINFRA	Concluído	Contrato nº 10/2023
19	Solução de Business Intelligence	4019/2022	Sim	SGTI	Concluído	Contrato nº 01/2023
20	Aquisição de Computadores, Monitores e Acessórios	1858/2022	Sim	SRC	Concluído	Contrato nº 13, 14 e 15 de 2023
21	Solução de Gravação de Audiências Presenciais de Primeiro Grau (Kit audiência)		Sim	SGTI	Cancelado	Adquirido em 2022 webcams pelo Contrato nº 23/2022 (PA 5693/2021) e solução de videoconferências híbridas Contrato nº 32/2022 (PA 431/2022)

ANEXO I – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE TIC DE 2023 (FINALIZADO)

Id	Objeto da Contratação	SEI	Previsto no Plano	Unidade Responsável	Status	Resultado
22	Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM)	5153/2021	Sim	SSI	Concluído	Aditivo nº 1 do Contrato nº 27/2022
23	Solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade	755/2022	Sim	SSI	Cancelado	Falta de mão de obra para a implantação.
24	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS	6522/2022	Sim	DIVINFRA	Concluído	Contrato nº 11/2023
25	Aquisição de Impressoras Multifuncionais	1189/2023	Não	SRC	Concluído	ARP TRT8 nº 18/2023
26	Aquisição de solução de armazenamento de dados para o PJe 2023	1396/2023	Não	DIVINFRA	Em andamento	Contratação em andamento gerenciada pelo TST
27	Solução de backup para ambiente de TIC virtualizado e físico	1624/2021	Não	DIVINFRA	Concluído	Contrato nº 02/2023
28	Serviço de Certificação Digital e Mídia Criptográfica (Token) 2024	2404/2023	Não	SGTI	Em andamento	Contratação nacional em andamento conduzida pelo TRT16
29	Serviço de garantia e atualização de assinaturas de proteção e suporte técnico para Solução Next Generation Firewall	2935/2023	Não	DIVINFRA	Concluído	Contrato nº 32/2023
30	Serviço de Atendimento ao Usuário de TI de 2024	7217/2023	Não	SRC	Em andamento	Contratação em andamento para 2024
31	Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT) Emergencial	4033/2023	Não	DIVINFRA	Concluído	Aditivo nº 4 do Contrato nº 12/2018
32	Suporte a Tecnologias Open Source PJe-JT de 2024	2837/2021	Não	DIVINFRA	Concluído	Aditivo nº 2 do Contrato nº 02/2022
33	Suporte e garantia técnica da biblioteca de fitas LTO7	6463/2023	Não	DIVINFRA	Em andamento	Contratação em andamento para 2024

ANEXO IV - PORTFÓLIO DE PROJETOS DO PDTIC DE 2023 (FINALIZADO)

Id	Unidade	Referência	Tema	Projeto	Demandante	Situação
1	DIVDES	PDTIC 2022	Software	Implantação do PROAD-OUV	SOVD	Concluído
2	DIVDES	PDTIC 2022	Pje	Notificações - Push	CSJT	Concluído
3	DIVDES	PDTIC 2022	Software	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	GPRE	Em andamento - 89%
4	DIVDES	PDTIC 2022	Software	Implantação do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)	DG	Cancelado
5	DIVDES	CSJT	Software	Implantação do Sistema Apuração de Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ)	GPRE	Concluído
6	DIVDES	CSJT	Software	Implantação do Sistema de Diárias	DG	Concluído
7	DIVINFRA	PDTIC 2022	Infraestrutura	Reestruturação da rede LAN da Capital	SETIC	Em andamento - 80%
8	DIVINFRA	Interna	Infraestrutura	Migrar Oracle 11 para ambiente virtualizado	DIVINFRA	Concluído
9	SETIC	PDTIC 2022	Software	Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	DG	Concluído
10	SETIC	PDTIC 2022	Inovação	Solução de Audiências Híbridas	SETIC	Concluído
11	SGTI	PDTIC 2022	Governança e Gestão	Revisão dos processos de TIC	SETIC	Em andamento - 10%
12	SGTI	PDTIC 2022	Governança e Gestão	Elaborar o Plano Diretor de TIC 2023-2024	SETIC	Concluído
13	SPJE	Portfólio 2021	Pje	Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23	GPRE	Concluído
14	SPJE	CSJT	Pje	Implantação do Robô Preá	GPRE	Concluído
15	SSI	Auditoria	Segurança da Informação	Atualizar a Política de Segurança da Informação	SETIC	Em andamento - 40%
16	DIVDES	CSJT	Pje	Integração do Pje-JT ao Domicílio Judicial Eletrônico	CSJT	Concluído
17	SREC	Interna	Service Desk	Implantação do GLPI	SETIC	Concluído
18	SPJE	Interna	Inteligência Artificial	Implantação da Ferramenta I – CON	NUPEMEC	Em andamento - 20%
19	DIVDES	CSJT	Transparência	Criação da Agenda de Magistrados	GPRE	Concluído
20	SETIC	Interna	Infraestrutura	Implantação dos Drives Compartilhados	SETIC	Em andamento - 20%
21	DIVDES	Interna	Software	Migração de Sistemas para o Oracle 19	SETIC	Em andamento - 25%

ANEXO VI – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE TIC DE 2024

Id	Objeto da Contratação	SEI	Previsto	Contratação	Un. Resp.	Estimado Anual	Início	Prev. Contr.
1	Solução de Rede Sem Fio	1965/2022	Sim	Nova Contratação	DIVINFRA	R\$ 700.000,00	18/04/2022	05/02/2024
2	Serviço de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala Segura	332/2020	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 146.837,28	19/12/2022	01/05/2024
3	Serviço de Validação, Emissão e Gravação de Certificado Digital	1938/2021	Sim	Contratação Recorrente	SGTI	R\$ 10.412,04	04/08/2023	03/06/2024
4	Solução de videoconferência em Nuvem (Zoom)	5199/2020	Sim	Contratação Recorrente	SGTI	R\$ 17.525,64	16/08/2023	13/02/2024
5	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle	671/2021	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 161.747,52	27/10/2023	27/04/2024
6	Serviço de Acesso Secundário à Internet - FORTEL	11019/2023	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 8.448,00	18/11/2023	21/04/2024
7	Serviço de Acesso Primário à Internet - MOB	11019/2023	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 8.124,00	18/11/2023	21/04/2024
8	Aquisição de Computadores e monitores		Sim	Nova Contratação	SRC	R\$ 1.557.305,40	15/01/2024	08/07/2024
9	Licenças de software WINDOWS		Sim	Nova Contratação	DIVINFRA	R\$ 492.280,00	03/02/2024	07/07/2024
10	Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança		Sim	Nova Contratação	DIVINFRA	R\$ 59.520,00	03/02/2024	07/07/2024
11	Serviço de Atendimento ao Usuário de TI	2571/2020	Sim	Contratação Recorrente	SRC	R\$ 641.492,64	07/02/2024	04/10/2024
12	Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços	5174/2021	Sim	Contratação Recorrente	SRC	R\$ 80.930,40	18/03/2024	18/08/2024
13	Solução Omnichannel	-	Sim	Nova Contratação	SRC	R\$ 222.720,00	18/03/2024	16/09/2024
14	Aquisição de Notebook	-	Sim	Nova Contratação	SRC	R\$ 818.400,00	01/04/2024	01/10/2024
15	Aquisição de Webcams	-	Sim	Nova Contratação	SRC	R\$ 45.848,00	01/04/2024	01/10/2024
16	Aquisição de Câmera PTZ 10X para Pleno e Ejud	-	Sim	Nova Contratação	SRC	R\$ 15.000,00	01/04/2024	01/10/2024
17	Atualização dos equipamentos dos subsistemas da Sala-Cofre - Site Principal	-	Sim	Nova Contratação	DIVINFRA	R\$ 818.400,00	01/04/2024	09/09/2024
18	Aquisição de Solução de Armazenamento de Dados (Storage)	-	Sim	Nova Contratação	DIVINFRA	R\$ 1.250.000,00	01/04/2024	01/10/2024
19	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP)	547/2019	Sim	Contratação Recorrente	SGTI	R\$ 113.496,96	15/04/2024	13/10/2024
20	Mídia Criptográfica (Token) USB	658/2021	Sim	Contratação Recorrente	SGTI	R\$ 18.650,39	19/04/2024	16/10/2024
21	Serviços de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala Cofre	4263/2018	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 331.612,08		
22	Suporte a Solução de Gerenciamento de Riscos	5374/2021	Sim	Contratação Recorrente	SSI	R\$ 6.917,40		
23	Suporte Técnico e Manutenção da Solução de Telefonia VOIP	6354/2017	Sim	Contratação Recorrente	SRC	R\$ 116.536,94		
24	Suporte à Solução de Antivírus	481/2021	Sim	Contratação Recorrente	SSI	R\$ 27.248,16		
25	Suporte a Tecnologias Open Source do PJe-JT	2837/2021	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 48.409,80		
26	Suporte à Plataforma de Banco de Dados PostgreSQL	3249/2020	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 271.895,76		
27	Serviço de Telecomunicação de Dados de Longa Distância (Rede-JT) Redundante	7885/2022	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 649.138,68		
28	Solução Integrada de Colaboração Baseada em Nuvem (GSUITE)	7224/2017	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 124.524,72		
29	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS	6522/2022	Sim	Contratação Recorrente	DIVINFRA	R\$ 19.892,40		
30	Solução de Business Intelligence (Power BI)	2605/2020	Sim	Contratação Recorrente	SGTI	R\$ 2.119,66		
31	Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM)	5153/2021	sim	Contratação Recorrente	SSI	R\$ 2.236.000,00	19/04/2024	15/12/2024
32	Suporte ao Serviço Gerenciado do Firewall	2935/2023	sim	Contratação Recorrente	SETIC	R\$ 203.048,04		

ANEXO IX – PORTFÓLIO DE PROJETOS DO PDTIC DE 2024

Id	Unidade	Referência	Tema	Projeto	Demandante	Status
1	DIVDES	PDTIC 2023	Software	Migração de Sistemas para o Oracle 19	SETIC	Em andamento
2	DIVDES	PDTIC 2023	Software	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	GPRE	Em andamento
3	DIVDES	Demanda Interna	Software	Migração das páginas legadas do Portal Institucional	SETIC	A iniciar
4	DIVDES	Comitê do SIGEP	Software	Implantação do módulo de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas	SGP	A iniciar
5	DIVDES	SEI 5373/2016	Software	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/Dspace)	GPRE	A iniciar
6	DIVINFRA	PDTIC 2023	Infraestrutura	Reestruturação da rede LAN da Capital	SETIC	Em andamento
7	DIVINFRA	Demanda Interna	Segurança da Informação	Implantação de serviço de gerenciamento e correlacionamento de logs	DIVINFRA	A iniciar
8	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Instalação de cluster kubernetes no site backup	DIVINFRA	A iniciar
9	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Migrar máquinas de banco da rede legada para Vlan dedicada	DIVINFRA	A iniciar
10	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Criar clusters de banco de dados dedicados para os satélites do PJe dos ambientes de Apoio, Homologação e Bugfix	DIVINFRA	A iniciar
11	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Implantação de nova solução de rede Wifi	DIVINFRA	A iniciar
12	DIVINFRA	Demanda Interna	Infraestrutura	Implantação dos novos links de dados nas VTs do interior do estado	DIVINFRA	Em andamento
13	SETIC	Demanda Interna	Governança e Gestão	Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - TRT14	SETIC	A iniciar
14	SGTI	PDTIC 2023	Infraestrutura	Implantação dos Drives Compartilhados	SETIC	A iniciar
15	SGTI	PDTIC 2023	Governança e Gestão	Revisão de Processos de TIC	SETIC	Em andamento
16	SGTI	Res CNJ 370/2021	Governança e Gestão	Elaborar e manter o PDTIC 2025-2026	SETIC	A iniciar
17	SGTI	Res CNJ 370/2021	Governança e Gestão	Elaborar o Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC de 2024	SETIC	A iniciar
18	SPJE	Jira CSJT	Pje	Implantação do Sistema Satélite EXEPJe	CSJT	A iniciar
19	SPJE	PDTIC 2023	Inteligência Artificial	Implantação da Ferramenta I - CON	NUPEMEC	Em andamento
20	SPJE	Jira CSJT	Inteligência Artificial	Implantação do Módulo Gemini	CSJT	Em andamento
21	SPJE	Jija CSJT	Pje	Implantação do Sistema Satélite Solária	CSJT	Em andamento
22	SRC	Demanda Interna	Segurança da Informação	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	SETIC	A iniciar
23	SRC	Demanda Interna	Service Desk	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	SETIC	A iniciar
24	SSI	PDTIC 2023	Segurança da Informação	Revisar a Política de Segurança da Informação	SETIC	Em andamento
25	SSI	Res CNJ 370/2021	Segurança da Informação	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	SETIC	A iniciar
26	SSI	SEI 1020/2022	Segurança da Informação	Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	SECAUD	Em andamento
27	SSI	SEI 1020/2022	Segurança da Informação	Elaborar o Processo de Gerenciamento de Eventos	SECAUD	Em andamento
28	SSI	Res CNJ 370/2021	Segurança da Informação	Revisar o Processo de Gestão de Riscos de TIC	SETIC	Em andamento
