



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

---

# Portfólio de Projetos de TIC

Agosto/2019

### Sumário


<b>1.</b>	<b>RESUMO DOS PROJETOS</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>PROJETOS INICIADOS</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>PROJETOS CONCLUÍDOS</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>SETOR DE GOVERNANÇA DE TI</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>SEÇÃO DE APOIO AO PJE</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>18</b>

## 1. Resumo dos projetos


Quantidade de projetos nas unidades



Complexidade dos projetos



Situação dos projetos

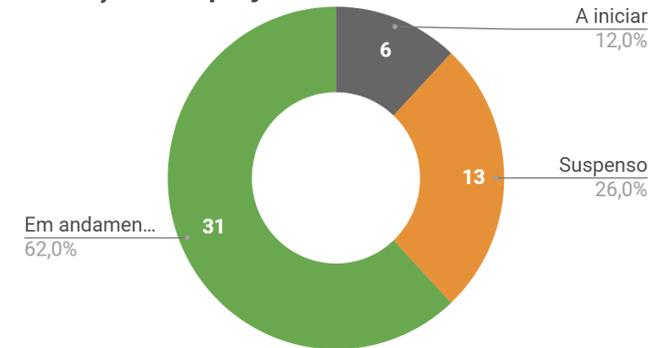

Situação dos projetos nas unidades



### 1.1. Projetos incluídos no portfólio

<i><b>Id</b></i>	<i><b>Nome</b></i>	<i><b>Gerente do projeto</b></i>	<i><b>Unidade responsável</b></i>	<i><b>Tipo</b></i>	<i><b>Data da demanda</b></i>	<i><b>Início realizado</b></i>	<i><b>Fim realizado</b></i>	<i><b>Status</b></i>
497	Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC	Maickel Roberto Neitzke	SGTI	Ação	06/08/2019	12/08/2019		<b>Em andamento</b>
498	Treinamento em Integração e Entrega Contínua (Git, Jenkins, Nexus e Sonar)	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	19/08/2019	20/08/2019		<b>Em andamento</b>
499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	SDS	Projeto	28/02/2019			<b>A iniciar</b>
500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Projeto	05/08/2019	05/08/2019		<b>Em andamento</b>

### 1.2. Projetos iniciados


<i><b>Id</b></i>	<i><b>Nome</b></i>	<i><b>Gerente do projeto</b></i>	<i><b>Unidade responsável</b></i>	<i><b>Tipo</b></i>	<i><b>Data da demanda</b></i>	<i><b>Início realizado</b></i>	<i><b>Fim realizado</b></i>	<i><b>Status</b></i>
497	Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC	Maickel Roberto Neitzke	SGTI	Ação	06/08/2019	12/08/2019		<b>Em andamento</b>
498	Treinamento em Integração e Entrega Contínua (Git, Jenkins, Nexus e Sonar)	Andre Pereira Nunes	SDS	Ação	19/08/2019	20/08/2019		<b>Em andamento</b>
500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Projeto	05/08/2019	05/08/2019		<b>Em andamento</b>

### 1.3. Projetos concluídos

### 1.4. Projetos cancelados

### 2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

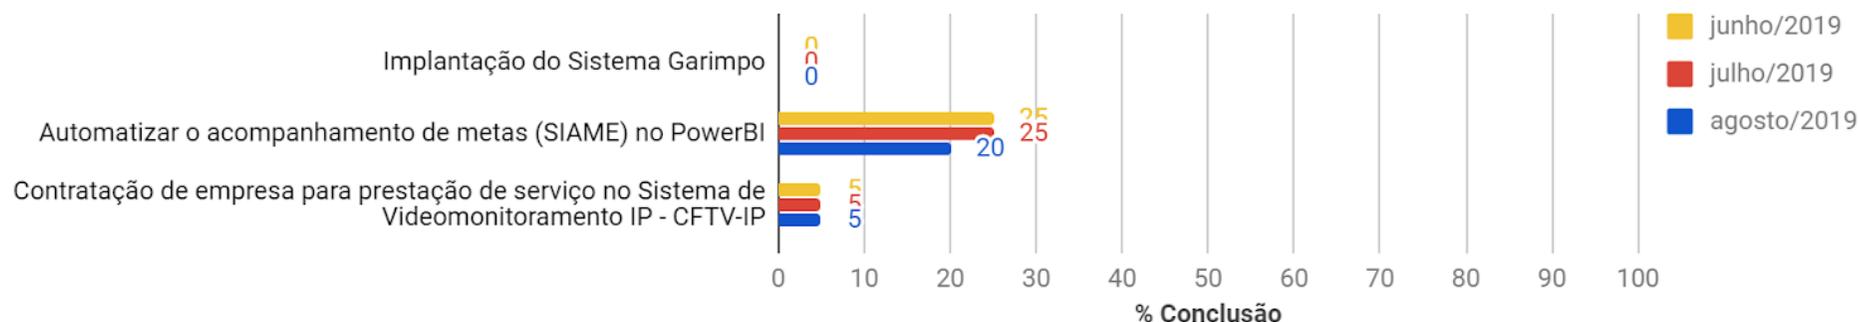

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	489	Implantação do Sistema Garimpo	David Tedson Mendonca Ferreira	<b>A iniciar</b>	Projeto	05/06/2019	31/12/2019			0	Projeto a iniciar. Aguardando o CSJT validar o projeto antes dos regionais implantarem.
2	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	<b>Em andamento</b>	Ação	23/08/2018	15/11/2019			20	Concluídas as metas 2 e 6 e colocadas em produção. Riscos: concorrência das atividades do projeto com tarefas do setor e projeto "Justiça em números".
3	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	<b>Suspensão</b>	Projeto	16/02/2018	30/10/2019			5	Sem progresso no período. Foram priorizados outros projetos em detrimento deste, como o projeto de solução de telefonia IP ( VoIP ) e softwares de gravação e degravação do Pleno.

### 3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

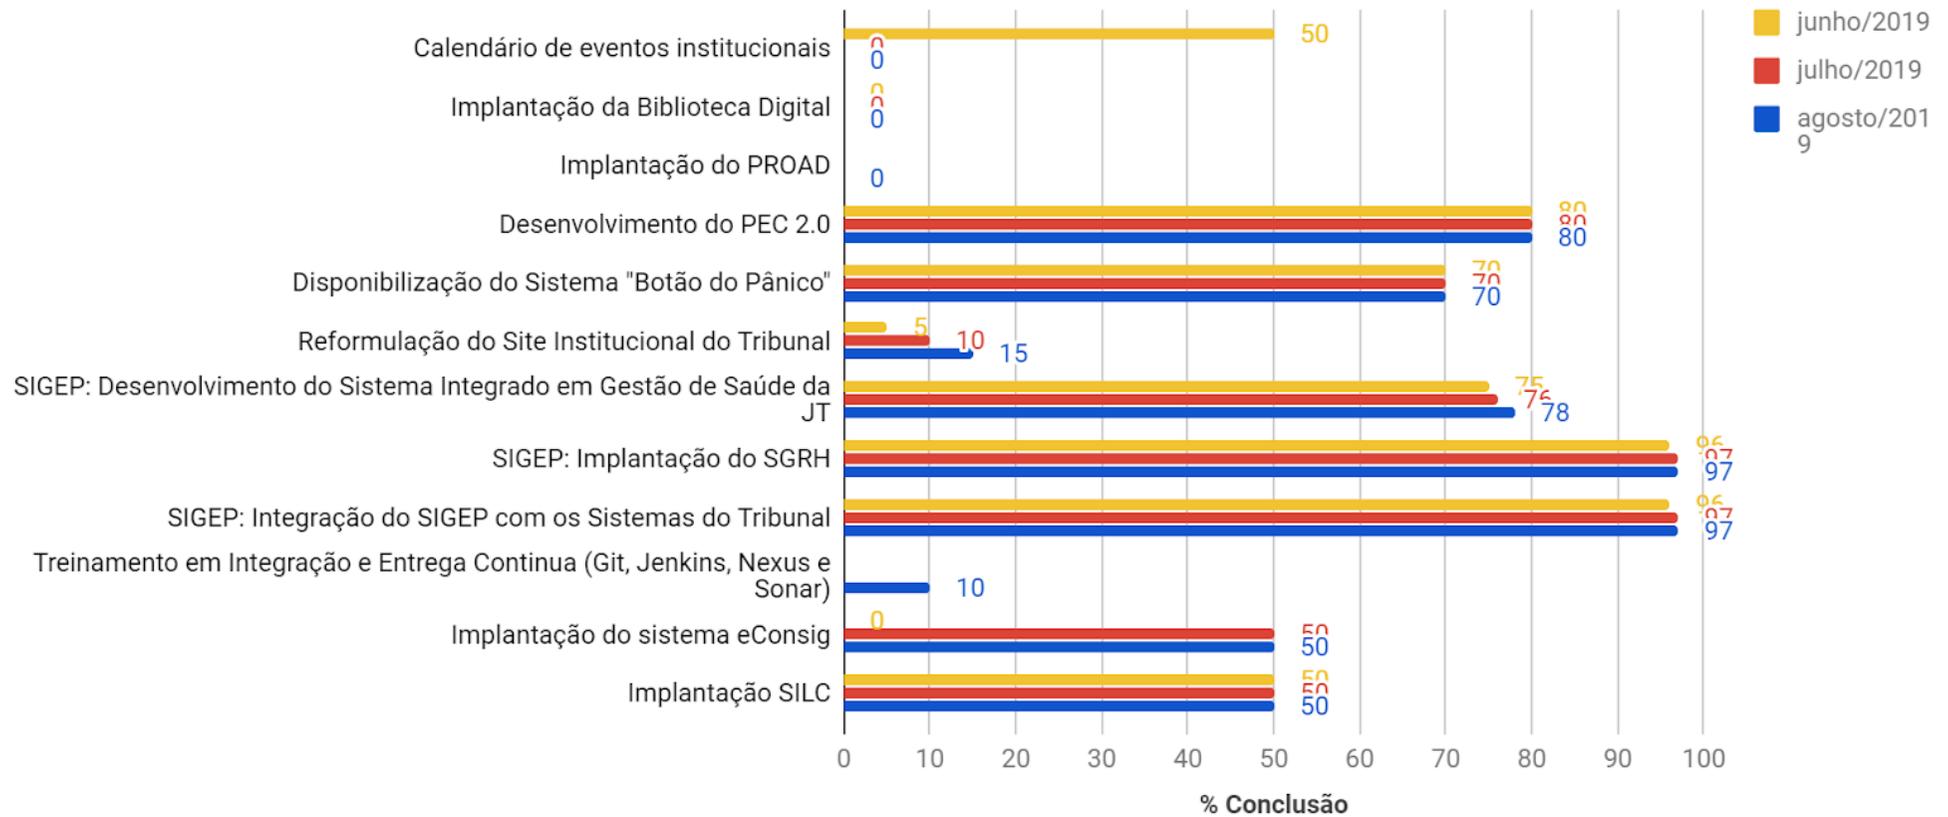

## Portfólio de Projetos de TIC - Agosto/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	<b>A iniciar</b>	Projeto	06/12/2017	27/12/2019			0	Sem progressos no período. TAP elaborado e submetido para avaliação via PA 8990/2017 mas ainda não aprovado formalmente pela área demandante.
2	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	<b>A iniciar</b>	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020 de acordo com o PDTIC 2019/2020.
3	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	<b>A iniciar</b>	Projeto	28/02/2019	30/06/2020	28/08/2019		0	Criação de comissão de implantação do PROAD. Elaboração do TAP para aprovação do DG.
4	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	<b>Em andamento</b>	Projeto	24/05/2018	31/10/2019			97	Transacionada procedure de login da intranet para preenchimento automático do usuário ldap na coluna login da tabela de srh2.servidor; Adequação do eGestão ainda em curso:criados em ambiente de PRODUÇÃO os objetos transicionados; adequadas as views utilizadas pelo pentaho do apoio ao PJE; iniciada a validação dos itens administrativos transicionados para o SGRH junto à CGP;
5	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	<b>Em andamento</b>	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			78	- Continuação do desenvolvimento de funcionalidades do NGS1 (SBIS);

## Portfólio de Projetos de TIC - Agosto/2019


6	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	31/10/2019			97	Execução da FolhaWeb e do SGRH em paralelo com os sistema de Rh e de Folha legados:Reunião de acompanhamento realizada na Direção Geral no dia 22 de agosto de 2019 (detalhamento anexo); Nova previsão para SETEMBRO ou OUTUBRO/2019, a depender do desenvolvimento solução conjunta entre NFP e CTIC para problemas nos relatórios de apropriação apontados pela SOF;Resolução de 39 chamados (via Assyst); 28 de SGRH e 11 de FolhaWebCorreções de erros diversos (detalhamento no Assyst); Orientações aos usuários; Instalação de nova versão do SGRH; Risco: Problemas na Escala de Férias 2020 caso o sistema legado não seja descontinuado em out/2019.
7	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	27/12/2019	29/05/2019		15	Concluído o Entregável 2 e iniciado o Entregável 3: Entregável 1 - Mapeamento de Conteúdo e Configurações Iniciais: Fechada 100% Entregável 2 - Desenvolvimento do Template da Página Inicial:Fechada 100% Entregável 3 - Criação e configuração das áreas de publicação:Em andamento, de 0% para 70% Entregável 4 - Migração do conteúdo estático do site: Nova 0% Entregável 5 - Migração do conteúdo dinâmico do site: Nova 0% Entregável 6 - Definição dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdos do site: Nova 0%

## Portfólio de Projetos de TIC - Agosto/2019

											Entregável 7 - Treinamento dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdo do site: Nova 0% Entregável 8 - Homologação do Novo Portal Institucional: Nova 0%
8	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	24/01/2020			80	- Sem avanço dos entregáveis no período. - As atividades realizadas no período consistiram unicamente em tarefas não mapeadas através de entregáveis, mas que são tão importantes quanto estes, pois estão ligadas à qualidade da construção da solução já disponibilizada.
9	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Em andamento	Projeto	13/11/2018	30/09/2019			70	Disponibilizado pela SIC o servidor solicitado. Executados testes na versão atualizada do sistema disponibilizado pelo TRT5.
10	498	Treinamento em Integração e Entrega Contínua (Git, Jenkins, Nexus e Sonar)	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	19/08/2019	29/11/2019	20/08/2019		10	TAP elaborado. Fase de coleta de preços em andamento.
11	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC.
12	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	Suspensão	Projeto	06/12/2017	30/08/2019			50	Sem progressos no período. Pendência de negócio ainda não resolvida: Sistema de FolhaWeb está em produção, mas ainda está em paralelo ao sistema legado de folha, o que impossibilita a utilização do eConsig na FolhaWeb de maneira efetiva, já que o pagamento da folha do tribunal ainda está sendo feito pelo sistema legado. A previsão anterior para primeiro pagamento na FolhaWeb era a folha de Agosto de 2019. A nova previsão é Outubro de 2019.

### 4. Setor de Governança de TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

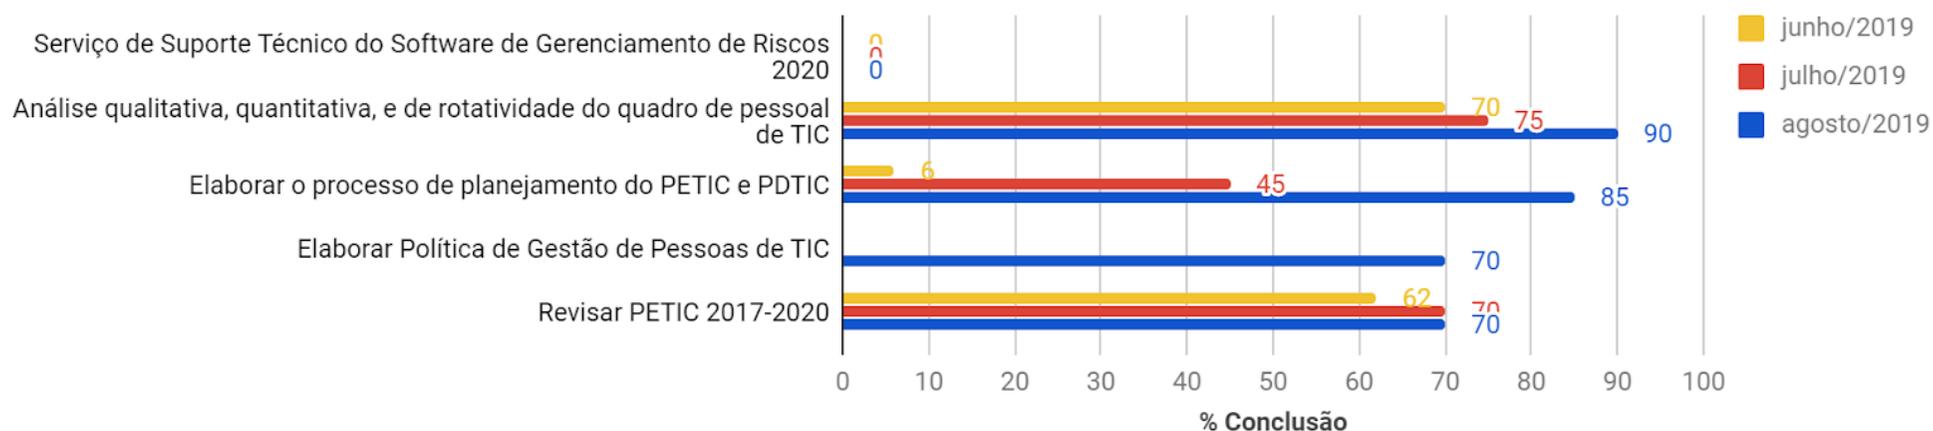


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	<b>A iniciar</b>	Projeto	25/04/2019	31/12/2019			0	Projeto não iniciado. Aguardando a movimentação nacional dos tribunais responsáveis pela licitação.
2	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	<b>Em andamento</b>	Projeto	10/08/2018	20/09/2019			85	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC e a Minuta da Política de Planejamento Estratégico e Tático de TIC foram elaboradas.</li> <li>- Próximas etapas: Apreciação da minuta pelo CGovTIC; Publicação da Política pela Presidência; Publicação do Processo pela CTIC.</li> </ul>

## Portfólio de Projetos de TIC - Agosto/2019

3	482	Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC	Jose Augusto	<b>Em andamento</b>	Projeto	24/04/2019	09/09/2019	29/04/2019		90	Concluído os estudos qualitativos, quantitativos e rotatividade.
4	497	Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC	Maickel Roberto Neitzke	<b>Em andamento</b>	Ação	06/08/2019	30/09/2019	12/08/2019		70	Ação iniciada formalmente. Efetuado o levantamento de referências para a política com definição de estrutura para o documento. Elaborado a minuta da política e incluída na pauta de reunião do CGovTIC para deliberação.
5	486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	<b>Suspenso</b>	Ação	13/05/2019	01/11/2019	14/05/2019		70	Sem progresso no período. Problema: concorrência com outros projetos (Elaboração do processo do PETIC e PDTIC; Análise qualitativa, quantitativa e de rotatividade)

### 5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

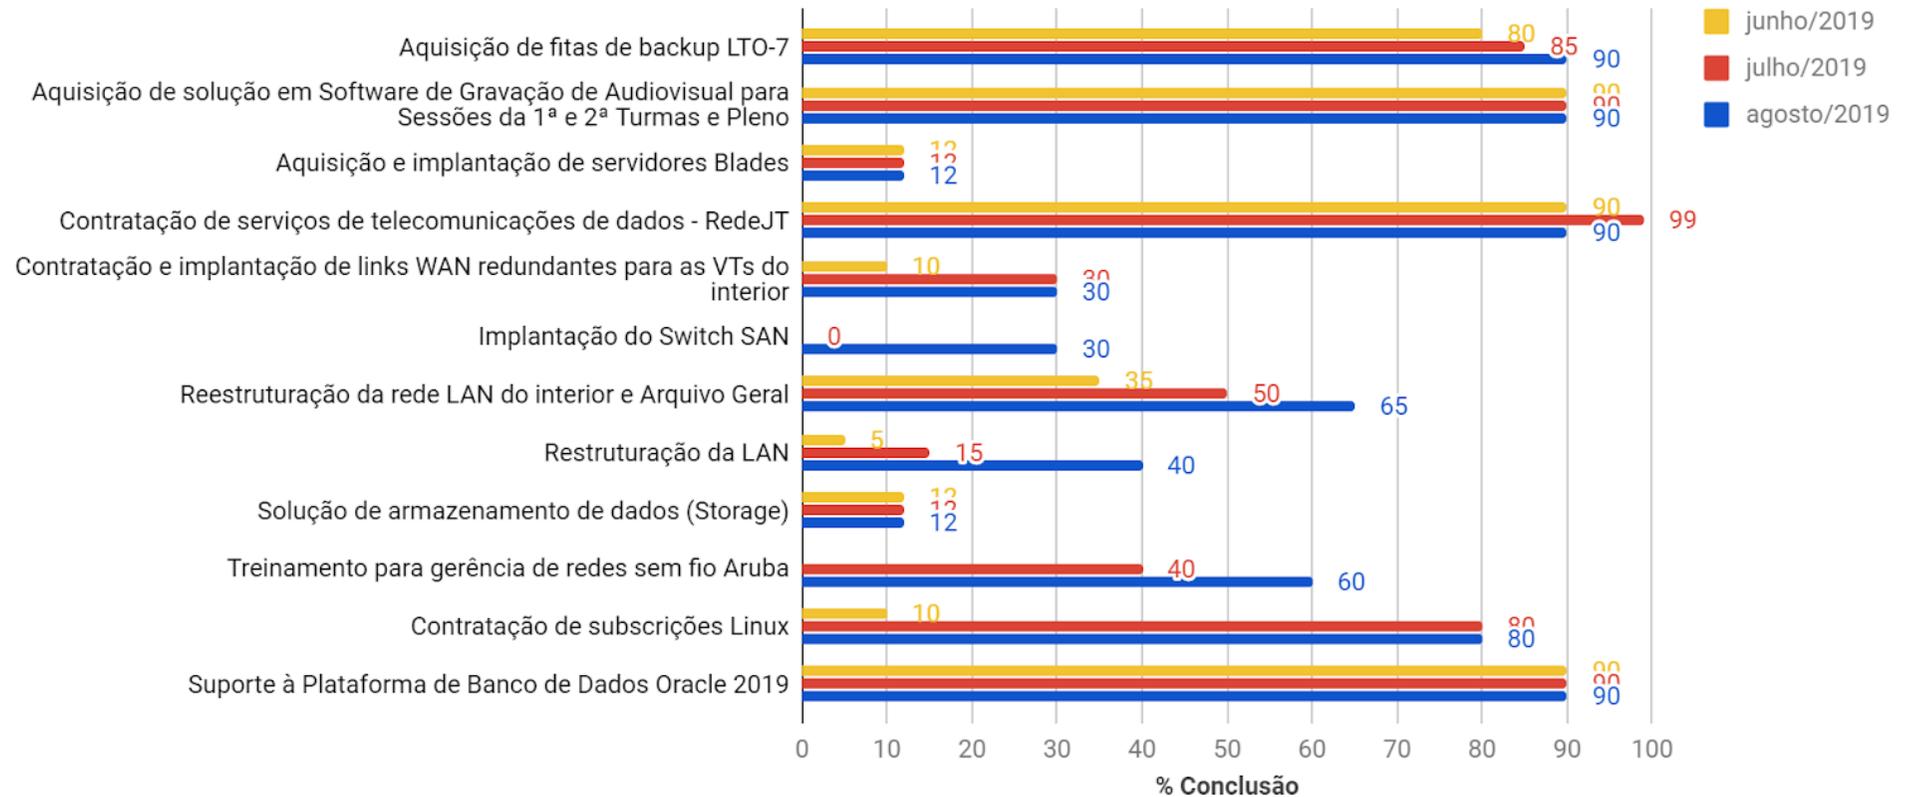

## Portfólio de Projetos de TIC - Agosto/2019


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	12/01/2018	31/12/2019			90	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório. O prazo para emissão do termo de recebimento definitivo começará a contar a partir da resolução do problema de perda de pacotes de Barra do Corda. Percentual do projeto ajustado para a real situação, de 99% para 90%.
2	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Em andamento	Projeto	06/07/2018	31/10/2019			90	O termo de referência foi elaborado e aprovado, atualmente está sendo elaborado o edital.
3	442	Restruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	17/10/2018	31/12/2019			40	Foram reestruturadas as redes de Estreito, Imperatriz e Açailândia.
4	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	31/12/2019	31/01/2019		12	- Efetuado negociação com a empresa para a entrega dos equipamentos Huawei. Foi prorrogado o prazo de entrega por mais 45 dias, tendo a contratada até 08/09/2019 para a entrega. - Riscos: barreiras econômicas impostas pelos EUA a China estão dificultando a produção dos equipamentos.
5	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	29/01/2019	30/09/2019	30/01/2019		90	Expedidas notas de empenho para a aquisição.
6	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antonieli Magalhaes de Carvalho	Em andamento	Projeto	01/04/2019	30/09/2019	16/04/2019		65	- Reestruturação da rede LAN das VTs: Estreito; primeira VT de Imperatriz; segunda VT de Imperatriz; VT antiga de Imperatriz (Arquivo); Açailândia; - Problemas: Wi-fi nas VTs não configurado devido à disponibilidade da equipe do SIC.

## Portfólio de Projetos de TIC - Agosto/2019

7	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Projeto	15/04/2019	31/12/2019	08/03/2019		30	Versão final do TR entregue para a CML.
8	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	18/06/2019	31/12/2019	18/06/2019		12	- Licitação realizada pelo TRT18 (nº 26/2019); - Edital da licitação publicado em 12/08/2019, abertura de propostas 27/08/19 às 13h; - Equipe do TRT18 em fase de resposta de recursos interpostos pelas empresas. Riscos: - Falta de recursos orçamentários, podendo ocasionar falta de armazenamento prejudicando a prestação de serviços e ocasionando futura indisponibilidade.
9	493	Implantação do Switch SAN	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Ação	02/07/2019	31/12/2019			30	- O planejamento para a implantação foi elaborado e a implantação em si está agendada para a semana de 09 a 13 de setembro. - A parte elétrica já foi toda preparada.
10	496	Treinamento para gerência de redes sem fio Aruba	Danilo Augusto Alves Leite	Em andamento	Ação	25/07/2019	15/10/2019	26/07/2019		60	- Realizado o processo de contratação, porém, a empresa informou não haver mais vagas disponíveis. - A empresa informará data de nova turma para tentarmos a inscrição.
11	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Suspensão	Projeto	29/01/2019	04/10/2019	30/01/2019		80	Sem progresso no período. Pendência: realização do pregão organizado pelo TRT5.
12	485	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019	Leonel Pereira	Suspensão	Projeto	02/05/2019	27/10/2019	17/05/2019		90	Sem progresso no período. Pendência da Assessoria Contábil em apurar do % de reajuste, conforme a divulgação do IPCA de julho de 2018.

### 6. Seção de Apoio ao PJe

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

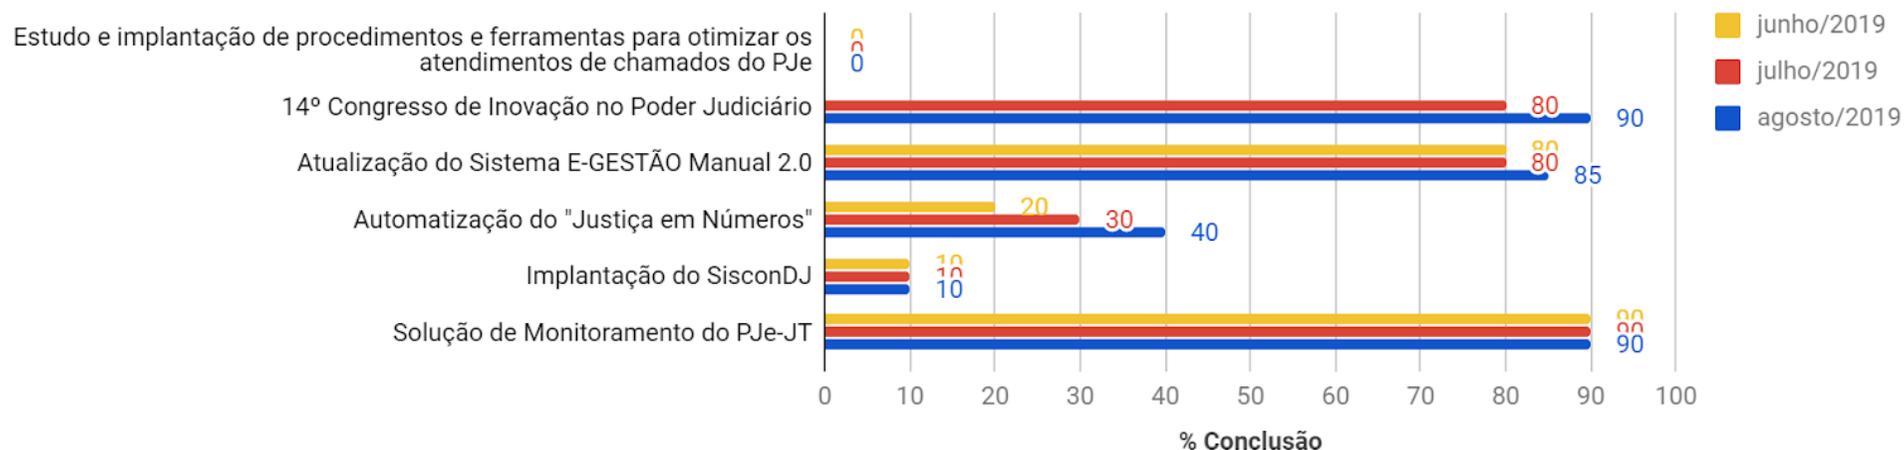


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	<b>A iniciar</b>	Projeto	18/06/2019	19/12/2019			0	Sem progresso no período. Pendência: recursos humanos da SIC para definir o projeto.
2	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	<b>Em andamento</b>	Projeto	06/04/2018	19/12/2019			85	- Projeto reativado devido a liberação do novo extrator PJe que contempla o Manual 2.0 para homologação pelos regionais. - Versão homologada quanto à implantação da infraestrutura e execução dos jobs. - Homologação negocial quanto aos dados gerados não realizada.

## Portfólio de Projetos de TIC - Agosto/2019

3	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	<b>Em andamento</b>	Ação	23/04/2019	19/12/2019	19/06/2019		40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizou-se a definição e planejamento das prioridades e requisitos para a transmissão;</li> <li>- Elaboração de view principal geradora do XML referente ao PJe 1º e 2º graus;</li> <li>- Elaboração de job no pentaho para simplificação da geração dos XMLs;</li> <li>- Recebimento por parte do TST do painel de inconsistências dos XMLs enviados, não apresentando inconsistências quanto ao conteúdo dos XMLs.</li> </ul>
4	494	14º Congresso de Inovação no Poder Judiciário	Gilberto Cunha Filho	<b>Em andamento</b>	Ação	05/07/2019	02/09/2019			90	<p>Participação dos servidores da CTIC no evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gilberto Cunha Filho;</li> <li>- Rafael Robinson de Sousa Neto.</li> </ul>
5	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	<b>Suspenso</b>	Projeto	21/06/2018	30/09/2019			90	Sem progresso no período.
6	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	<b>Suspenso</b>	Ação	05/12/2018	31/10/2019			10	Sem progresso no período. Pendência de recursos humanos da SIC. Risco efetivado: perda do prazo de suporte com a equipe do BB;

### 7. Setor de Relacionamento com o Cliente


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

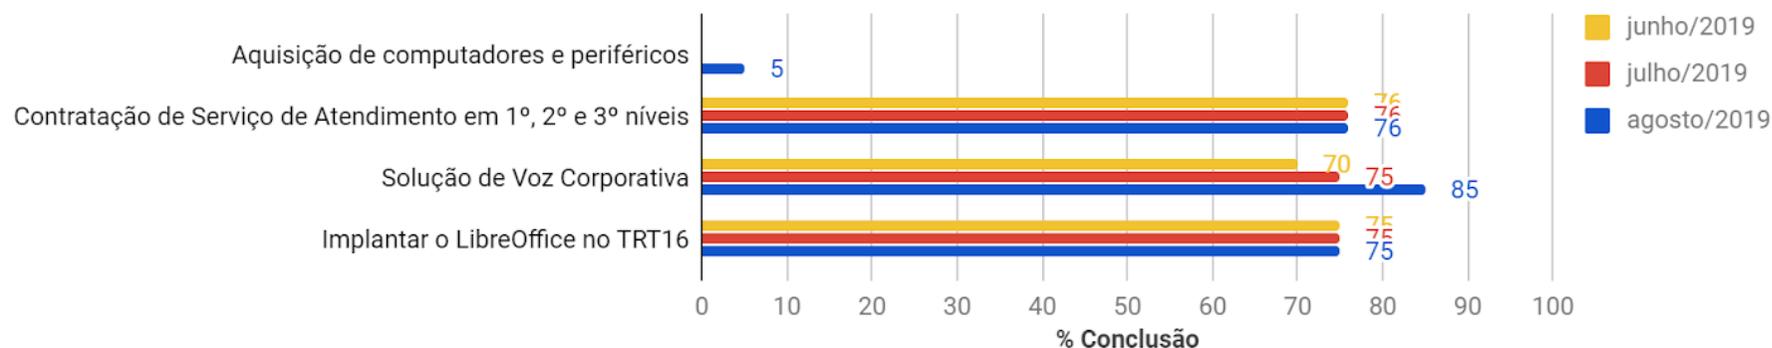

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	30/09/2019			85	Edital finalizado. Aguardando a marcação da data da licitação.
2	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	19/09/2018	20/12/2019			76	ETP e TR revisados pelo integrante técnico. Risco de alterações de escopo com aumento da quantidade de serviços a serem contratados podem atrasar algumas entregas e aumentar os valores previstos na contratação.
3	500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	05/08/2019	15/11/2019	05/08/2019		5	Coletado materiais de referências para o início do projeto.
4	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	25/06/2018	31/10/2019			75	Sem progresso no período. Pendência de pessoal do SIC para atualização das GPOs de instalação.

### 8. Seção de Segurança da Informação

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

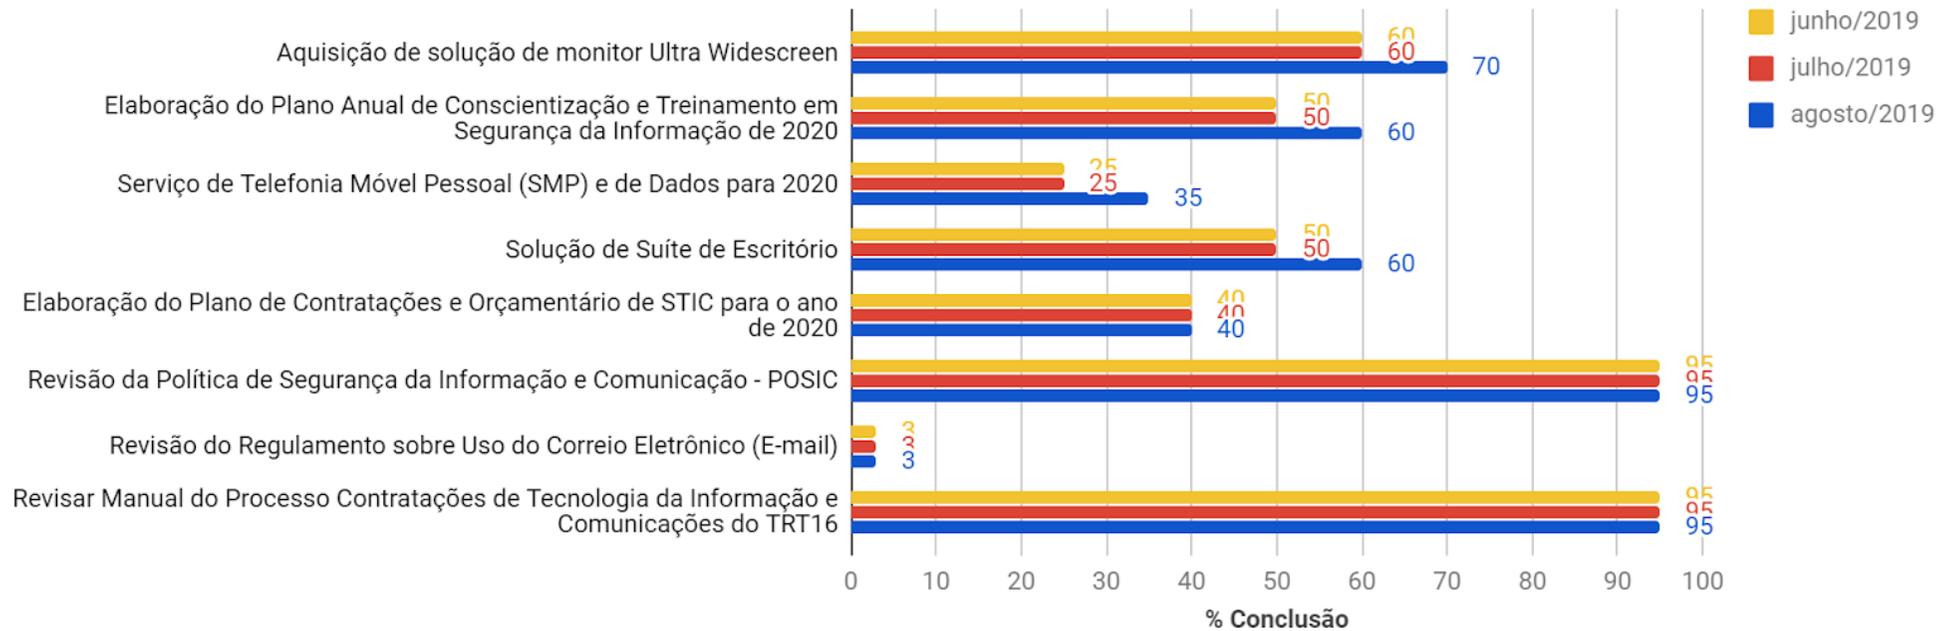

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	27/08/2018	15/10/2019			70	Pregão eletrônico TST Nº 21/2019 foi homologado. Em fase de assinatura da Ata de Registro de Preço
2	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	21/11/2018	31/10/2019			60	Pregão Eletrônico Nº 14/2019 agendado para dia 27/08/2019 às 9 horas.

## Portfólio de Projetos de TIC - Agosto/2019

3	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	22/01/2019	15/03/2020	15/03/2019		35	ETP elaborado.
4	473	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	01/04/2019	31/10/2019	08/04/2019		60	Minuta do plano revisada pelo Coordenador da CTIC.
5	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	31/10/2019			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo.
6	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	29/11/2019			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
7	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	04/01/2019	31/10/2019	04/01/2019		40	Sem progresso no período. Problemas: projetos sendo conduzidos simultaneamente, restrições orçamentárias, aumento de demandas em virtude de ausências de servidores por questões de saúde.
8	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	05/04/2019	30/09/2019			3	Sem progresso no período.
