



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

---

# Portfólio de Projetos de TIC

Novembro/2019

---

### Sumário


<b>1.</b>	<b>RESUMO DOS PROJETOS</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>PROJETOS INICIADOS</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>PROJETOS CONCLUÍDOS</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>SETOR DE GOVERNANÇA DE TI</b>	<b>11</b>
<b>5.</b>	<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>SEÇÃO DE APOIO AO PJE</b>	<b>18</b>
<b>7.</b>	<b>SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE</b>	<b>20</b>
<b>8.</b>	<b>SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>22</b>

## 1. Resumo dos projetos


### Quantidade de projetos nas unidades



### Complexidade dos projetos



### Situação dos projetos

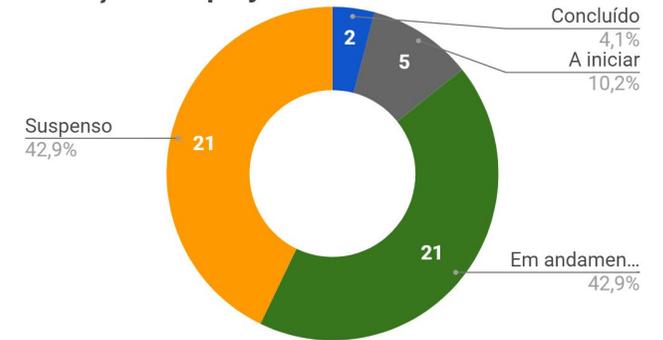

### Situação dos projetos nas unidades



### 1.1. Projetos incluídos no portfólio

<i><b>Id</b></i>	<i><b>Nome</b></i>	<i><b>Gerente do projeto</b></i>	<i><b>Unidade responsável</b></i>	<i><b>Tipo</b></i>	<i><b>Data da demanda</b></i>	<i><b>Início realizado</b></i>	<i><b>Fim realizado</b></i>	<i><b>Status</b></i>
509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	14/11/2019	14/11/2019		Em andamento
510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	SGTI	Ação	23/10/2019	25/11/2019		Em andamento
511	Contratação de treinamento em VMWare	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	Ação	27/11/2019	27/11/2019		Em andamento

### 1.2. Projetos iniciados


<i><b>Id</b></i>	<i><b>Nome</b></i>	<i><b>Gerente do projeto</b></i>	<i><b>Unidade responsável</b></i>	<i><b>Tipo</b></i>	<i><b>Data da demanda</b></i>	<i><b>Início realizado</b></i>	<i><b>Fim realizado</b></i>	<i><b>Status</b></i>
509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	14/11/2019	14/11/2019		Em andamento
510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	SGTI	Ação	23/10/2019	25/11/2019		Em andamento
511	Contratação de treinamento em VMWare	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	Ação	27/11/2019	27/11/2019		Em andamento

### 1.3. Projetos concluídos

<i><b>Id</b></i>	<i><b>Nome</b></i>	<i><b>Gerente do projeto</b></i>	<i><b>Unidade responsável</b></i>	<i><b>Tipo</b></i>	<i><b>Data da demanda</b></i>	<i><b>Início realizado</b></i>	<i><b>Fim realizado</b></i>	<i><b>Status</b></i>
454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	04/01/2019	04/01/2019	29/11/2019	Concluído
505	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Ação	17/09/2019	30/09/2019	28/11/2019	Concluído

### 1.4. Projetos cancelados

### 2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

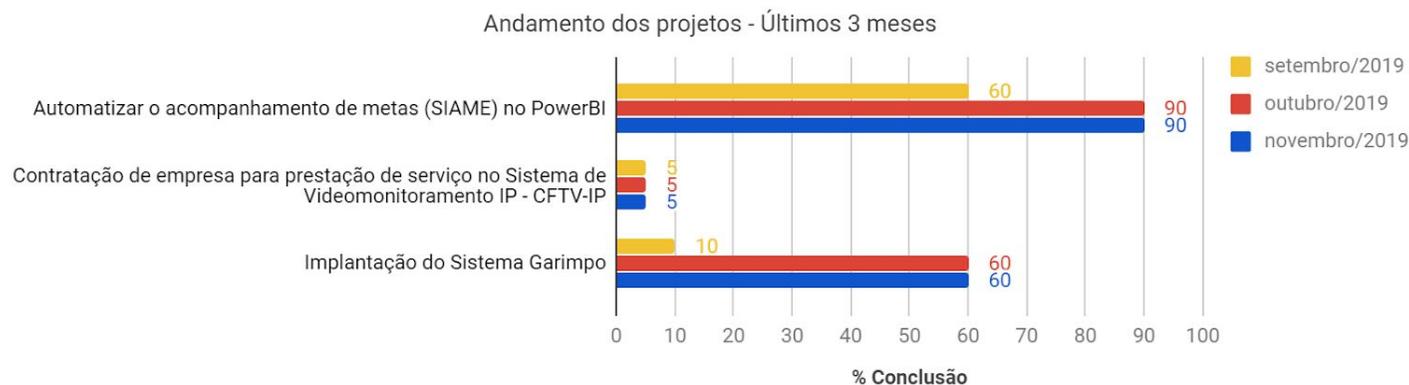


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Projeto	16/02/2018	31/10/2019			5	Sem progresso no período.
2	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspensão	Ação	23/08/2018	19/12/2019			90	Sem progresso no período.

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

3	489	Implantação do Sistema Garimpo	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspensa	Projeto	05/06/2019	19/12/2019			60	Sem progresso no período. Aguardando treinamento negocial que acontecerá no dia 04/12/2019.
---	-----	--------------------------------	--------------------------------------	----------	---------	------------	------------	--	--	----	---

### 3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

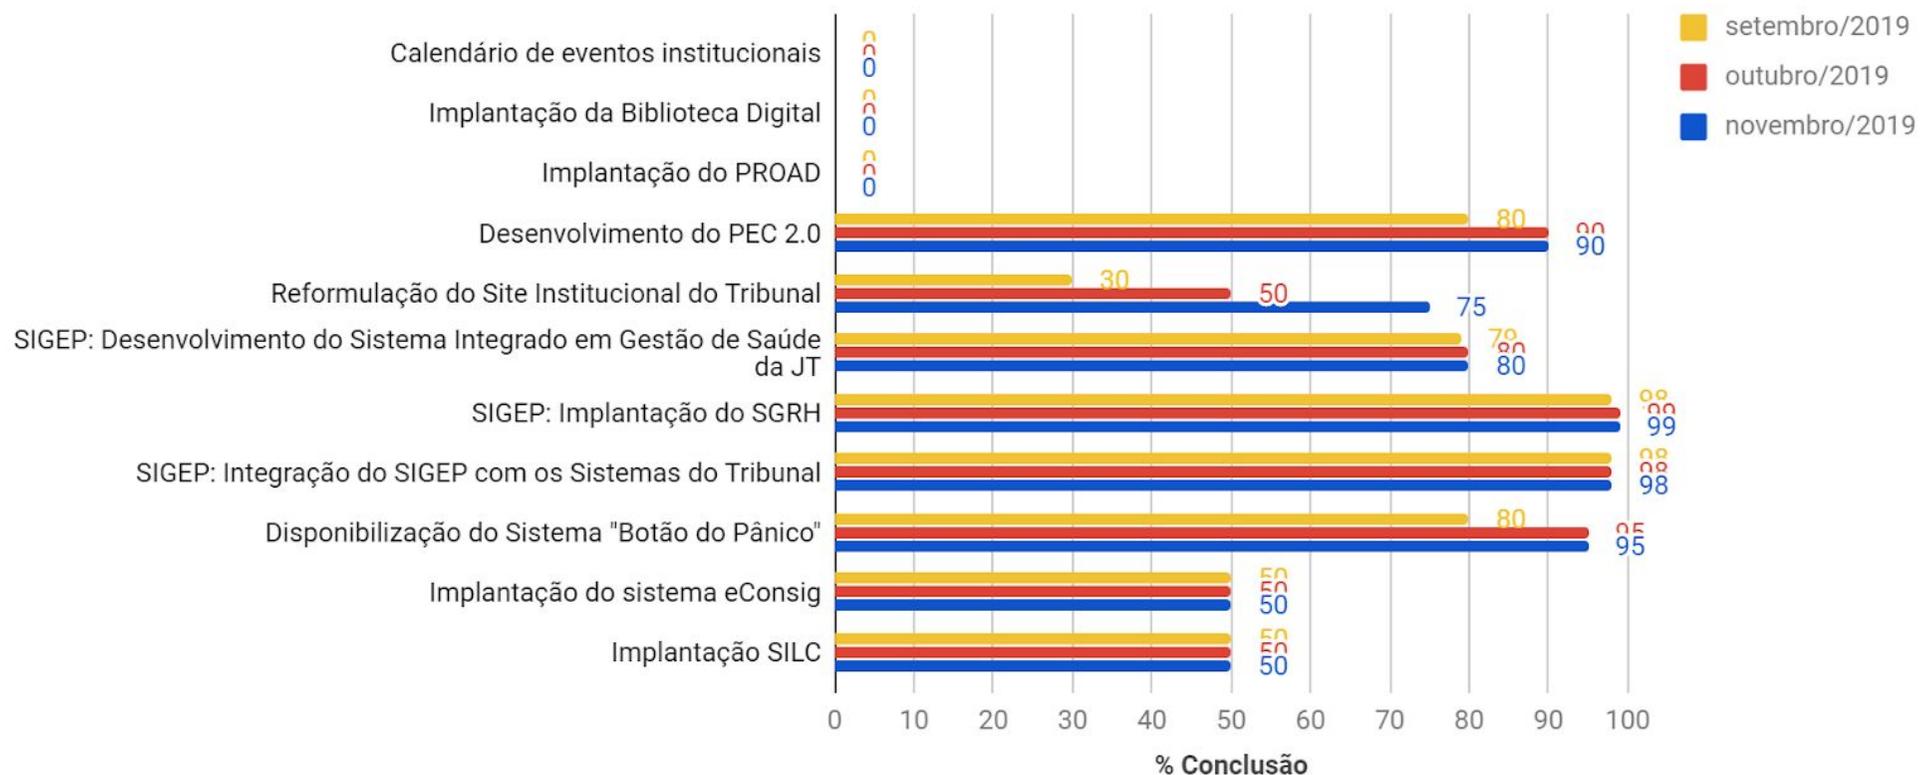

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	223	Calendário de eventos institucionais	Andre Pereira Nunes	<b>A iniciar</b>	Projeto	06/12/2017	27/12/2019			0	Sem progresso no período. Previsão para iniciar em Dezembro.
2	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	<b>A iniciar</b>	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020 de acordo com o PDTIC 2019/2020.
3	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	<b>A iniciar</b>	Projeto	28/02/2019	30/06/2020	28/08/2019		0	Sem progressos no período. Pendência: falta de recursos disponíveis para iniciar o projeto, equipe alocada nos demais projetos vigentes.
4	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	<b>Em andamento</b>	Projeto	24/05/2018	31/12/2019			98	Realizados ajustes relativos ao eGestão: - Foi criada nova procedure de atualização de pessoas baseada no pentaho enviado pelo TRT2 para buscar dados do SGRH; - Data de virada dos satélites prevista para 9 de dezembro de 2019:
5	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	<b>Em andamento</b>	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			80	- Resolução de Bugs; - Ajuste de funcionalidades já implementadas; - Continuação da criação dos protótipos dos Programas de Saúde.
6	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	<b>Em andamento</b>	Projeto	01/01/2018	31/12/2019			99	- Sistemas legados continuam em paralelo apenas por segurança até dezembro/2019; - Resolução de 60 chamados de incidentes (via Assyst), sendo 29 de SGRH e 31 de FolhaWeb; - Projeto pendente apenas da tarefa de instalação do conector do eSocial ( <a href="https://redmine.trt16.jus.br/issues/2888">https://redmine.trt16.jus.br/issues/2888</a> )


## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

7	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Andre Pereira Nunes	<b>Em andamento</b>	Projeto	01/01/2018	27/12/2019	29/05/2019		75	<p>Conclusão dos entregáveis 5 e 6, e evolução no entregável 7.</p> <p>Entregável 1 - Mapeamento de Conteúdo e Configurações Iniciais: Fechada 100%</p> <p>Entregável 2 - Desenvolvimento do Template da Página Inicial: Fechada 100%</p> <p>Entregável 3 - Criação e configuração das áreas de publicação: Fechada, de 90% para 100%</p> <p>Entregável 4 - Migração do conteúdo estático do site: Fechada, de 90% para 100%</p> <p>Entregável 5 - Migração do conteúdo dinâmico do site: Fechada, de 80% para 100%</p> <p>Entregável 6 - Definição dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdos do site: Fechada, de 50% para 100%</p> <p>Entregável 7 - Treinamento dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdo do site: Em andamento 30%</p> <p>Entregável 8 - Homologação do Novo Portal Institucional: Nova 0%</p>
---	-----	--	---------------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	--	----	---

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

8	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	<b>Em andamento</b>	Projeto	03/07/2018	24/01/2020			90	Evolução nos entregáveis: Entregável 01 - Cadastro de Atos Agrupados e Exibição de Participantes do Processo 95% para 97% Entregável 02 - Cadastro de Destinatários, Outros destinatários e Signatários de Expedientes e Comunicações 90% para 95% Entregável 03 - PEC Fora do Fluxo e Impressão de Expedientes e Comunicações Físicos 95% para 97% Entregável 04 - Cadastro de Endereços em Expedientes e Comunicações 90% para 95% Entregável 05 - Integração com o GIM 74% para 95% Entregável 06 - Finalização de Expedientes e Comunicações 90% para 95%
9	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	<b>Suspenso</b>	Projeto	06/02/2018	31/07/2020			50	Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC.
10	224	Implantação do sistema eConsig	Andre Pereira Nunes	<b>Suspenso</b>	Projeto	06/12/2017	31/01/2019			50	Sem progressos no período. Pendências: - O Núcleo de Folha de Pagamento deve solicitar que os bancos enviem o histórico de consignações para a ZetraSoft; - O Núcleo de Folha de Pagamento ficou de solicitar treinamento à ZetraSoft para utilizar eConsig;
11	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	<b>Suspenso</b>	Projeto	13/11/2018	31/12/2019			95	Sem progresso no período. Pendência: Setor de Segurança resolver sobre a disponibilidade de Chefes e Diretores de Vara utilizarem o sistema.

### 4. Setor de Governança de TI

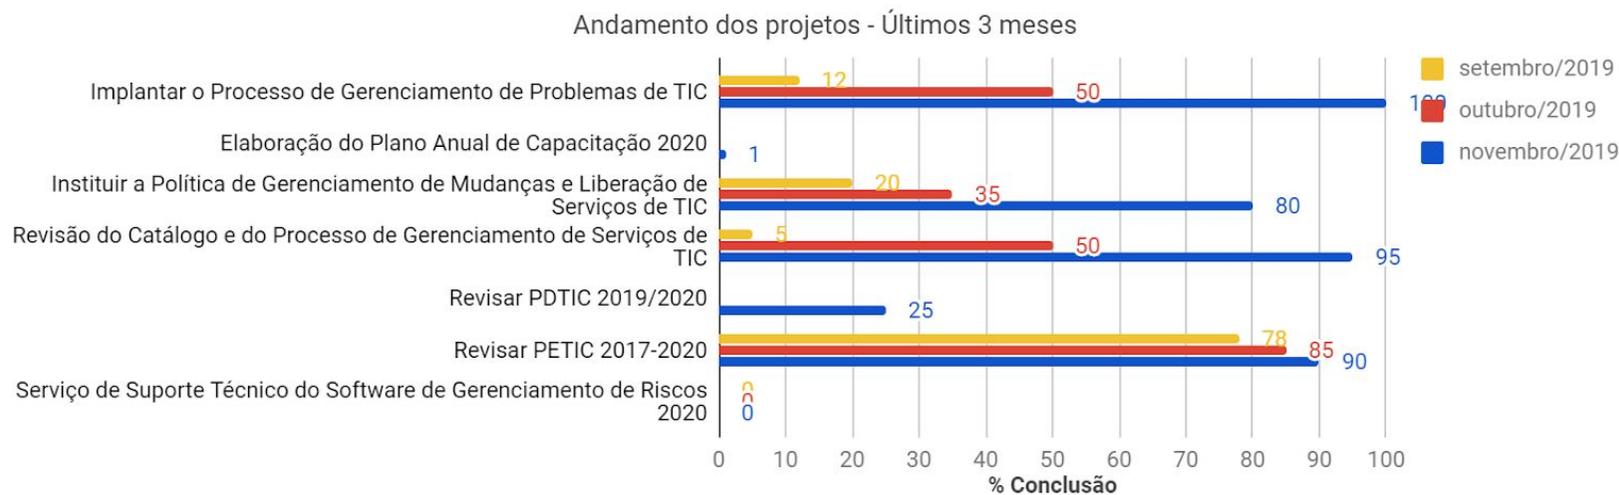

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	505	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Concluído	Ação	17/09/2019	20/12/2019	30/09/2019	28/11/2019	100	Projeto finalizado com sucesso. As seguintes entregas foram realizadas pelo projeto: - Fluxo do Gerenciamento de Problemas de TIC; - Minuta do Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC; - Minuta da Política de Gerenciamento de Problemas de TIC; - Política deliberada pelo CGovTIC; - Política publicada pela Presidência (ATO REGULAMENTAR GP Nº 16/2019/TRT16, <a href="https://www.trt16.jus.br/site/conteudo/publicacoes/pub_inteiro_teor.php?id=56781">https://www.trt16.jus.br/site/conteudo/publicacoes/pub_inteiro_teor.php?id=56781</a> ); - Processo implantado na ferramenta Assyst; - Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC instituído ( <a href="https://governancatic.trt16.jus.br/images/processo/Processo-de-Gerenciamento-de-Problemas-de-TIC.pdf">https://governancatic.trt16.jus.br/images/processo/Processo-de-Gerenciamento-de-Problemas-de-TIC.pdf</a> ) - Política distribuída para a equipe da CTIC.
2	486	Revisar PETIC 2017-2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	13/05/2019	19/12/2019	14/05/2019		90	- Finalizada a elaboração do relatório de análise dos indicadores referentes aos anos de 2017 e 2018. - Previsto para o dia 09/12/2019 a análise pelo Tribunal Pleno da versão revista do PETIC 2017/2020.

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019


3	502	Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC	Jose Augusto	Em andamento	Ação	09/09/2019	03/12/2019	30/09/2019		95	Finalização dos entregáveis. Pendência de encerramento formal do projeto. - Entregável 1. Elaboração da Minuta do Catálogo de Serviços de TIC; Fechado; de 90% para 100% - Entregável 2. Elaboração da Minuta do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Fechado; De 5% para 100% - Entregável 3. Portaria da Política de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Fechado; De 0% para 100% - Entregável 4. Deliberação pelo CGovTIC da Política, do Processo e do Catálogo; Fechado; De 0% para 100% - Entregável 5. Publicação pela Presidência da Política e do Catálogo; Nova; Fechado; De 0% para 100% - Entregável 6. Publicação pela CTIC da Política e Processo de gerenciamento do catálogo; Fechado; De 0% para 100%
4	503	Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Ação	09/09/2019	13/12/2019	10/09/2019		80	Evolução nos entregáveis do projeto: 1. Fluxo do Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Fechado de 90% para 100% 2. Implantação do Processo na ferramenta Assyst Em andamento de 50% para 90% 3. Processo de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Fechado de 10% para 100% 4. Política de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC Fechado de 0% para 100% 5. Deliberação pelo CGovTIC da Política Nova 0% 6. Publicação pela Presidência da Política Nova 0%

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

											7. Política e Processo distribuído para a CTIC Nova 0%
5	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	<b>Em andamento</b>	Ação	14/11/2019	31/01/2020	14/11/2019		25	Evolução nos entregáveis: - Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - Em andamento 50% - Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - Em andamento 40% - Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - Nova 0% - Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC - Nova 0% - Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência - Nova 0%
6	510	Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020	Jose Augusto	<b>Em andamento</b>	Ação	23/10/2019	31/01/2020	25/11/2019		1	Projeto iniciado no final do período com a elaboração do TAP.
7	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	<b>Suspensa</b>	Projeto	25/04/2019	31/12/2019			0	Sem progresso no período. Aguardando decisão da Coordenação da CTIC.

### 5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

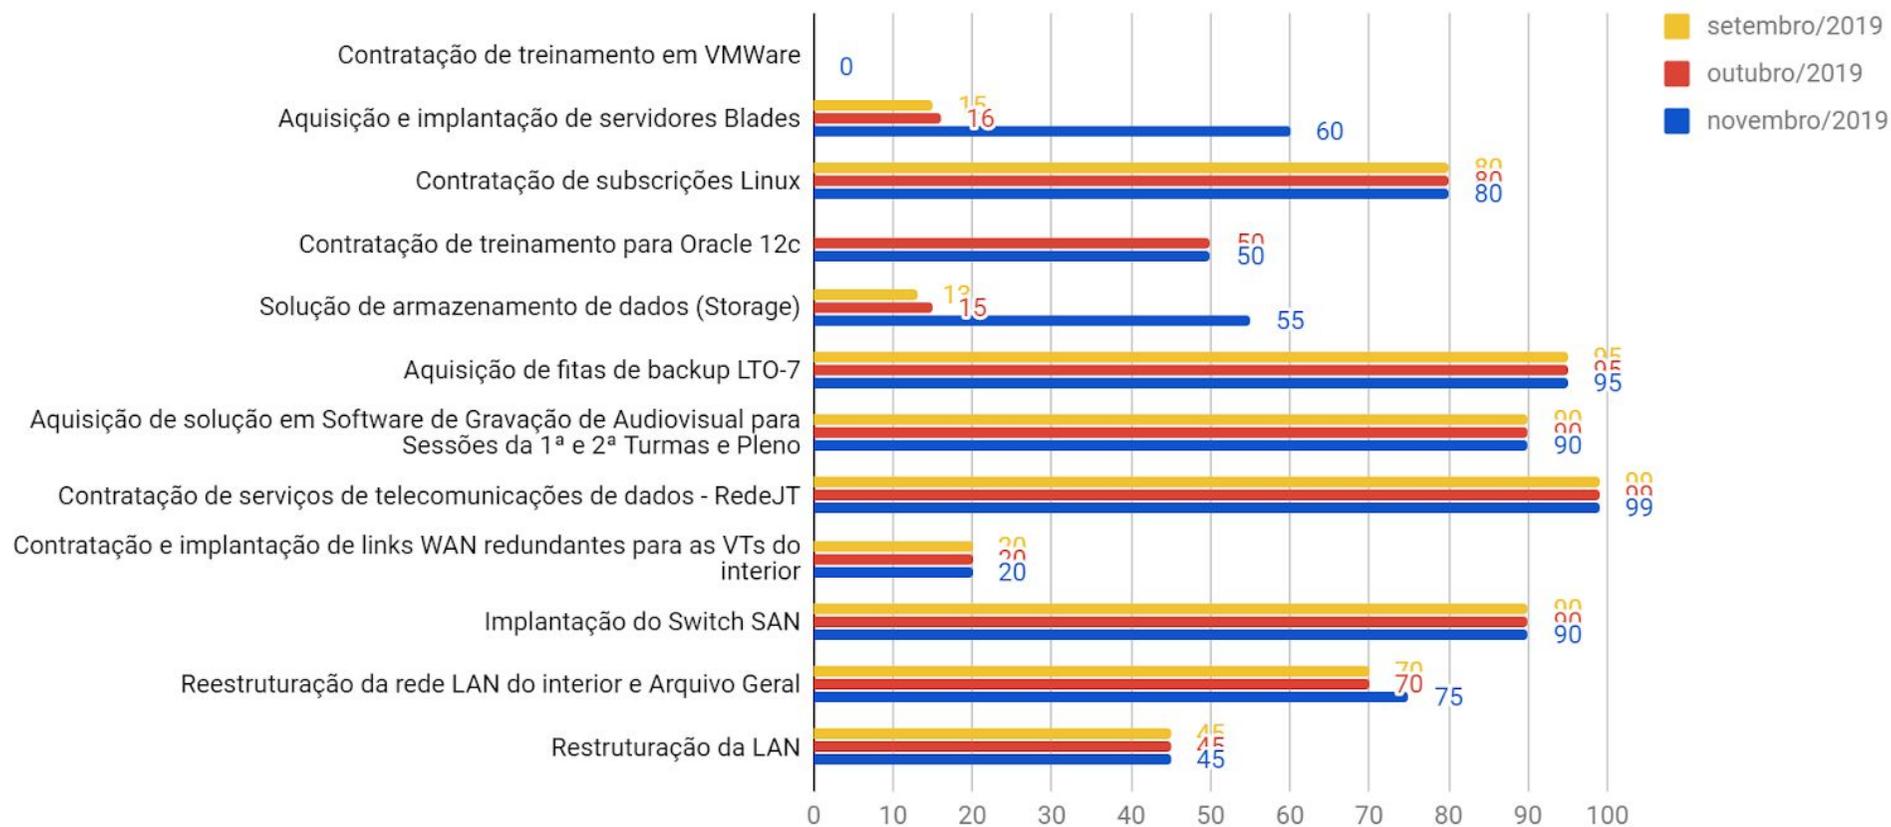

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	511	Contratação de treinamento em VMWare	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Ação	27/11/2019	31/12/2019	27/11/2019		0	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
2	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	31/01/2020	31/01/2019		60	Evolução nos trâmites da aquisição dos equipamentos.
3	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	10/01/2020	30/01/2019		80	Pregão eletrônico 030/19 do TRT 5 em andamento.
4	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	18/06/2019	31/12/2019	18/06/2019		55	- Publicado no extrato do DOU o processo e remeido para SOF; - Registros contábeis efetuados no SIAFI; - Previsão de entrega dos storages até 15/12/2019. A instalação física e a configuração inicial do equipamento serão realizadas em dezembro de 2019, as atividades de configuração, migração e treinamento serão desenvolvidas no início de 2020.
5	507	Contratação de treinamento para Oracle 12c	Leonel Pereira	Em andamento	Ação	16/10/2019	09/12/2019	16/10/2019		50	- Realizada a solicitação das diárias. - Em 13/nov/19, a Bertini informou o cancelamento da turma por falta de quórum. - Nova turma com data prevista para os dias 09 e 10 de dezembro. - Enviado ofício solicitando que a realização do curso na data prevista fosse confirmada até 02/dez/19, sob pena de cancelamento da nota de empenho.
6	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	12/01/2018	31/12/2020	19/01/2018		99	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

7	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Projeto	06/07/2018	16/12/2019	22/10/2018		90	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
8	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	17/10/2018	31/12/2019			45	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
9	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	29/01/2019	30/11/2019	30/01/2019		95	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
10	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Suspensão	Projeto	01/04/2019	19/12/2019	16/04/2019		75	Sem progresso no período. Ausência de pessoal relacionado ao projeto no Setor de Infraestrutura.
11	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Suspensão	Projeto	15/04/2019	31/12/2020	08/03/2019		20	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)
12	493	Implantação do Switch SAN	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Ação	02/07/2019	30/10/2019			90	Sem reporte do gerente de projeto. (EGP-TIC)

### 6. Seção de Apoio ao PJe

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

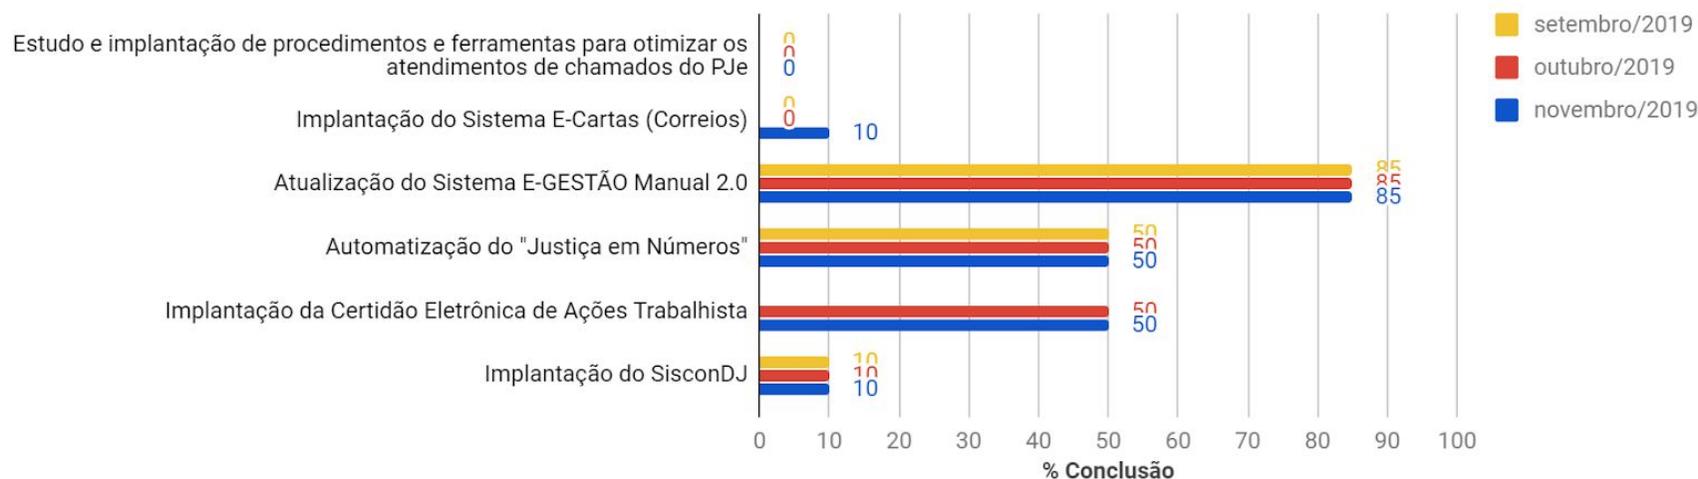


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	492	Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe	Gilberto Cunha Filho	<b>A iniciar</b>	Projeto	18/06/2019	30/04/2020			0	Sem progresso no período. Projeto não iniciado.
2	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	<b>Em andamento</b>	Ação	10/09/2019	02/03/2020			10	- Contato realizado com a demandante; - Estudo do documento de contratação do eCarta;
3	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	<b>Suspensão</b>	Projeto	06/04/2018	19/12/2019			85	Sem progresso no período.
4	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	<b>Suspensão</b>	Ação	05/12/2018	30/12/2019			10	Sem progresso no período. Pendência de recursos humanos da SIC. Risco efetivado: perda do prazo de suporte com a equipe do BB;

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

5	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Ação	23/04/2019	19/12/2019	19/06/2019		50	Sem progresso no período.
6	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	Ação	27/09/2018	28/02/2020	14/10/2019		50	Sem progresso no período. Sem recurso humano de Infraestrutura para execução das tarefas de criação do ambiente de homologação.

### 7. Setor de Relacionamento com o Cliente

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

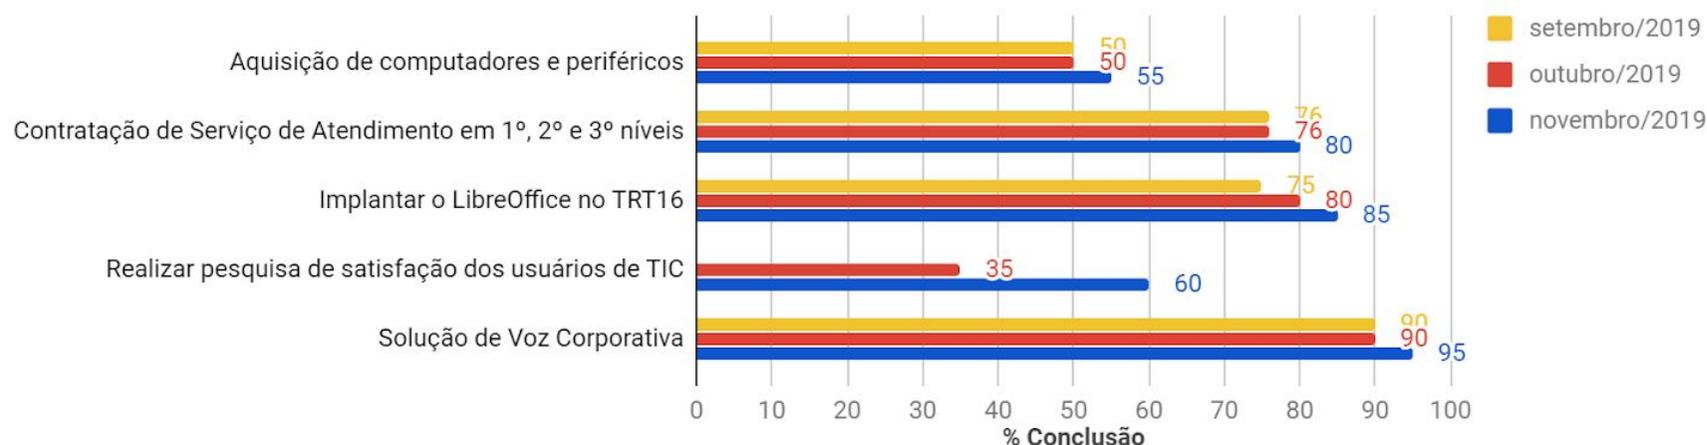


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	25/06/2018	31/01/2020			85	As instalações do LibreOffice continuam a ser realizadas lentamente via GPO. O progresso das instalações está demonstrado na tabela abaixo:  Estatística Localidades Porcentual Instalado 1 VT de Imperatriz 95,00% 2 VT de Imperatriz 85,00% Distribuicao do FMAMR 100,00% VT de Acailandia 93,33% VT de Bacabal 17,65% VT de Balsas 86,67% VT de Barra do Corda 72,22% VT de Barreirinhas 70,59% VT de Caxias 100,00% VT de Chapadinha 68,75% VT de Estreito 100,00%

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

											VT de Pedreiras 26,67% VT de Pinheiro 94,12% VT de Presidente Dutra 75,00% VT de Santa Ines 87,50% VT de Sao Joao dos Patos 62,50% VT de Timon 100,00%
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	31/12/2019			95	- Licitação ocorrida. Recursos foram analisados pelo Coordenador da CTIC, sendo emitidas as respectivas respostas fundamentadas. - Aguarda-se a homologação do vencedor da licitação para emissão de empenho e assinatura do contrato.
3	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	19/09/2018	31/01/2020			80	Continuidade ao estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com a alteração de alguns pontos estratégicos da contratação.
4	500	Aquisição de computadores e periféricos	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	05/08/2019	31/12/2019	05/08/2019		55	Preparados os artefatos da contratação, mas a sua efetivação só será possível mediante disponibilidade orçamentária. Pendência: sem recursos orçamentários até o momento.
5	508	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Ação	17/10/2019	31/12/2019	25/10/2019		60	- Realizado o planejamento e divulgação da pesquisa que está em execução até o dia 11/12/2019. - O resultado deve ser divulgado no dia 17/12/2019.

### 8. Seção de Segurança da Informação

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

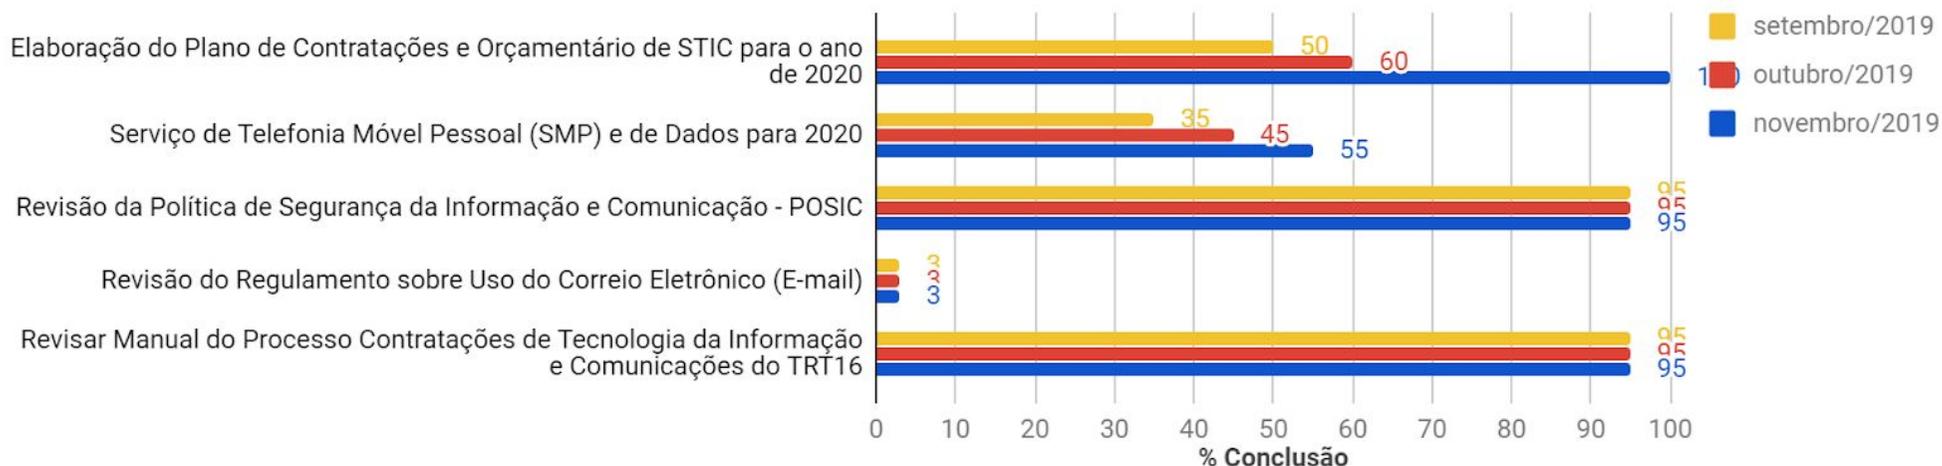

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Concluído	Projeto	04/01/2019	22/11/2019	04/01/2019	29/11/2019	100	Projeto finalizado: - Revisão da Minuta pelo Coordenador da CTIC; - Aprovação da Minuta pelo CGovTIC na 7ª reunião de 2019; - Aprovação e publicação pela Presidência (PORTARIA GP Nº 854/2019);
2	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	22/01/2019	14/04/2020	15/03/2019		55	Evolução na elaboração do ETP e TR. Elevação do risco de não conclusão do processo antes do dia 14 de abril de 2019. Eventual necessidade de prorrogação excepcional.

## Portfólio de Projetos de TIC - Novembro/2019

3	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	31/03/2020			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo.
4	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	31/03/2020			95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
5	475	Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail)	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	05/04/2019	30/04/2020			3	Sem progresso no período. Problema: Alocação dos recursos humanos para outras demandas mais prioritárias.
