



**TRT-16ª REGIÃO**

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

# PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TIC


DEZEMBRO/2020

EGP-TIC


## **SUMÁRIO**

<b>1.</b>	<b>RESUMO DOS PROJETOS</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>PROJETOS INICIADOS</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>PROJETOS CONCLUÍDOS</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>SETOR DE GOVERNANÇA DE TI</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>SEÇÃO DE APOIO AO PJE</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE</b>	<b>18</b>
<b>8.</b>	<b>SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>19</b>


## 1. RESUMO DOS PROJETOS

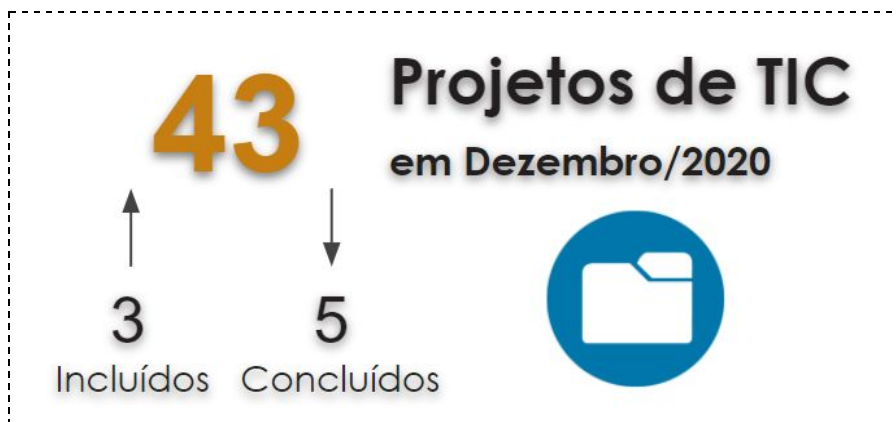


### Temas

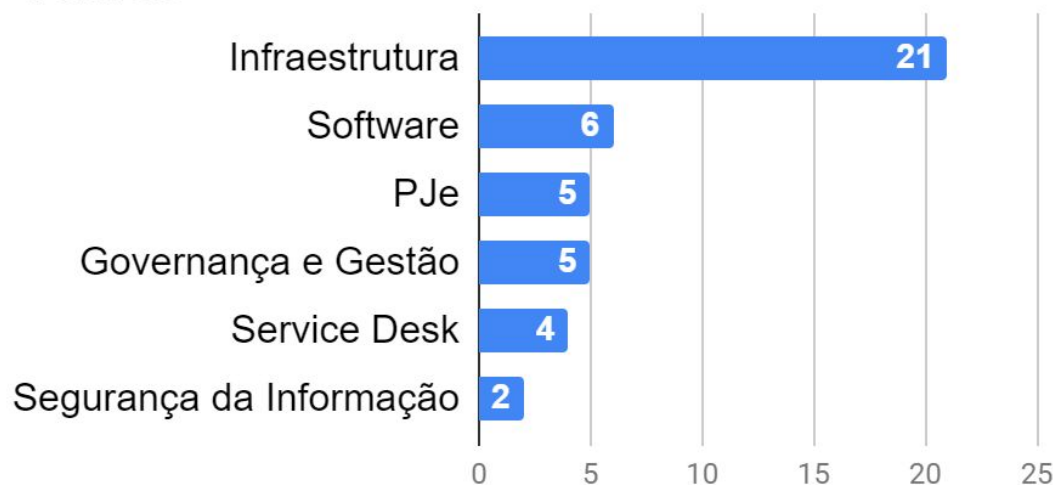

### Projetos nas unidades

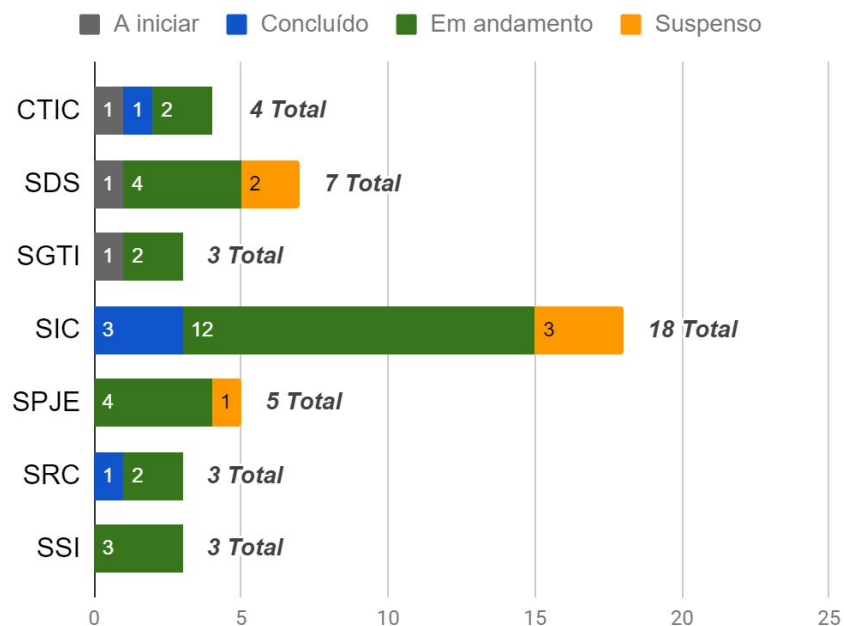

### Situação

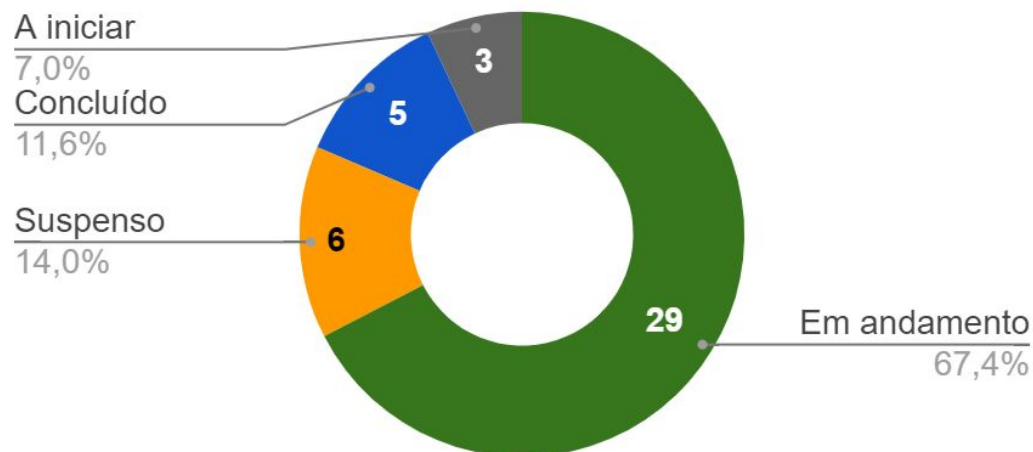

### 1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
555	Elaborar o Plano Diretor de TIC 2021-2022	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	02/12/2020			A iniciar
556	Aquisição de Token USB para Certificado Digital	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	04/12/2020			A iniciar
557	Implantação do Juízo 100% Digital	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	15/12/2020	17/12/2020		Em andamento

### 1.2. PROJETOS INICIADOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
557	Implantação do Juízo 100% Digital	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	15/12/2020	17/12/2020		Em andamento

### 1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	12/01/2018	19/01/2018	30/12/2020	Concluído
381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	27/08/2018	31/08/2018	03/12/2020	Concluído
490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	SIC	18/06/2019	18/06/2019	29/12/2020	Concluído
525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	18/02/2020	18/02/2020	11/12/2020	Concluído
538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	SIC	04/06/2020	24/06/2020	21/12/2020	Concluído

### 1.4. PROJETOS CANCELADOS

**2.COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES**



#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	15/01/2020	29/01/2021	19/05/2020		75	Análise pelo jurídico e pela CTIC, bem como retificação da minuta do Edital. Entregáveis: Entrega 1: ETP(doc.018, P.A. 332/2020) Entrega 2: Dotação Orçamentária(doc.034, P.A. 332/2020); Entrega 3: Manifestação sobre a qualificação técnica(doc.036, P.A. 332/2020); Entrega 4: Termo de Referência V1.0(doc.037, P.A. 332/2020); Entrega 5: Parecer SAJ(doc.039, P.A. 332/2020); Entrega 6: Minuta Edital(doc.042, P.A. 332/2020); Entrega 7: Parecer do NAJ sobre a minuta(doc.046, P.A. 332/2020); Entrega 8: Revisão da Minuta do edital(doc.049, P.A. 332/2020); Entrega 9: Nova Minuta Edital(doc.050, P.A. 332/2020). Mudança: alteração na previsão de fim do projeto para 29/01/2020.

2	524	Solução de Business Intelligence	Stanley Araujo de Sousa	<b>Em andamento</b>	12/02/2020	29/01/2021	12/02/2020		96	<p>Elaboração da Dotação orçamentária e minuta do Contrato.</p> <p>Entregáveis:</p> <p>Entrega 1: ETP(doc.018, P.A.2605/2020)</p> <p>Entrega 2: TR (doc.031, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 3: Minuta do Contrato(doc.049, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 4: Edital da Licitação (doc.054, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 5: ATA do Pregão(doc.59, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 6: Proposta Comercial Vencedora(doc.061, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 7: PARECER NAJ N° 498/2020(doc.064, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 8: Homologação do Certamente(doc.066, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 9: ARP 10/2020 (doc.068, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 10: DOU ARP (doc.069, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 11: Pedido Inicial(doc.071, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 12: Dotação Orçamentária( doc.074 e doc.073, P.A. 2605/2020)</p> <p>Entrega 13: Minuta do Contrato 20/2020(doc.076,P.A. 2605/2020);</p> <p>Mudança: Alteração na data de previsão de fim projeto para 29/01/2021.</p>
3	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	<b>Concluído</b>	18/02/2020	09/12/2020	18/02/2020	11/12/2020	100	<p>Revisão do Plano de contratação, Elaboração da Minuta da Portaria, Publicação pela presidência (Portaria 444/2020);</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega 1: Coleta das necessidades externas a TIC</li> <li>- Entrega 2: Coleta das necessidades internas a TIC</li> <li>- Entrega 3: Consolidação das necessidades</li> <li>- Entrega 4: Ata de Reunião do Comitê de Governança(doc.005, P.A. 1210/2020)</li> <li>- Entrega 5: Portaria 444/2020(doc.008, P.A. 1210/2020)</li> </ul>
4	556	Aquisição de Token USB para Certificado Digital	Stanley Araujo de Sousa	<b>A iniciar</b>	04/12/2020	31/03/2021			0	<p>Projeto não iniciado. Atraso no início devido a elevadas atividades de pagamento e de gestão no final do ano, associado com vandalismo do anel de fibra que interliga a Sede ao FAS. O projeto foi alocado para</p>




		Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Silva	andamento						Publicação das releases 1.16.0.1 e 1.16.0.2 no servidor de Homologação; Implementação integração do Assinador do PROAD (TRT-12) no SIGS; Início dos trabalhos para atualização da infraestrutura tecnológica do SIGS para utilização do Java11, Wildfly 20 e Oracle 19 Entregáveis: Entrega 1: Estruturação da arquitetura proposta (88%) Entrega 2: Módulo de Agenda e Tabelas Básicas (95%) Entrega 3: Módulo Ocupacional (91%) Entrega 4: Módulo Pericial (97%) Entrega 5: Módulo de Segurança do Trabalho (30%) Entrega 6: Módulo Assistencial (90%) Entrega 7: Módulo de segurança da NGS1 (67%) Entrega 8: Módulo de Relatórios Gerenciais (40%) Pendência: Aguardando a conclusão do Projeto 32 - SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal para realizar o processo de implantação do SIGS em Produção no TRT-16.
4	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	A iniciar	01/01/2018	18/12/2020			0	Projeto não iniciado.
5	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	Suspensa	28/02/2019	17/12/2021	28/08/2019		35	Sem progresso no período. Entregáveis:   (90%) ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura   (20%) ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica com o TRT12   (0%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema   (0%) ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE   (0%) ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento   (0%) ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em Produção Pendência: Aguardando o setor de infraestrutura concluir as prioridades atuais para realizar a implantação do PROAD em infraestrutura ágil em Homologação;
6	533	GEST-JT: Implantação do Módulo de Estagiários do SIGEP	Andre Pereira Nunes	Em andamento	06/05/2020	26/02/2021	07/05/2020		95	Sem progresso no período. Entregáveis: (100%) ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura



									(100%) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas do tribunal (100%) ENTREGA 2: Migração de Dados (80%) ENTREGA 4: Disponibilização em produção, com Manual de Operações
7	554	Solução de SMS Corporativo 2021	Andre Pereira Nunes	<b>Em andamento</b>	17/11/2020	12/03/2021	18/11/2020	0	Sem progresso no período. Gerente/Executor de férias. Entregáveis: (0%) Entregável 1 - Pré-requisitos da Contratação (0%) Entregável 2 - Quarto Aditivo do Contrato Assinado; (0%) Entregável 3 - Empenho emitido pela SOF (0%) Entregável 4 - Encerramento da Contratação

#### 4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

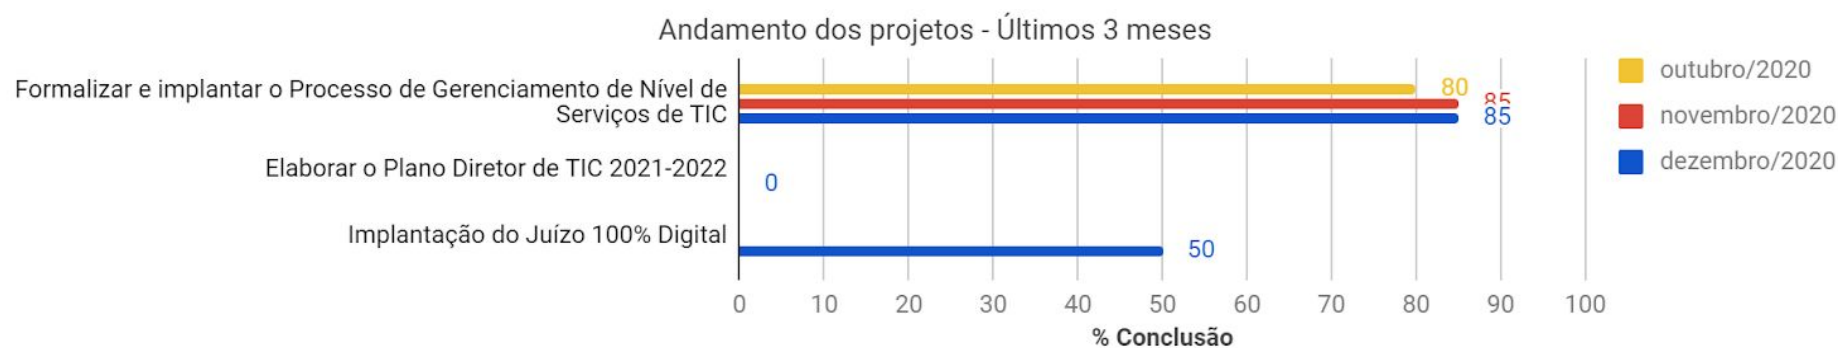


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	528	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	<b>Em andamento</b>	01/04/2020	05/02/2021	19/10/2020		85	Sem progresso no período. Entregáveis: (100%) Política de gerenciamento do processo de acordo de nível de serviço elaborada e publicada (100%) Processo de gerenciamento do acordo do nível de serviço definido e publicado (80%) Acordos de níveis de serviços definidos (90%) Acordos de níveis de serviços configurados no assyst
2	555	Elaborar o Plano Diretor de TIC	Rafael Robinson de	<b>A iniciar</b>	02/12/2020	30/06/2021			0	Projeto não iniciado.

		2021-2022	Sousa Neto							
3	557	Implantação do Juízo 100% Digital	Rafael Robinson de Sousa Neto	<b>Em andamento</b>	15/12/2020	19/02/2021	17/12/2020		50	<p>Planejamento do projeto realizado.</p> <p>Definida a sala de videoconferência de cada vara (sala de audiência) e a forma que ela será equipada.</p> <p>Elaborada a minuta de regulamentação do Juízo 100% Digital e encaminhada à Presidência.</p> <p>Formulário de atermação elaborado em homologação e encaminhado para validação</p> <p>Entregáveis:</p> <p>(50%) Definição do Processo de Trabalho</p> <p>(70%) Regulamentação</p> <p>(40%) Adequação da Infraestrutura de TIC</p> <p>(60%) Formulário de atermação virtual</p> <p>(0%) Capacitação</p> <p>(0%) Divulgação</p>

**5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL**

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

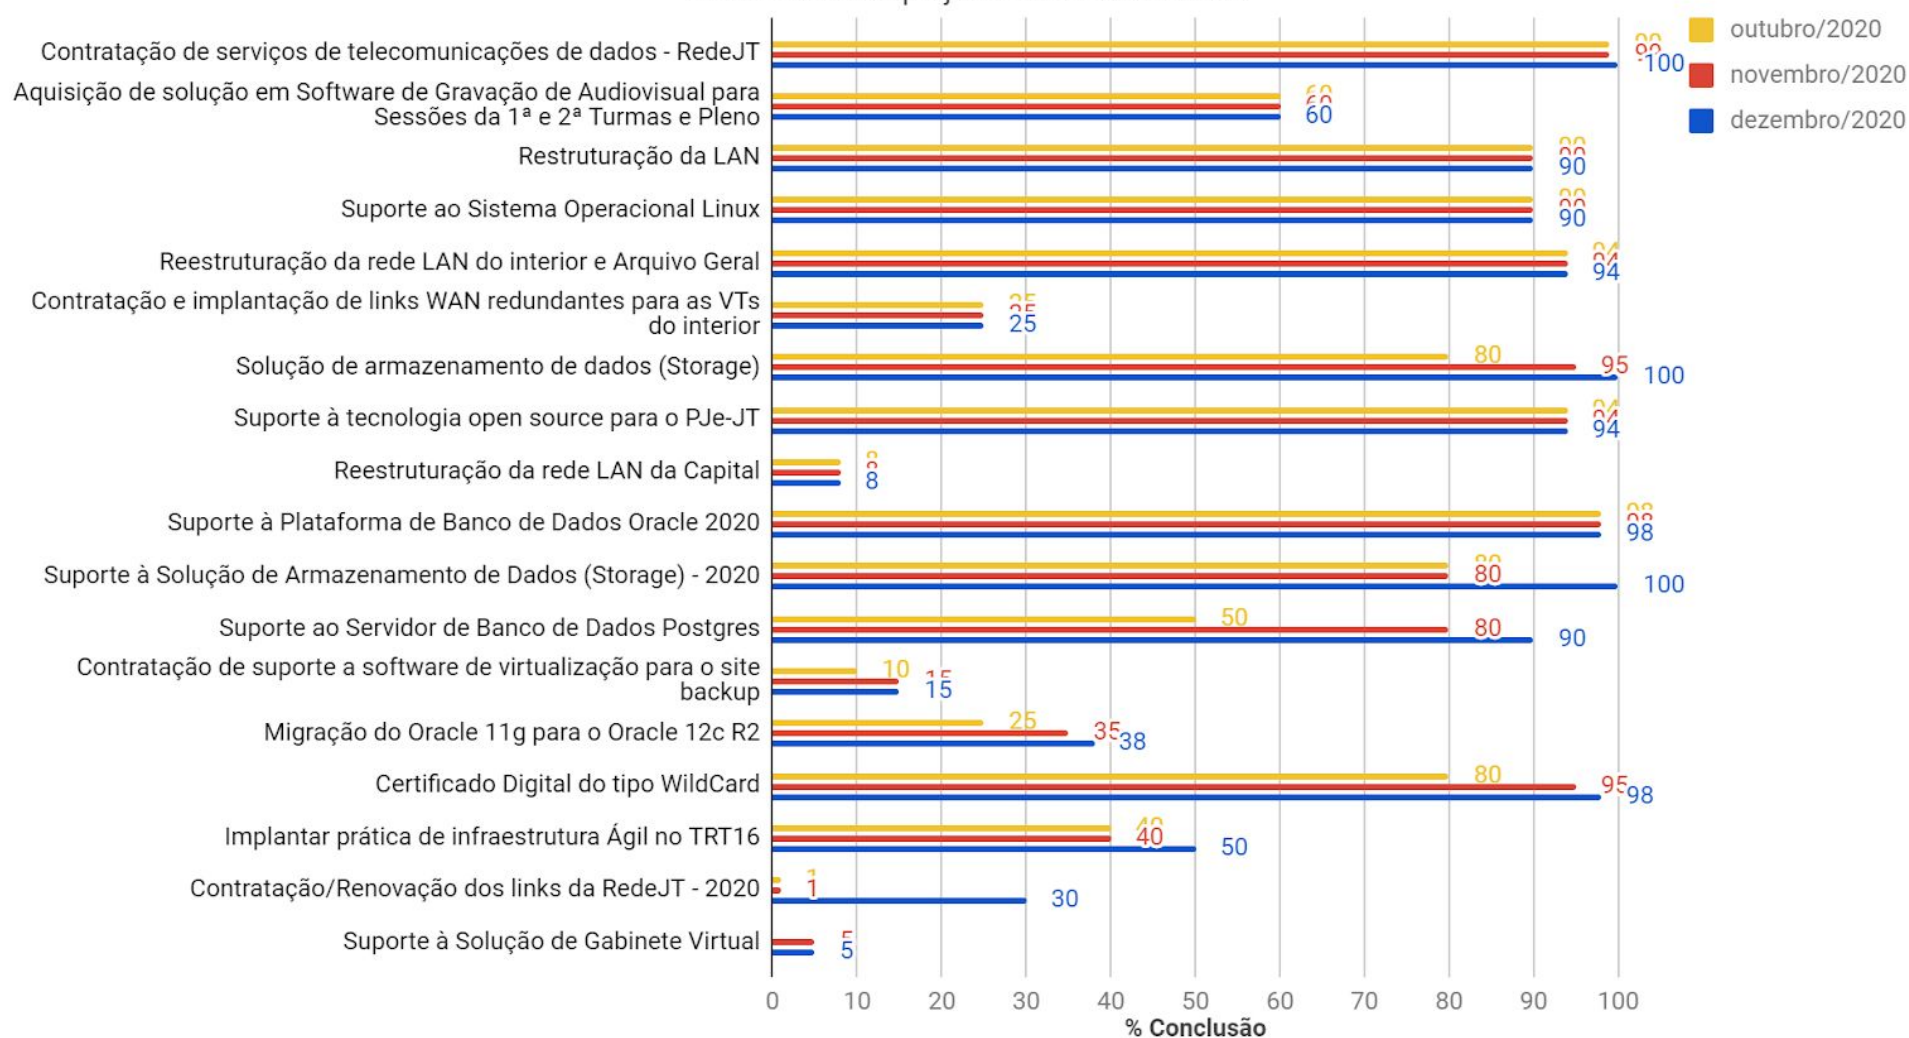

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Concluído	12/01/2018	30/12/2020	19/01/2018	<b>30/12/2020</b>	100	Formalizado o encerramento do projeto.
2	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspenso	06/07/2018	30/06/2021	22/10/2018		60	Sem progresso no período. Entregáveis: - ETP e TR: (90%); - Publicação da Licitação (0%); - Contratação (0%); - Implantação (0%);
3	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	17/10/2018	30/11/2020	01/11/2018		90	Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC)
4	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	29/01/2019	31/12/2020	30/01/2019		90	Contrato nº 16/2020 assinado e publicado no DOU. Entregáveis: Entrega 1: ETP (100%) Entrega 2: CONTRATO (100%)
5	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniell Magalhaes de Carvalho	Em andamento	01/04/2019	31/03/2021	16/04/2019		94	Sem progresso no período. Entregáveis restantes: - Implantação do WiFi (75%)
6	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspenso	15/04/2019	31/03/2021	08/03/2019		25	Sem progresso no período. Mudança: O prazo foi alterado para março de 2021, pois o projeto ainda não foi retomado.
7	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Concluído	18/06/2019	19/12/2020	18/06/2019	<b>29/12/2020</b>	100	Realizado o Termo de Recebimento Definitivo, PA 4380/2019, doc.135; Pagamento da despesa, PA 4380/2019, doc.152. Projeto encerrado com a anuência da CTIC no dia 29/12/2020, conforme TEP registrado. Entregáveis: - 2 (dois) Storage "Híbrido" Sistema de Armazenamento de Dados Huawei e 2 (dois) Kits de Expansão para Storage "Híbrido" Entrega 1: Storage do Site Principal (100%): - Instalação Física do Storage do Site Principal (100%); - Implantação Lógica do Storage do Site Principal (100%); - Migração dos dados para o Storage do Site Principal (100%);


										<p>Entrega 2: Storage do Site Secundário (100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalação Física do Storage Site Secundário (100%)</li> <li>- Implantação Lógica do Storage do Site Secundário (100%)</li> <li>- Migração dos dados para o Storage do Site Secundário (100%)</li> </ul> <p>Entrega 3: Transferência de Conhecimento Turma 1 (100%)</p> <p>Entrega 4: Transferência de Conhecimento Turma 2 (100%)</p>
8	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	09/12/2019	22/01/2021	09/12/2019		94	<p>Sem progresso no período. Aguardando apenas a assinatura do contrato.</p> <p>Entregáveis:</p>
9	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	13/01/2020	30/06/2021	27/01/2020		8	<p>Sem progresso no período.</p> <p>Entregáveis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(50%) Switches do Bloco C</li> <li>(0%) Switches do Bloco B</li> <li>(0%) Switches do Bloco A</li> <li>(0%) Switches do Forum Astolfo Serra</li> <li>(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede</li> <li>(0%) Alteração dos IPs de Servidores Sede</li> <li>(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS</li> </ul>
10	536	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2020	Leonel Pereira	Em andamento	13/05/2020	28/02/2021	13/05/2020		98	<p>Analisado as sugestões da proposta efetuada pela Oracle para o contrato após a assinatura do Presidente do TRT. CTIC manifestou discordância em relação a uma das alterações propostas pela Oracle e remeteu novamente o PA para a Diretoria Geral.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega 1: contrato assinado pelo contratante pela contratada (50%)</li> </ul> <p>Riscos e Problemas: Como a empresa ainda não assinou o contrato, não há cobertura de suporte Oracle. Entretanto nosso acesso ao portal de suporte não chegou a ser cancelado.</p>
11	538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	Concluído	04/06/2020	21/12/2020	24/06/2020	<b>21/12/2020</b>	100	<p>Primeiro Aditivo assinado do contrato 27/2018. Projeto concluído.</p>

12	540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	<b>Em andamento</b>	15/06/2020	26/02/2021	22/06/2020		90	<p>Realizado o acompanhamento da situação da contratação nacional capitaneada pelo TRT23. Sem impedimentos até então no processo.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega 1: DOD e TAP (100%)</li> <li>- Entrega 2: Portaria de Planejamento (100%)</li> <li>- Entrega 3: Elaboração de ETP e TR (100%);</li> <li>- Entrega 4: Acompanhamento da contratação e registro da ARP (80%);</li> <li>- Entrega 5: Registro de preços publicado (0%);</li> </ul>
13	541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	<b>Em andamento</b>	17/06/2020	04/03/2021	22/06/2020		15	<p>Sem progresso no período.</p> <p>Pendência: Decisão administrativa sobre a escolha do processo de aquisição mais adequado para a situação econômico-financeira do Tribunal. A CTIC aguarda o resultado da Licitação realizada pelo MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, SECRETARIA DE GESTAO, CENTRAL DE COMPRAS (UASG 201057-CENTRAL DE COMPRAS), Ata de Realização do Pregão Eletrônico N° 00015/2020 (SRP), para responder ao questionamento formulado pela Diretoria Geral (doc.015).</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega 1: (100%) ETP - aprovado pela Administração no dia 27/08/2020</li> <li>- Entrega 2: (100%) TR - entregue no dia 16/11/2020 ao Integrante Administrativo.</li> <li>- Entrega 3: (100%) Análise de Riscos - encaminhado para o Gestor do Contrato e Integrante Demandante no dia 24/09/2020</li> <li>- Entrega 4: (0%) Serviço de Suporte Técnico renovado</li> </ul> <p>Mudança: alteração do prazo de fim do projeto para 04/03/2021</p>
14	542	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	Leonel Pereira	<b>Em andamento</b>	06/07/2020	28/02/2021	07/07/2020		38	<p>Foram realizadas atividades relacionadas à validação e às configurações adicionais:</p> <p>Instalação do Oracle Autonomous Health Framework Configurando o "Caminho de descoberta de Disco" para o ASM</p> <p>Configuração de localização temporária para o auto cleanup</p> <p>Aplicação do patchset mais recente no database</p>

									<p>Aplicação do patchset mais recente na infraestrutura do grid (tarefa que foi executada com sucesso no nó 1, mas falhou no nó 2 devido a um bbug do produto)</p> <p>Entregáveis:</p> <p>Entrega 1: Oracle RAC instalado, banco de dados de produção importado para o novo ambiente (0%)</p> <p>Entrega 2: Novo servidor rman instalado e configurado pronto para a geração dos backups do novo ambiente (0%)</p> <p>Entrega 3: Bancos de desenvolvimento, homologação, bugfix e teste atualizados para a versão 19c (0%)</p>
15	548	Certificado Digital do tipo WildCard	Yuri Sousa Oliveira	<b>Em andamento</b>	18/09/2020	30/12/2020	30/09/2020	98	<p>Enviado para a empresa Soluti o domínio do TRT16 e documentação do TRT16 para geração do certificado digital Wildcard.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega 1: Cotação de preços para a solução de certificado digital SSL do tipo Wildcard (100%);</li> <li>- Entrega 2: ETP - Estudo Técnico Preliminar (100%);</li> <li>- Entrega 3: TR - Termo de referencia (100%);</li> <li>- Entrega 4: Aquisição</li> </ul>
16	549	Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16	Pablo Teofilo Durans	<b>Em andamento</b>	03/08/2020	01/03/2021	03/08/2020	50	<p>Implantação da infraestrutura ágil para o PJe em produção e homologação.</p> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Capacitação da Equipe (100%) Peso: 15</li> <li>  Repositório de Imagens de Serviços (100%) Peso: 5</li> <li>  Infraestrutura de Orquestração de Serviços (50%) Peso: 20</li> <li>  PJe em nova infraestrutura (100%) Peso: 20</li> <li>  Sistemas Administrativos em nova infraestrutura (4 %) Peso: 15</li> <li>  Monitoramento (50%) Peso: 10</li> <li>  Automatização de Deploy em ambiente de Homologação (0%) Peso: 15</li> <li>  Insumos para revisão do Processo de Gerenciamento de Software (50%) Peso: 10</li> </ul> <p>Mudança: alteração da previsão de fim do projeto para 01/03.</p>
17	550	Contratação/Renovação dos links da RedeJT - 2020	Rodrigo Silveira Alexandre	<b>Em andamento</b>	29/09/2020	21/01/2021	08/10/2020	30	<p>Entrega do ETP.</p> <p>Entregáveis:</p>

									(100%) Estudo Técnico Preliminar; (0%) Termo de Referência; (0%) Contrato; (0%) Recebimento dos Links.
18	553	Suporte à Solução de Gabinete Virtual	Antoniél Magalhaes de Carvalho	Em andamento	03/11/2020	31/03/2021	03/11/2020	5	Sem progresso no período. ETP enviado para análise da Coordenação de TIC. Entregáveis: - ETP: 65% - TR: 0% - Aquisição: 0% - Recebimento: 0% - Implantação: 0%

## 6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

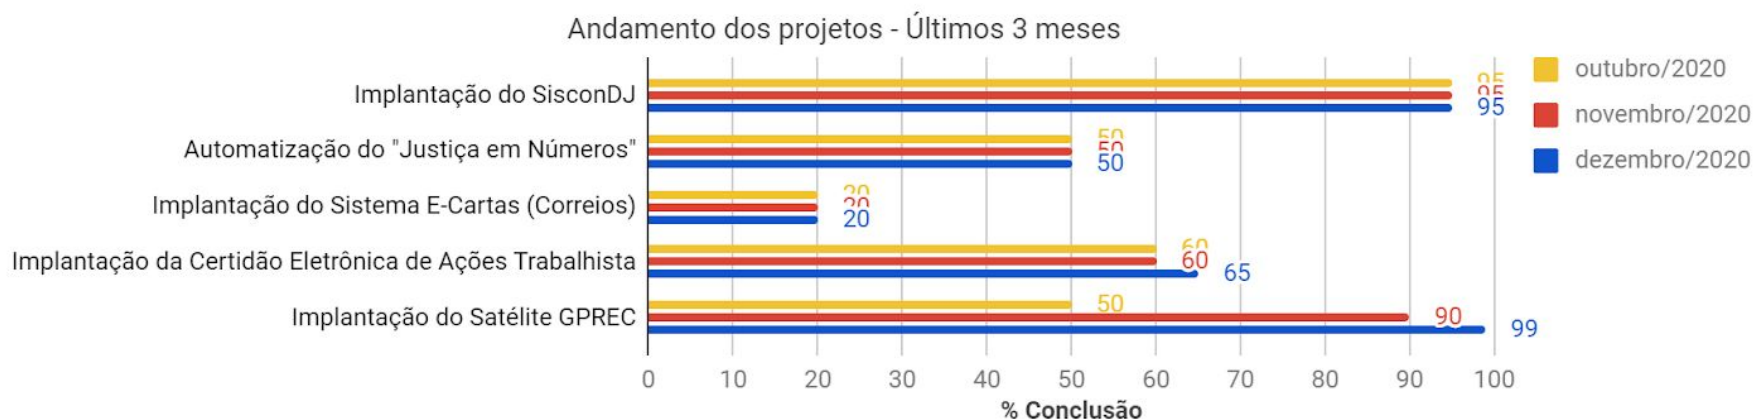


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	05/12/2018	26/02/2021	01/04/2019		95	Sem progresso no período; Entregáveis: - Entrega 1: Validado ambiente de homologação - Entrega 2: Implementação de cadastros em ambiente de produção Pendência: Banco do Brasil retornar com a resolução das pendências repassadas. Recurso humano de



										infraestrutura para atendimento da demanda.
2	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	<b>Em andamento</b>	23/04/2019	31/07/2021	19/06/2019		50	Geração e o envio de carga datajud de xmls de todos os processos que tramitaram a partir de 01/08/2020 (complementando a carga completa de 31/07/2020) conforme requisitado na documentação do prêmio CNJ Conciliar é legal; Avaliação da nova planilha "de-para" oficial disponibilizada no dia 11/12 na issue EXT-262; Entregáveis: Entrega 1: SQL Gerador de XML versão 2020 (100 %) Entrega 2: App java Transmissor de XML (100%) Entrega 3: Envio de cargas completas para atendimento do Prêmio CNJ 2020 (100%) Entrega 4: Automatização mensal da geração e transmissão de XML (40%) Entrega 5: Implementação do pacote de novos requisitos definidos na Portaria CNJ N° 160 de 09/09/2020 para 2021 (20%) Entrega 6: Painel BI para acompanhamento da geração e transmissão automatizada (0%)
3	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	<b>Suspenso</b>	10/09/2019	30/04/2021	01/11/2019		20	Sem progresso no período.
4	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	<b>Em andamento</b>	27/09/2018	26/02/2021	14/10/2019		65	Iniciado a implantação em ambiente de homologação. Entregáveis: (50%) Implantação em ambiente de homologação; (0%) Implantação em ambiente de produção; (0%) Formalização dos sistema através de Portaria; Mudanças: Alteração da previsão de fim do projeto para 26/02/2021. Alterado a gerência do projeto para Gilberto.
5	552	Implantação do Satélite GPREC	Gilberto Cunha Filho	<b>Em andamento</b>	01/06/2020	29/01/2021	27/10/2020		99	Ambiente de produção funcional. Pendência do encerramento formal do projeto. Entregáveis: - Entrega 1: Ambiente de homologação - Entrega 2: Ambiente de produção

**7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE**


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

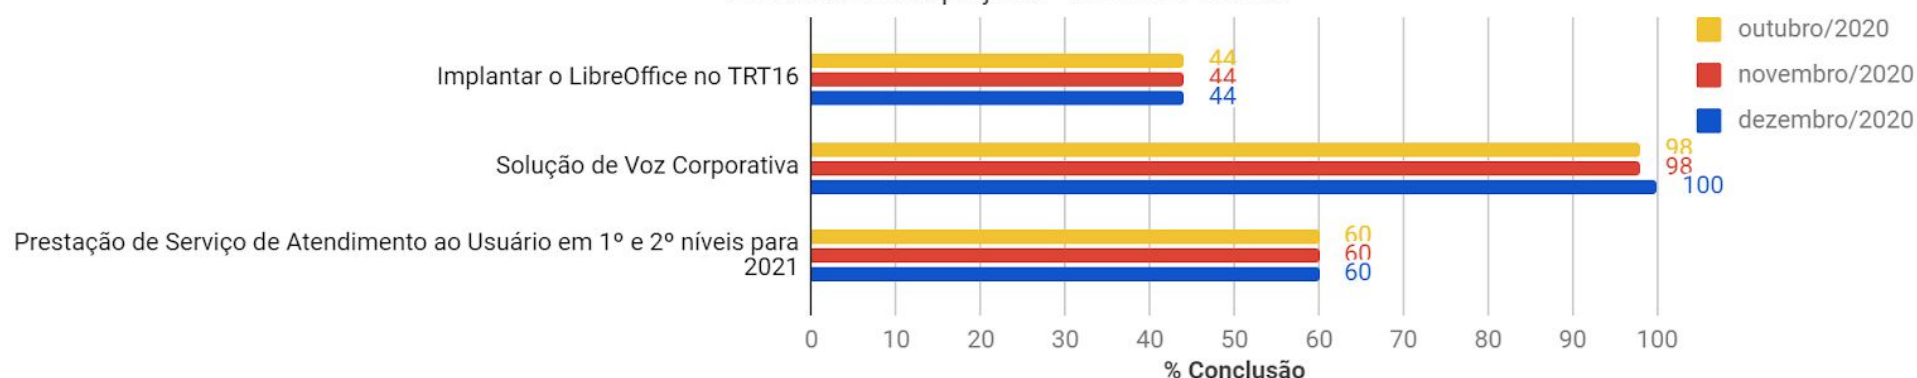

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	25/06/2018	30/06/2021	25/06/2018		44	Sem progresso no período. Entregáveis: - (40%) Instalação do LibreOffice - (0%) Desinstalação do Microsoft Office
2	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Concluído	27/08/2018	04/12/2020	31/08/2018	03/12/2020	100	O projeto foi encerrado formalmente conforme TEP #3505.
3	537	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2021	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	18/05/2020	06/05/2021	18/05/2020		60	Início das alterações no ETP e após adequações solicitadas pelo assessoramento contábil. Entregáveis: (100%) Portaria da Equipe de Planejamento (100%) Estudo Técnico Preliminar (90%) Termo de Referência (0%) Acompanhamento da Licitação (0%) Contrato Assinado (0%) Assyst Configurado (0%) Treinamento Realizado (0%) Serviço Implantado

## 8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

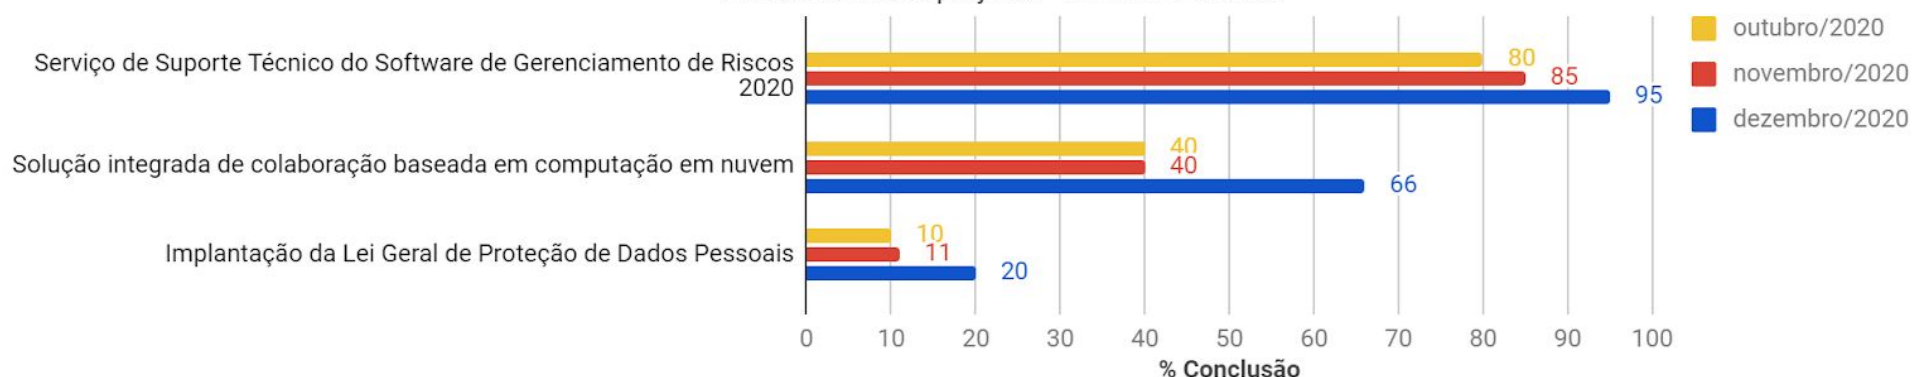

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	Em andamento	25/04/2019	31/12/2020	16/01/2020		95	Contrato 04/2020 assinado em 12 de dezembro de 2020. Pendências: recebimento provisório e recebimento definitivo. Entregáveis: (100%) 1 Preparação (100%) 2 Estudo Técnico Preliminar (100%) 3 Termo de Referência (50%) 4 Contratação
2	539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Jose Augusto	Em andamento	17/06/2020	29/01/2021	19/06/2020		66	Sem progresso no período. O PA está na secretaria administrativa desde 10/11/2020 em fase de elaboração da minuta do aditivo. Entregáveis: (100%) Equipe de planejamento (100%) ETP - Estudo Técnico Preliminar (0%) Renovação concluída Pendências: Projeto na fase de elaboração da minuta de aditivo pela secretaria administrativa.

3	551	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Jose Augusto	<b>Em andamento</b>	29/09/2020	26/02/2021	01/09/2020		20	<p>Foi aplicado o questionário de mapeamento de dados tratados pelas unidades. Das 85 unidades mapeadas inicialmente, apenas 43 responderam.</p> <p>Entregáveis:</p> <p>(10%) 1 Capacitação básica inicial de servidores e magistrados na lei geral de proteção de dados pessoais</p> <p>(50%) 2 Mapeamento inicial dos dados pessoais na justiça do trabalho no Maranhão</p> <p>(100%) 3 Criação de área no site da LGPD</p> <p>(0%) 4 Criação de uma política de privacidade de dados</p> <p>Pendência: Criação de política foi suspensa pelo OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SETIC Nº 44/2020.</p> <p>Mudança: Alteração na previsão de fim do projeto para 26/02.</p>
---	-----	--	--------------	---------------------	------------	------------	------------	--	----	--
