



**TRT-16ª REGIÃO**

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC

JUNHO/2020

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC</b>	<b>5</b>
<b>4.1.</b>	<b>RESUMO DOS PROJETOS</b>	<b>6</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO</b>	<b>7</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>PROJETOS INICIADOS</b>	<b>7</b>
<b>4.1.3.</b>	<b>PROJETOS CONCLUÍDOS</b>	<b>7</b>
<b>4.1.4.</b>	<b>PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>8</b>
<b>4.2.</b>	<b>COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES</b>	<b>8</b>
<b>4.3.</b>	<b>SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>	<b>10</b>
<b>4.4.</b>	<b>SETOR DE GOVERNANÇA DE TI</b>	<b>12</b>
<b>4.5.</b>	<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL</b>	<b>15</b>
<b>4.6.</b>	<b>SEÇÃO DE APOIO AO PJE</b>	<b>18</b>
<b>4.7.</b>	<b>SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE</b>	<b>20</b>
<b>4.8.</b>	<b>SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>22</b>

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de Junho de 2020.


O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.

## 2. REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC

No período de referência não foram realizadas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

### 3. ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC

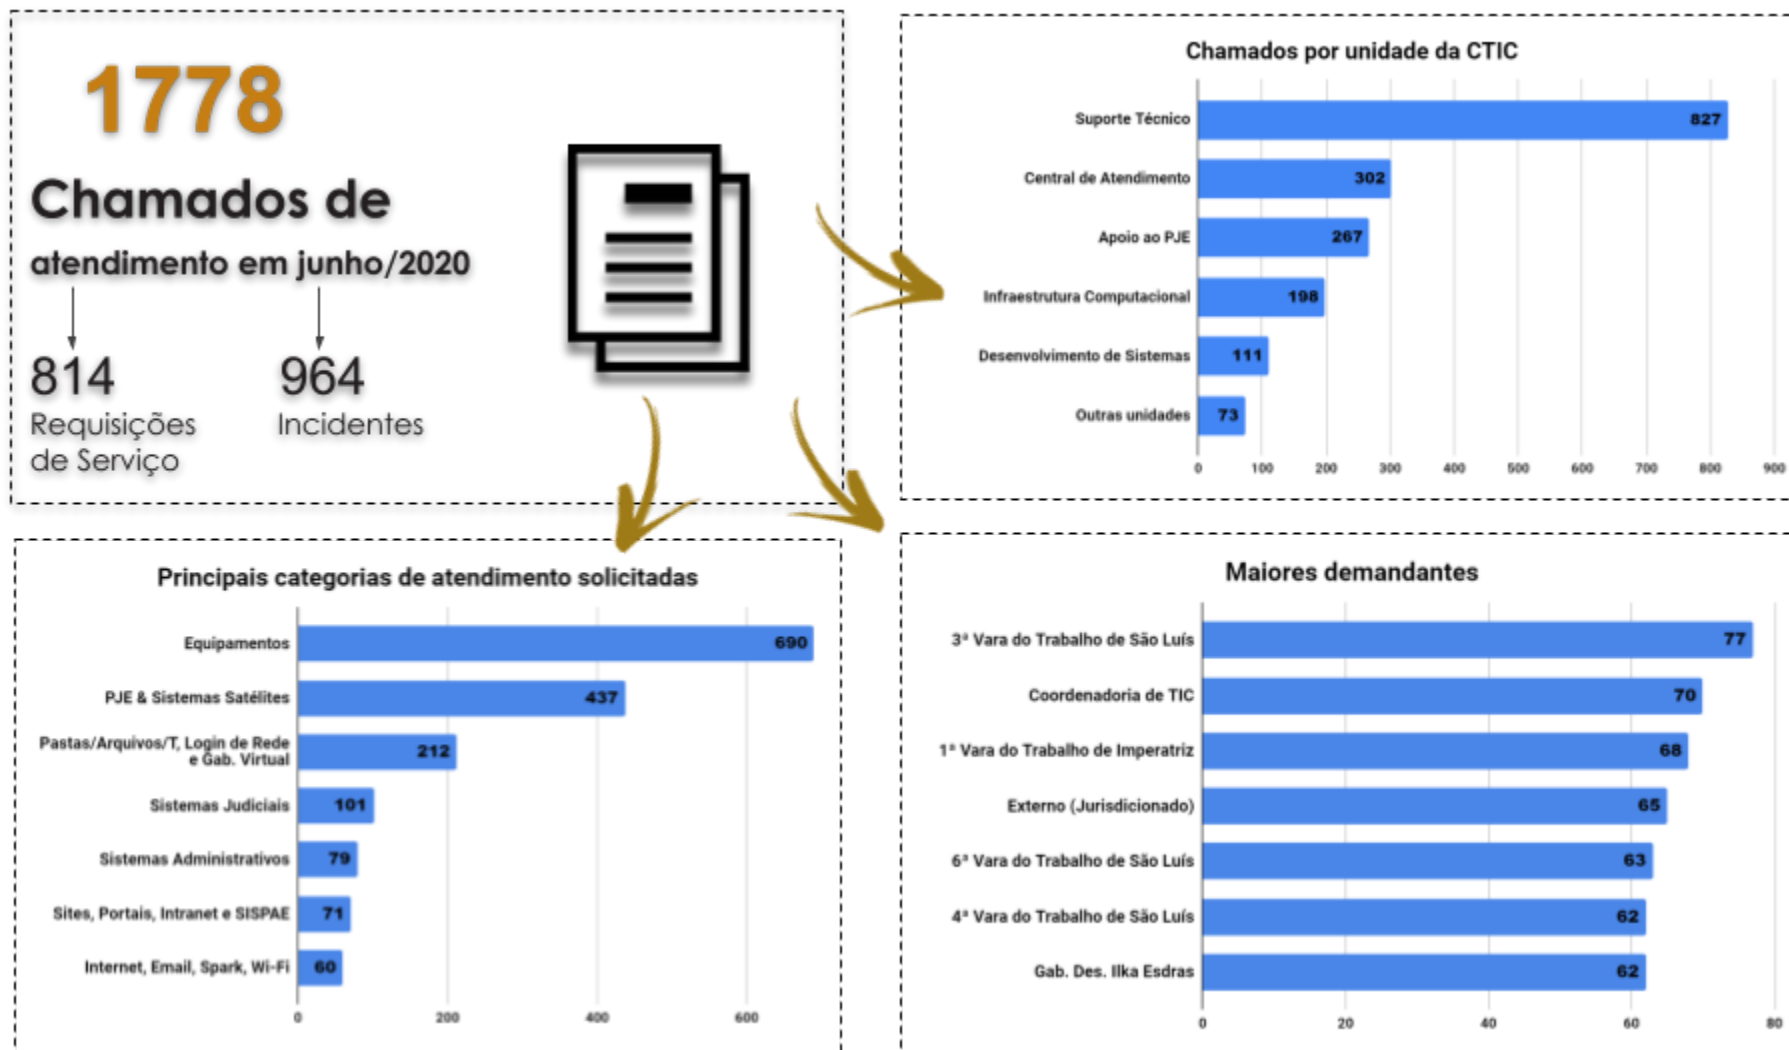

#### **4. PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC**

Nesta seção são apresentados as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.


Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

### 4.1. RESUMO DOS PROJETOS


Quantidade de projetos nas unidades




Complexidade dos projetos

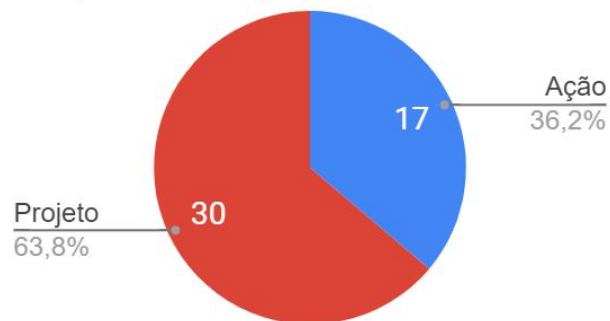

Situação dos projetos

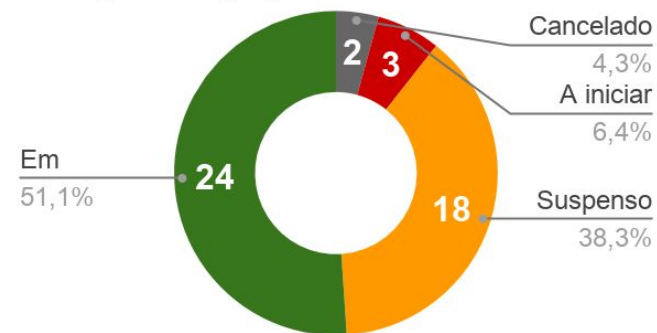

Situação dos projetos nas unidades

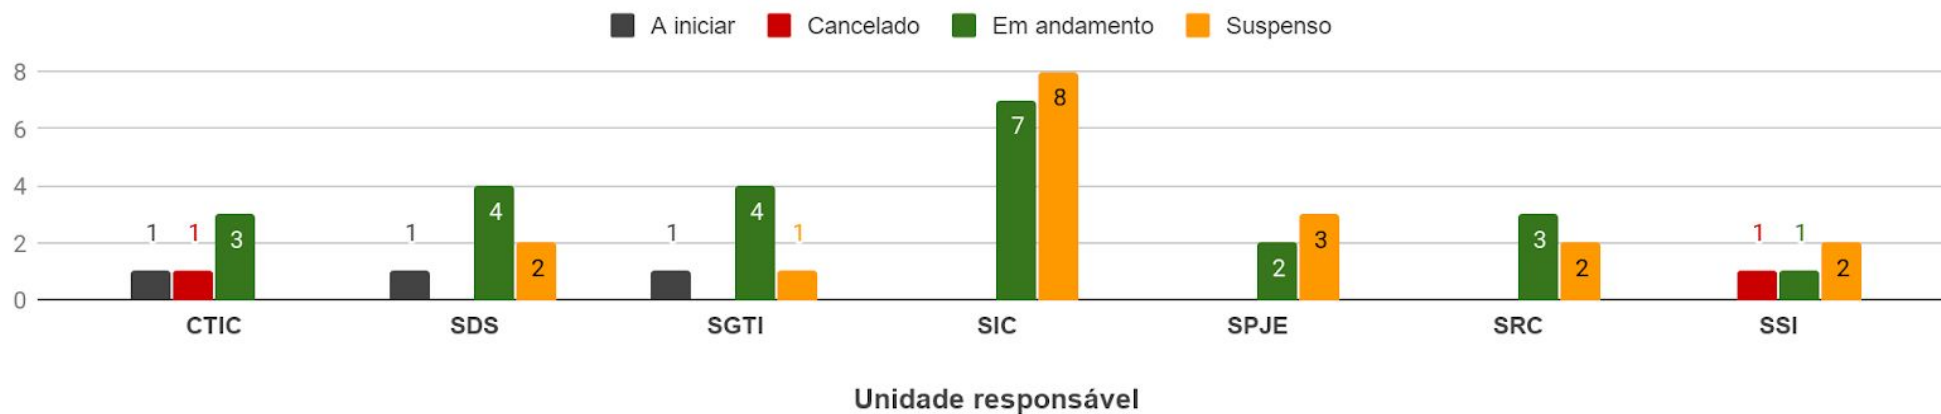

### 4.1.1. PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO

<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	SIC	Projeto	04/06/2020	24/06/2020		Em andamento
539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Romulo Moura	SSI	Projeto	17/06/2020	19/06/2020		Em andamento
540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	SIC	Projeto	15/06/2020	22/06/2020		Em andamento
541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	SIC	Projeto	17/06/2020	22/06/2020		Em andamento

### 4.1.2. PROJETOS INICIADOS


<i>Id</i>	<i>Nome</i>	<i>Gerente do projeto</i>	<i>Unidade responsável</i>	<i>Tipo</i>	<i>Data da demanda</i>	<i>Início realizado</i>	<i>Fim realizado</i>	<i>Status</i>
538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	SIC	Projeto	04/06/2020	24/06/2020		Em andamento
539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Romulo Moura	SSI	Projeto	17/06/2020	19/06/2020		Em andamento
540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	SIC	Projeto	15/06/2020	22/06/2020		Em andamento
541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	SIC	Projeto	17/06/2020	22/06/2020		Em andamento

### 4.1.3. PROJETOS CONCLUÍDOS

### 4.1.4. PROJETOS CANCELADOS

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status	Justificativa
147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	09/05/2017	09/05/2019	30/06/2020	Cancelado	Projeto cancelado. Motivo: Atualização de atos normativos que compõe o manual. Novo projeto de revisão será aberto.
521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Stanley Araujo de Sousa	CTIC	Projeto	15/01/2020	21/01/2020	30/06/2020	Cancelado	Projeto cancelado. Motivo: ausência de Engenheiro Eletricista. Não há no quadro de TI servidores especializados nessa área de conhecimento. Assim, servidores serão capacitados e o projeto será transferido para 2021.

## 4.2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

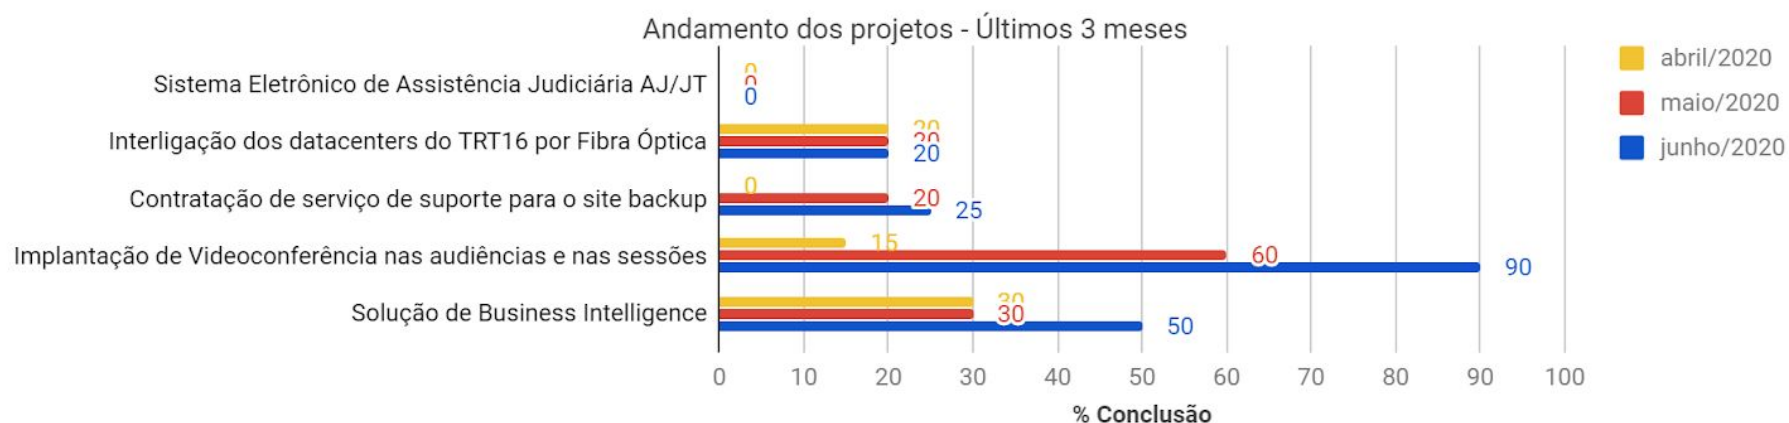


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	527	Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT	Stanley Araujo de Sousa	A iniciar	Ação	27/02/2020	30/09/2020			0	Sem progresso no período. O projeto é coordenado e centralizado pelo TST, assim, não temos muita influência sobre o andamento. Estamos a espera do treinamento das unidades a ser ministrado pelo TST.



2	521	Interligação dos datacenters do TRT16 por Fibra Óptica	Stanley Araujo de Sousa	<b>Cancelado</b>	Projeto	15/01/2020	06/07/2020	21/01/2020	30/06/2020	20	Projeto cancelado. Motivo: ausência de Engenheiro Eletricista. Não há no quadro de TI servidores especializado nessa área de conhecimento. Assim, servidores serão capacitados e o projeto será transferido para 2021.
3	519	Contratação de serviço de suporte para o site backup	Stanley Araujo de Sousa	<b>Em andamento</b>	Projeto	15/01/2020	28/08/2020	19/05/2020		25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratativas para realizar aditivo no contrato do nobreak de 40 kva da sede a fim de cobrir os 2 nobreaks de 40 kva do FAS;</li> <li>- Solicitação a DG para designação de integrantes técnicos da engenharia e da eletricidade.</li> </ul> Riscos e problemas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência de engenheiro eletricista;</li> <li>- Dificuldade em realizar o aditivo;</li> <li>- Há risco de haver dois contratos de manutenção de nobreaks de 40kva com 2 objetos idênticos com preços diferentes.</li> </ul>
4	524	Solução de Business Intelligence	Stanley Araujo de Sousa	<b>Em andamento</b>	Ação	12/02/2020	31/08/2020	12/02/2020		50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ETP concluído;</li> <li>- Elaboração do TR com participação de outros regionais.</li> </ul>
5	532	Implantação de Videoconferência nas audiências e nas sessões	Stanley Araujo de Sousa	<b>Em andamento</b>	Projeto	27/04/2020	15/07/2020	28/04/2020		90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sessões de julgamento da 1ª Turma realizada com sucesso;</li> <li>- Treinamento do funcionário da empresa (lury) sobre a transmissão finalizado;</li> <li>- Alinhamento com a Secretaria do Pleno sobre o procedimento de transmissão finalizado;</li> <li>- Fornecimento de número de celular para atendimento urgente dos desembargadores da sessão;</li> </ul>

### 4.3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

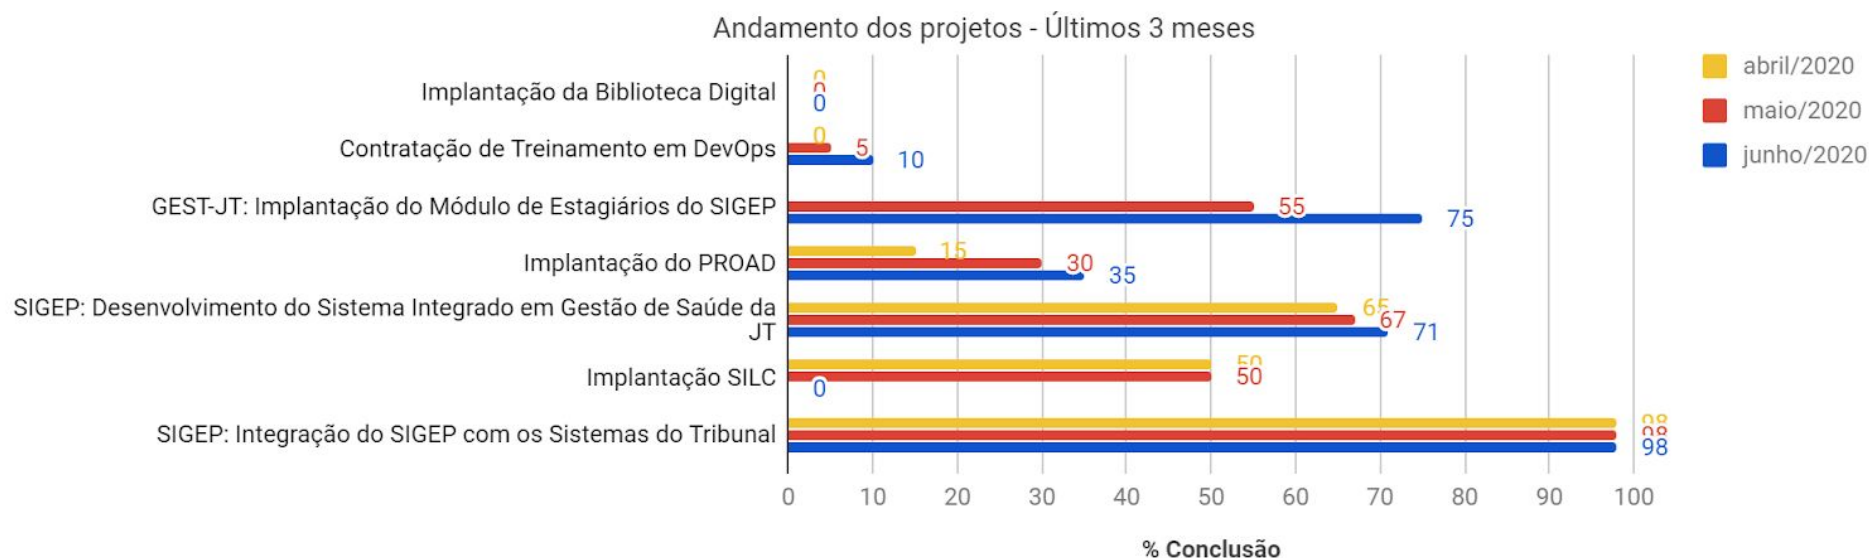


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	279	Implantação da Biblioteca Digital	Andre Pereira Nunes	<b>A iniciar</b>	Projeto	01/01/2018	18/12/2020			0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
2	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Diogo Duailibe da Silva	<b>Em andamento</b>	Projeto	25/08/2017	19/12/2022	29/08/2017		71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Refatoração de parte da fase 1 dos Programas de Saúde Ocupacional</li> <li>- Conclusão da fase 2 dos Programas de Saúde Ocupacional</li> <li>- Correções de Bugs detectados no Redmine Nacional</li> <li>- Fechamento das versão 1.14.0.2 e 1.14.0.3 de correções de erro</li> <li>- Geração da Release Candidate 1 da versão 1.15.0.0 para homologação do Grupo de Negócio.</li> </ul>

3	499	Implantação do PROAD	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	28/02/2019	30/09/2020	28/08/2019		35	Evolução dos entregáveis: ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura Em andamento 90%: 3 tarefas realizadas ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica com o TRT12 (Em andamento: 25%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema Nova ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE Nova ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento Nova ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em Produção Nova
4	526	Contratação de Treinamento em DevOps	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	12/03/2020	30/09/2020	18/03/2020		10	Coleta de proposta da 4linux;
5	533	GEST-JT: Implantação do Módulo de Estagiários do SIGEP	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Ação	06/05/2020	31/07/2020	07/05/2020		75	ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura (Em andamento: 80%) ENTREGA 2: Migração de Dados (100% Concluída) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas do tribunal (Em andamento: 80%): 3 tarefas realizadas; ENTREGA 4: Disponibilização em produção, com Manual de Operações (Em andamento: 50%): 3 tarefas realizadas;
6	19	Implantação SILC	Andre Pereira Nunes	Suspenseo	Projeto	06/02/2018	18/12/2020	23/04/2018		0	Sem progressos no período. Projeto previsto para execução no segundo semestre de 2020.
7	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Suspenseo	Projeto	24/05/2018	30/08/2020	04/06/2018		98	Sem progressos no período. Projeto suspenso até a efetivação da data de transição, adiada para 01/08/2020, mediante solicitação do setor de folha de pagamento via chamado Assyst 33213.

#### 4.4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

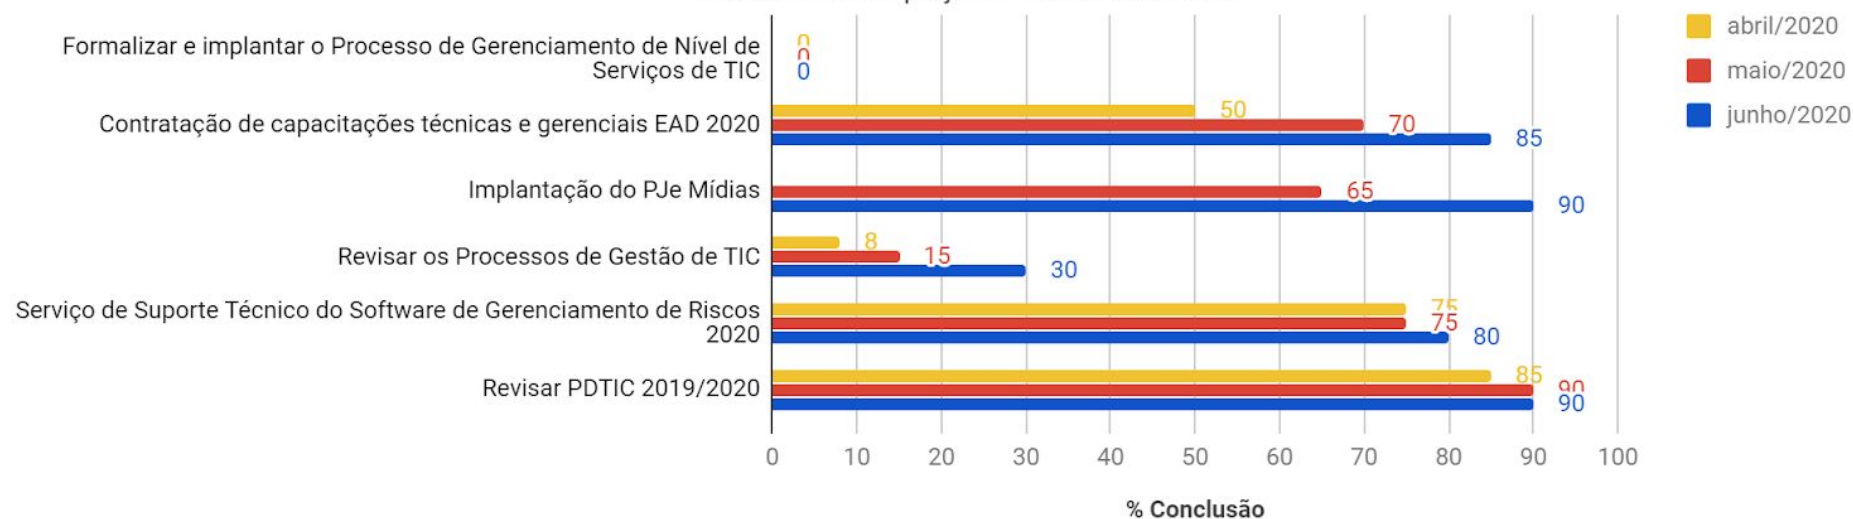


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	528	Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	<b>A iniciar</b>	Ação	01/04/2020	30/09/2020			0	Sem progresso no período. Postergado o início de execução do projeto devido a priorização de outras atividades/projetos.
2	483	Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020	Jose Augusto	<b>Em andamento</b>	Ação	25/04/2019	31/08/2020	16/01/2020		80	Contratação autorizada pela DG e minuta do contrato enviada a presidência. Entregáveis: 1 Preparação Fechada 100% 2 Estudo Técnico Preliminar Fechado 100% 3 Termo de Referência Fechado 100% 4 Contratação Em andamento 70%
3	529	Contratação de	Rafael Robinson de	<b>Em</b>	Ação	06/04/2020	10/07/2020	14/04/20		85	- Procedimento para a contratação por

		capacitações técnicas e gerenciais EAD 2020	Sousa Neto	andamento				20			inexigibilidade realizado. - Nota de Empenho da contratação emitida. Evolução dos entregáveis: - Estudo da Contratação - Concluído 100% - Contrato Assinado - Em andamento 90% - Acesso à Plataforma Liberado - A iniciar 0%
4	531	Revisar os Processos de Gestão de TIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	24/04/2020	04/09/2020	27/04/2020		30	Evolução do entregáveis: - Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Demandas atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado - Em andamento 80% - Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC atualizado - Em andamento 20% - Gerenciamento de Problemas atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento de Mudança e Liberação atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento de Software atualizado - A iniciar 0% - Planejamento Estratégico e Tático de TIC atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento de Incidentes atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento de Requisição atualizado - A iniciar 0% - Gerenciamento da Central de Atendimento de TIC atualizado - A iniciar 0%
5	534	Implantação do PJe Mídias	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Ação	06/05/2020	31/07/2020	07/05/2020		90	- Foi realizado um treinamento sobre o PJe Mídias no dia 10/06/2020, através do Google Meet, pela Escola Judicial. - Realizado cadastramento no PJe Mídias de 106 usuários do Tribunal, sendo 42

											magistrados e 64 servidores. Evolução dos entregáveis planejados: - Ferramenta testada e validada - Concluída 100% - Documentação criada - Em andamento 90% - Ferramenta disponibilizada e suporte inicial fornecido - Em andamento 90%
6	509	Revisar PDTIC 2019/2020	Rafael Robinson de Sousa Neto	<b>Suspenso</b>	Ação	04/11/2019	31/07/2020	14/11/2019		90	- Sem evolução no período. A minuta da revisão do PDTIC segue aguardando apreciação e publicação da matéria pela Presidência. Evolução dos entregáveis: - Avaliação do resultado das metas e ações previstas para 2019 - Concluída 100% - Necessidades mapeadas e priorizadas para 2020 - Concluída 100% - Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - Concluída 100% - Nova versão do PDTIC apreciada pelo CGovTIC - Em andamento 100% - Nova versão do PDTIC publicada pela Presidência - Em andamento 50%

### 4.5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses

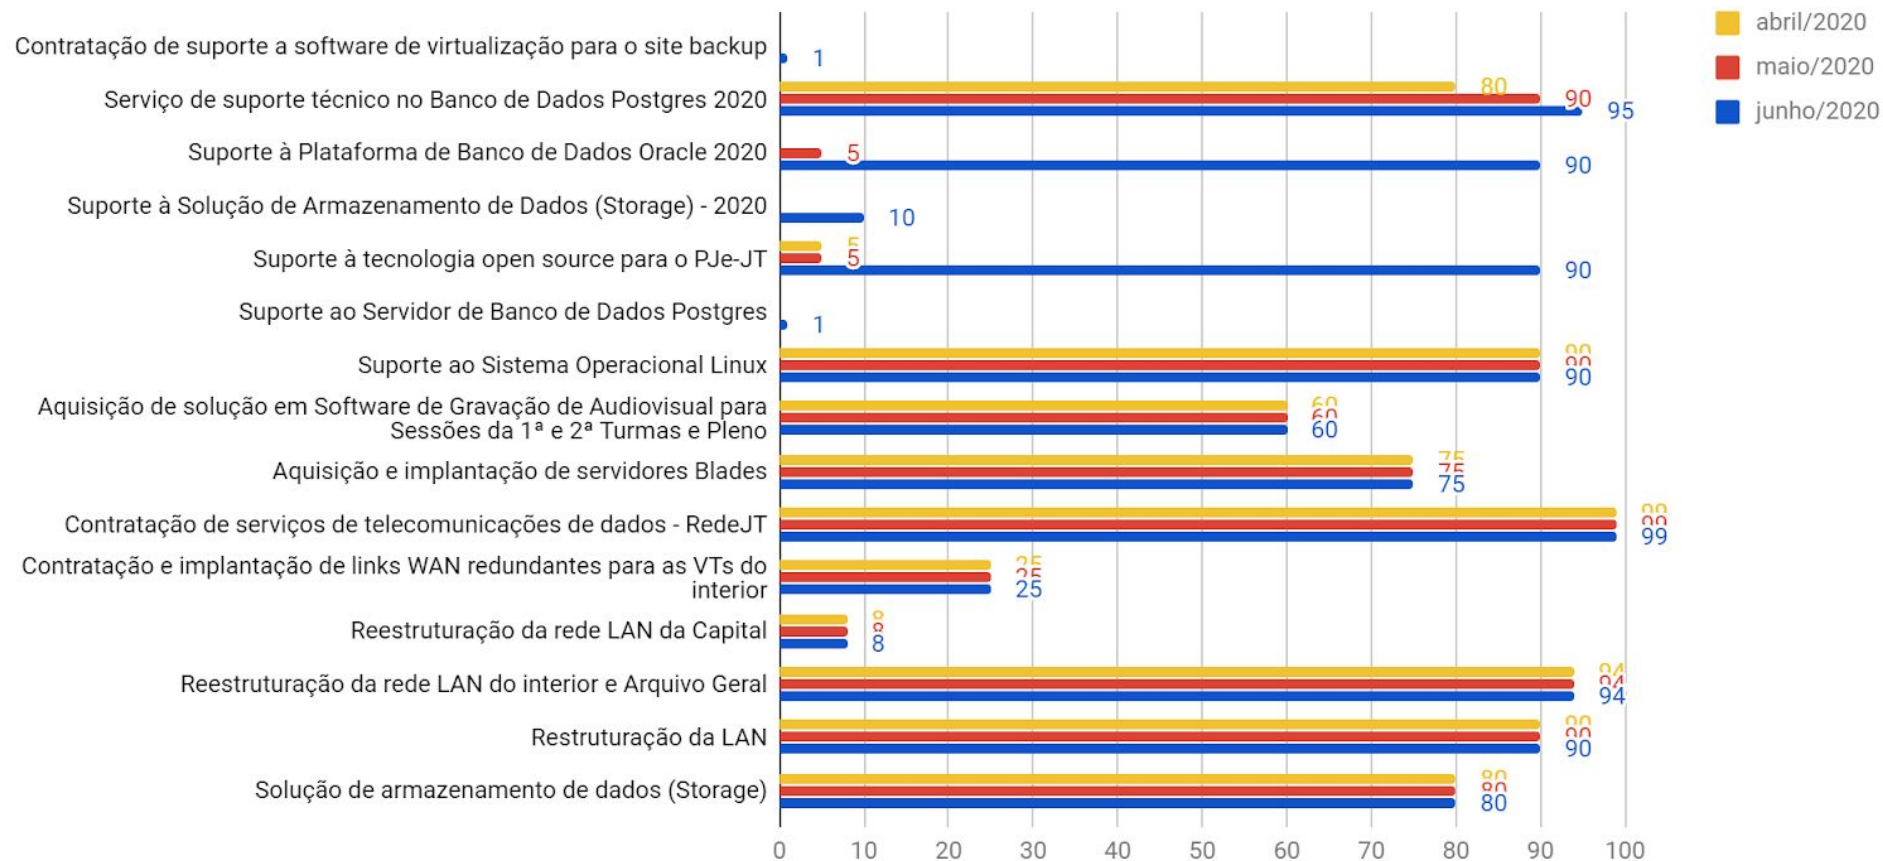


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	461	Suporte ao Sistema Operacional Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	07/08/2020	30/01/2019		90	Sem progresso no período. Solicitação respondida pelo TRT5 a respeito de impedimento de contratação em relação ao pregão. Há um recurso judicial, porém sem óbice para contratação.
2	517	Suporte à tecnologia open source para o PJe-JT	Rodrigo Silveira Alexandre	Em andamento	Projeto	09/12/2019	30/07/2020	09/12/2019		90	Processo já tramitado com quantitativos a serem contratados, esperando elaboração e assinatura do contrato por parte da administração.
3	523	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres 2020	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Ação	06/02/2020	10/07/2020	06/02/2020		95	5º Termo de Aditivo assinado pelas partes.
4	536	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2020	Leonel Pereira	Em andamento	Projeto	13/05/2020	27/10/2020	13/05/2020		90	O Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência foram elaborados e encaminhados à CTIC.
5	538	Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020	João Diego Rocha Lima	Em andamento	Projeto	04/06/2020	25/08/2020	24/06/2020		10	- Formalização do início do projeto; - Versão inicial do ETP elaborado.
6	540	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	Projeto	15/06/2020	26/02/2021	22/06/2020		1	Formalização do início do projeto.
7	541	Contratação de suporte a software de virtualização para o site backup	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	17/06/2020	16/12/2020	22/06/2020		1	- Formalização do projeto; - Equipe de planejamento para contratação do suporte técnico da solução de virtualização do site backup, DESPACHO CTIC 059/2020 (PA 3269/2020, DOC.003)
8	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Rodrigo Silveira Alexandre	Suspensão	Projeto	12/01/2018	30/07/2020	19/01/2018		99	Sem progresso no período.
9	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspensão	Projeto	06/07/2018	31/10/2020	22/10/2018		60	Sem progresso no período. Atrasos no projeto de Infraestrutura Ágil pode comprometer este projeto.



10	442	Reestruturação da LAN	Rodrigo Silveira Alexandre	<b>Suspensão</b>	Projeto	17/10/2018	31/07/2020	01/11/2018		90	Sem progresso no período.
11	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	<b>Suspensão</b>	Projeto	15/01/2019	15/12/2020	31/01/2019		75	- Sem progresso no período. A Administração foi informada sobre o Recebimento Definitivo pelo integrante da Comissão de Recebimento (doc.089), a liberação do valor retido foi solicitado no dia 26/05/2020. A Contratada aguarda o pagamento do valor. Riscos e Problemas: - Setor com tarefas e demandas em excesso, sobretudo, devido a escassez de recursos humanos, ocasionando interrupção no projeto e atraso nas atividades/projetos desenvolvidos.
12	476	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	Antoniell Magalhaes de Carvalho	<b>Suspensão</b>	Projeto	01/04/2019	31/12/2020	16/04/2019		94	Sem progresso no período. Inviável dar prosseguimento devido à quarentena.
13	480	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	Rodrigo Silveira Alexandre	<b>Suspensão</b>	Projeto	15/04/2019	30/08/2020	08/03/2019		25	Sem progresso no período.
14	490	Solução de armazenamento de dados (Storage)	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	<b>Suspensão</b>	Projeto	18/06/2019	01/10/2020	18/06/2019		80	Sem progresso no período.
15	518	Reestruturação da rede LAN da Capital	Antoniell Magalhaes de Carvalho	<b>Suspensão</b>	Projeto	13/01/2020	31/12/2020	27/01/2020		8	Sem progresso no período. Situação dos entregáveis: - Switches do Bloco C Em andamento 50% - Switches do Bloco B Nova 0% - Switches do Bloco A Nova 0% - Switches do Forum Astolfo Serra Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages do FAS Nova 0% - Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e Storages Sede Nova 0% - Alteração dos IPs de Servidores Sede Nova 0%


## 4.6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE

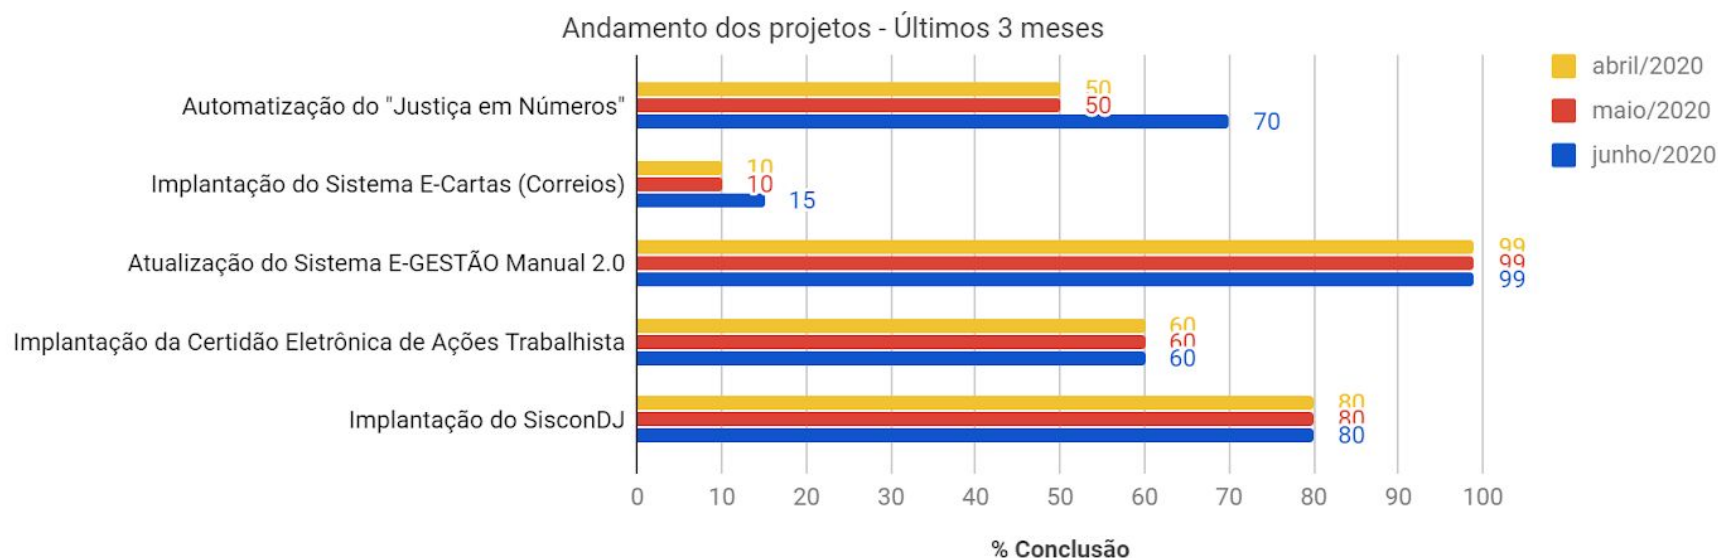

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	481	Automatização do "Justiça em Números"	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Ação	23/04/2019	31/07/2020	19/06/2019		70	<p>Resumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No período houve significativo progresso após diversas reuniões de alinhamento interno e de passagem de requisitos pelo CNJ.</li> <li>- O planejamento do projeto foi revisado, ocasionando inclusão, exclusão e fechamento de tarefas no redmine.</li> </ul> <p>Entregas realizadas no período:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atividades de planejamento derivado das Reuniões de 25/06/2020</li> <li>- Corrigir preenchimento de complementos dos movimentos 60, 106, 36</li> <li>- Corrigir preenchimento de complementos dos movimentos 26, 123, 85, 51 e 970</li> </ul>

											- Incluir os 4 primeiros campos básicos
2	504	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	Gutemberg Pereira Vidal Santos	<b>Em andamento</b>	Ação	10/09/2019	30/09/2020	01/11/2019		15	- Colhida a autorização para projeto, conforme P.A. 3252/2020 , onde DG solicita e autoriza a implantação do mesmo. - A autorização se fazia necessária tendo em vista tratar-se de projeto que não é de cunho nacional.
3	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	<b>Suspensão</b>	Projeto	06/04/2018	31/07/2020	06/04/2018		99	Sem progresso no período. Aguarda-se a reunião do demandante (Comitê Gestor Regional do E-Gestão) para o aceite formal da entrega do projeto.
4	477	Implantação do SisconDJ	Gilberto Cunha Filho	<b>Suspensão</b>	Ação	05/12/2018	31/07/2020	01/04/2019		80	Sem progresso no período. Sistema em homologação.
5	506	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	Gutemberg Pereira Vidal Santos	<b>Suspensão</b>	Ação	27/09/2018	30/07/2020	14/10/2019		60	Sem progresso no período. Sugestão de cancelamento do projeto considerando que: - A versão 2.5 do PJe veio com a funcionalidade objetiva deste sistema no que diz respeito aos processos eletrônicos; - O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe;


## 4.7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

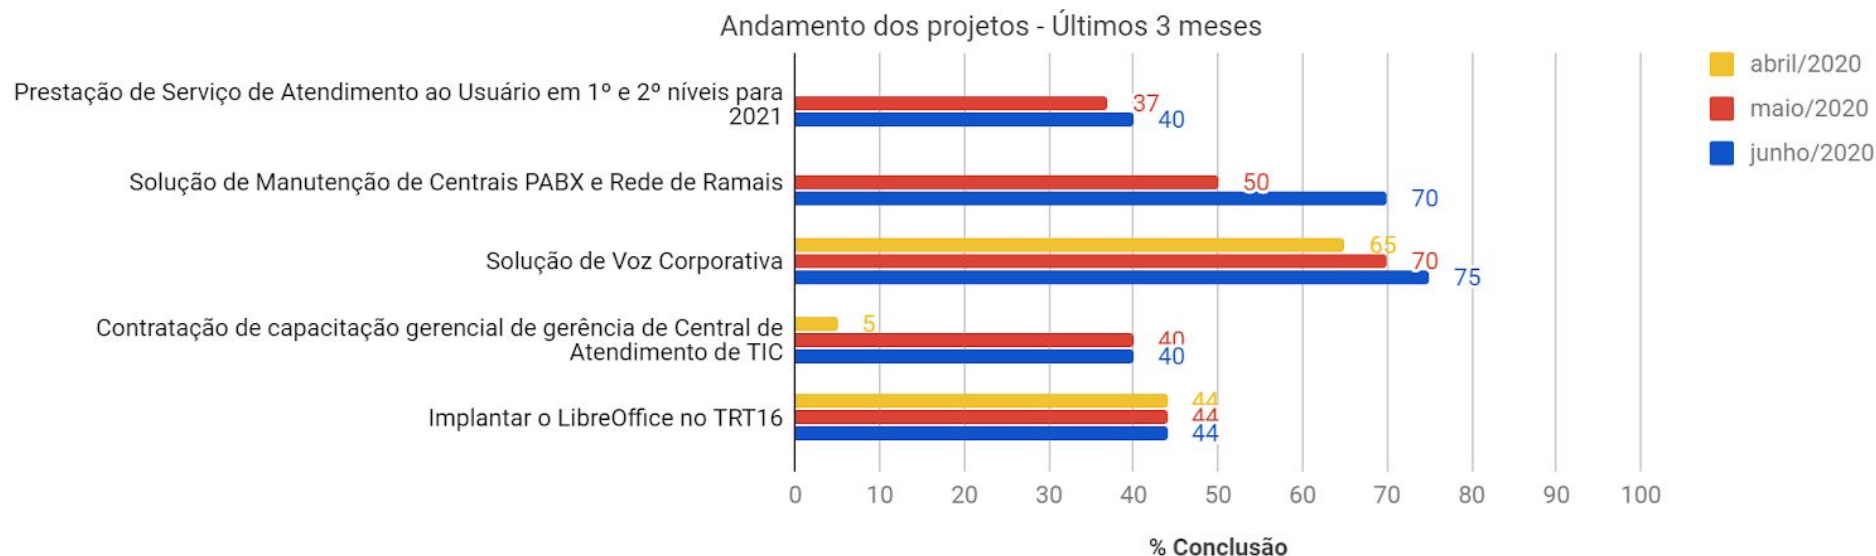

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	381	Solução de Voz Corporativa	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	27/08/2018	30/08/2020	31/08/2018		75	- A preparação da sala que receberá os novos equipamentos foi concluída. - As faixas de endereçamento IP foram criadas e todas as máquinas virtuais foram entregues, exceto uma. O setor de infraestrutura está em contato com a lettel para resolver essa pendência.
2	535	Solução de Manutenção de Centrais PABX e Rede de Ramais	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Ação	05/05/2020	10/07/2020	05/05/2020		70	- O aditivo foi preparado pela secretaria de administração e enviado ao presidente para assinatura no último dia do mês de junho; - O último passo, após a assinatura do presidente é a assinatura do representante da empresa, momento no qual este projeto será

											encerrado.
3	537	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2021	Carlos Eduardo Ferreira Marins	<b>Em andamento</b>	Projeto	18/05/2020	18/12/2020	18/05/2020		40	- ETP aprovado pelo NAJ, e esclarecimentos devidamente prestados para a DG; - Aguarda-se avaliação da DG para conclusão do TR e continuidade do processo licitatório; - Paralelamente o TR vem sendo desenvolvido estando em sua fase final.
4	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	<b>Suspenso</b>	Projeto	25/06/2018	18/12/2020	25/06/2018		44	Sem progresso no período. Não está sendo possível realizar ações nos computadores dos usuários ou verificar a instalação nesse cenário de pandemia.
5	530	Contratação de capacitação gerencial de gerência de Central de Atendimento de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	<b>Suspenso</b>	Ação	23/04/2020	31/08/2020	26/04/2020		40	Sem progresso no período. O curso se realizaria a partir do mês de junho de 2020, mas a empresa não forneceu um atestado de capacidade técnica que é essencial para a contratação do curso. Deste modo, uma nova turma para o mesmo curso, nos mesmos moldes, está prevista no mês de agosto.

## 4.8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

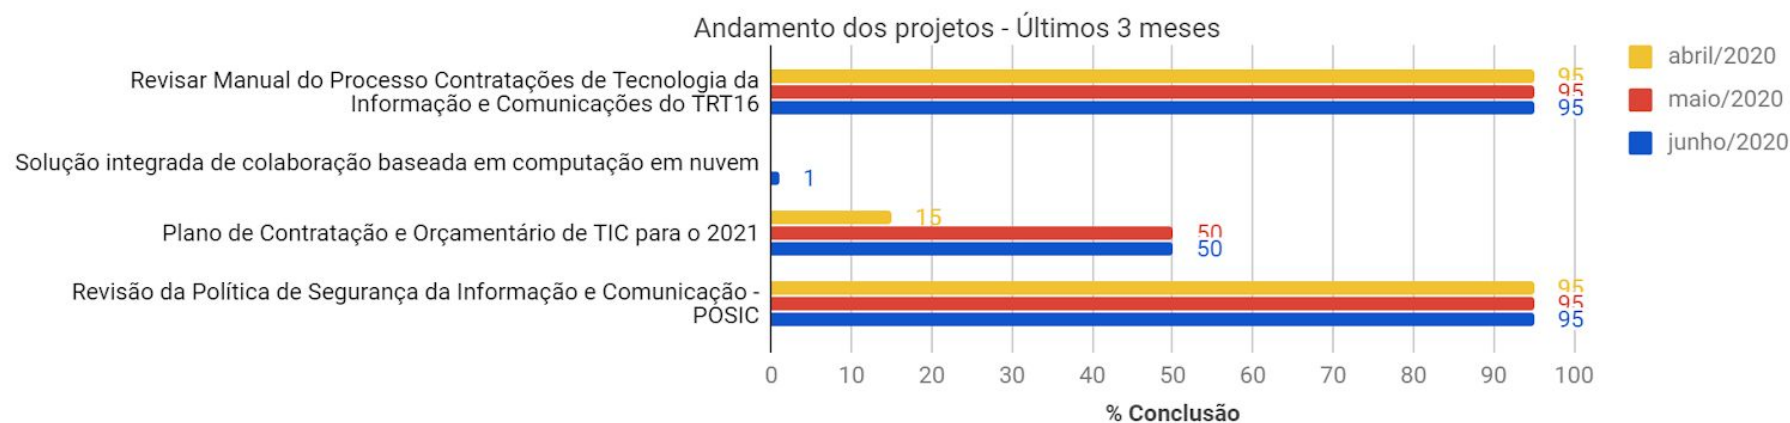

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Conclusão da RDS
1	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Cancelado	Projeto	09/05/2017	30/06/2020	09/05/2019	30/06/2020	95	Projeto cancelado. Motivo: Atualização de atos normativos que compõe o manual e novo projeto de revisão será aberto.
2	539	Solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem	Romulo Moura	Em andamento	Projeto	17/06/2020	31/12/2020	19/06/2020		1	Formalização do início do projeto.
3	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	28/06/2017	30/09/2020	28/06/2017		95	Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo.
4	525	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Ação	18/02/2020	30/09/2020	18/02/2020		50	Sem progresso no período. Servidores foram priorizados para analisar as mudanças nas contratações do ano de 2020. Assim, os recursos humanos foram transferidos para essa atividade.

